

環境委員会資料

平成27年12月9日

【所管事務の調査（報告）】

リサイクルパークあさお整備事業について

資料 リサイクルパークあさお整備事業について（環境局）

環 境 局

リサイクルパークあさお整備事業について

《 事業の進捗状況について 》

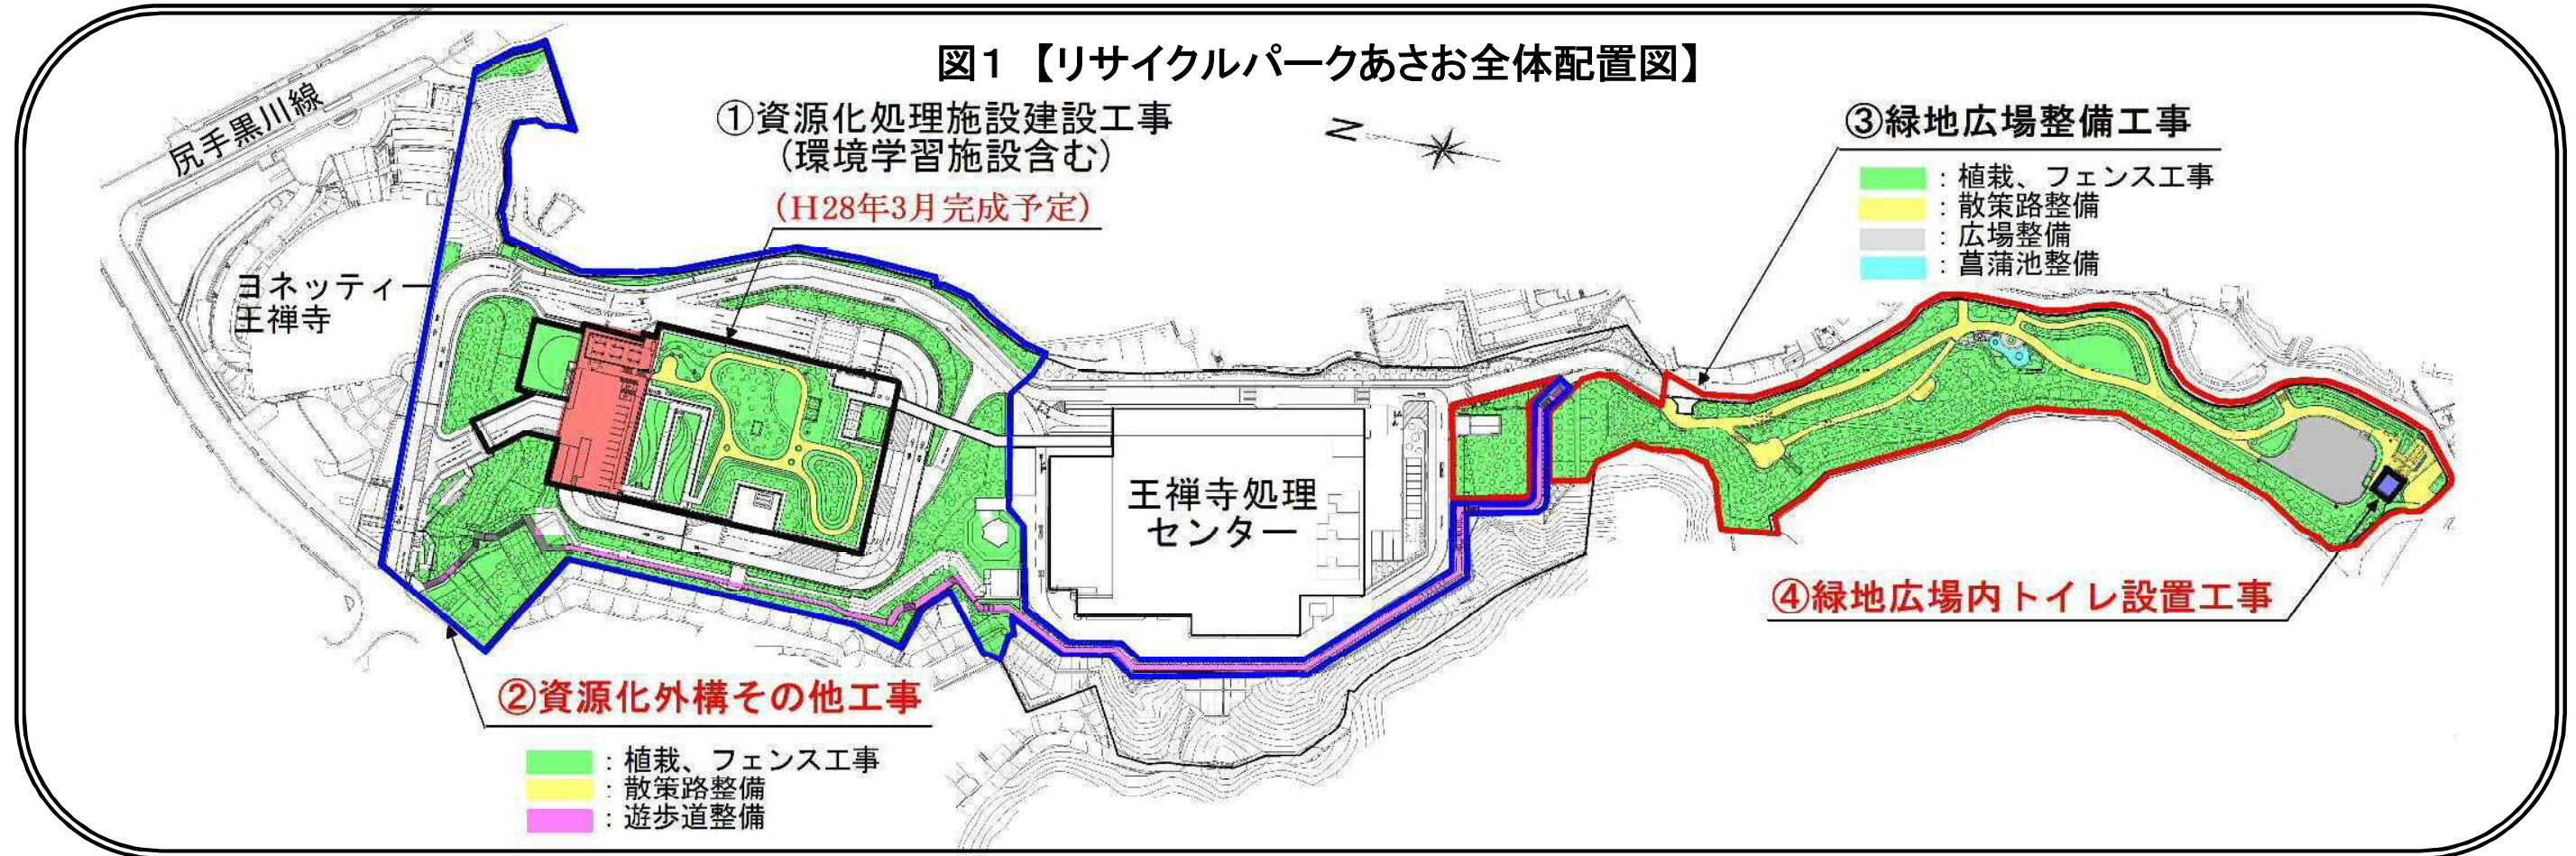


表1 【リサイクルパーク工事スケジュール】

		2015												2016												備考		
		平成27年度												平成28年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
①	資源化処理施設建設工事 (環境学習施設含む)	工事												試運転	完成記念式典	H28年3月 完成予定												
														4月運転開始														
②	資源化外構その他工事	変更前	契約												工事												完成	7月2日 入札不調
		変更後	契約												工事												完成	⇒ H28年12月 完成予定
③	緑地広場整備工事	契約												工事												完成	H28年12月 完成予定	
④	緑地広場内トイレ設置工事	変更前	契約												工事												完成	9月8日 入札不調
		変更後	契約												工事												完成	⇒ H28年10月 完成予定

資源化処理施設建設工事について
⇒ インフレスライド条項等に基づく契約金額の増額が生じており、変更契約について平成28年第1回議会において諮ってまいります。

