


都市計画道路荻宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事 工事進捗状況について

令和4年9月吉日

工事概要

平面図

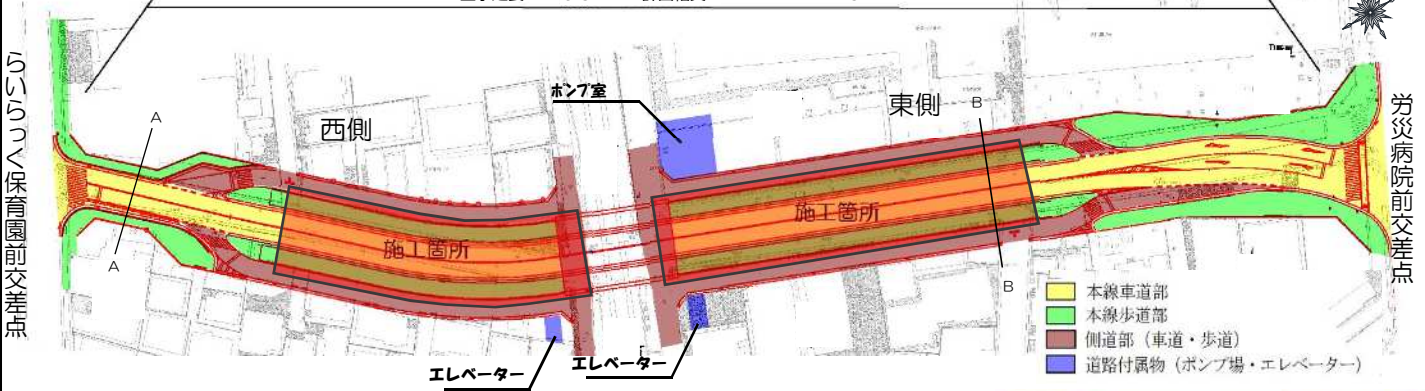

断面図



進捗状況(令和4年9月時点)

～施工方法～

1. 切回し仮舗装工
2. 鋼矢板・中間杭打設工
3. 路面覆工工
4. 掘削・土留工
5. 擁壁工
6. 覆工板撤去/舗装工・排水工など
7. 道路付属物工など

現在

本工事は、「3. 路面覆工工」が完了し、現在、東側では、「4. 掘削・土留工」を行っております。覆工板の下では、最大9mの深さまで掘削を行います。西側については、これから掘削作業に着手する予定です。掘削と並行して、鋼矢板を内側から支える切梁という鋼材の設置も行っております。

▽ 地上からの写真




▽ 覆工板の下の写真




また、本工事では、「4. 掘削・土留工」を行いながら、平成20年に設置された鉄道下ボックスカルバートの土留め壁（仮壁）の撤去を行っております。撤去後は、本線車道部および歩道部に接続することになります。

▽ 鉄道下ボックス内の写真

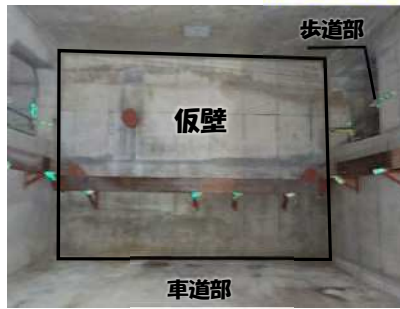

▽ 仮壁撤去状況の写真

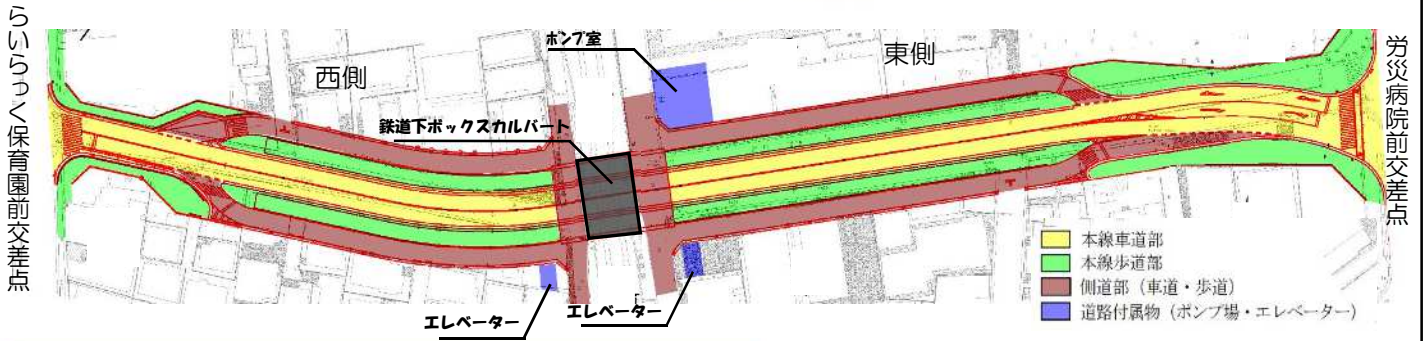

通行止め(1回目)の終了について

本工事におきまして、令和4年4月から約4カ月、昼間および夜間に踏切の車両通行止め（1回目）を行っていましたが、覆工板の設置が無事完了いたしましたので、**通行止めは一旦終了いたします。**迂回路を御利用いただくなど、御理解・御協力を賜り、感謝申し上げます。

<ホームページ 二次元コード>



今後の予定

- ・通行止めにつきましては、令和5年春および夏頃に実施する予定です。詳細は、市HPおよび現場HP等に掲載するなど、お知らせする予定です。
- ・エレベーター工事につきましては、令和4年11月頃から着手する予定となっております。片側交互通行規制を行いながらの施工となります。
- ・関東労災病院の南側出入口付近の横断歩道につきましては、本工事の進捗に伴い、廃止する予定です。工事完了後も、横断歩道はありません（完成イメージ図のとおり）。



皆様には、ご不便お掛けしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

ご不明な点等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。

■問合せ先

川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
フジタ・織戸共同企業体

TEL : 044-755-2277

TEL : 044-982-9091
