

川崎病院救命救急センター棟新築その他工事の工期について

市立川崎病院（川崎市川崎区新川通 12-1、病床数：713 床）では、「川崎市立川崎病院医療機能再編整備基本計画」（平成 30 年 3 月に策定）に基づき、同敷地内において救命救急センター棟新築工事を進めております。

本工事では、地中に埋設されていた地下ピットの空洞対応等により工事の完了が令和 8 年 2 月 27 日の見込みとなり（令和 6 年 7 月 23 日発表）、その後さらに地中障害物の撤去作業等により工期がさらに延長する見込みとなりました（令和 7 年 2 月 14 日発表）。

この度、この工事の完了が令和 8 年 8 月 10 日の見込みとなり、またこれにより、運営開始が令和 8 年 11 月中旬頃となりましたので、お知らせいたします。

1 工期

契約当初 令和5年11月27日 から 令和7年9月30日まで
延長1回目 令和5年11月27日 から 令和8年2月27日まで
今 回 令和5年11月27日 から 令和8年8月10日まで

→10 か月程度の工期延長

2 経過と対応状況

今回の延長の経過と対応状況は次のとおりです。

（1）地中障害物の撤去等の対応

令和 7 年 1 月 6 日の地中障害物の判明後、対応の検討や重機の手配を行い、1 月 31 日から木杭等の障害物の撤去作業を開始しました。救急車搬入口付近等の障害物については、撤去作業により通路に陥没が起きないように、特殊な重機により慎重に作業を行いました。

（2）その他工事の再調整等

地中障害物の撤去後、4 月 7 日から山留工事等を再開するとともに、その他工事の手配等について再調整を行いました。

問合せ先

（再編整備に関すること）

川崎市病院局経営企画室病院施設整備担当 川口 044-200-3862

（工事内容に関すること）

川崎市まちづくり局施設整備部川崎病院再編担当 竹下 044-200-2975

令和7年2月14日
報道発表資料
川崎市病院局

川崎病院救命救急センター棟新築その他工事における地中障害物について

市立川崎病院（川崎市川崎区新川通 12-1、病床数：713 床）では、「川崎市立川崎病院医療機能再編整備基本計画」（平成 30 年 3 月に策定）に基づき、同敷地内において救命救急センター棟新築工事を令和 5 年 11 月に開始し、令和 8 年 2 月 27 日を完了予定として進めております。

この工事の中で、山留工事（※下記参照）を進めていたところ、令和 7 年 1 月 6 日に、北側、北西側、西側の全域の地中約 2～4 m 地点に工事の支障となる障害物があることが分かりました。1 月 31 日から当該箇所の掘削作業を行ったところ、木杭やコンクリートガラであることが判明しましたので、現時点における状況についてお知らせいたします。

なお、現時点でこの作業は 4 月中旬頃までかかることが見込まれております。救命救急センター棟新築工事全体の工期に影響することが想定されますので、確認・検討を進め、まとも次第、改めてお知らせいたします。

※山留工事

地盤を掘削する際に周辺の地盤が崩れないように、土が流れないように止めるためにあらかじめ行う工事です。



※山留イメージ写真

1 経過

令和 5 年 11 月 27 日（月）	工事着手
令和 6 年 12 月 23 日（月）	山留工事開始
令和 7 年 1 月 6 日（月）	地中障害物があることが判明
1 月 7 日（火）	関係者で対応を検討・掘削用の重機の手配
～30 日（木）	
1 月 31 日（金）	掘削作業開始・木杭等があることが判明


【撤去した地中障害物】



【掘削作業の様子】



【救命救急センター棟新築工事実施箇所】

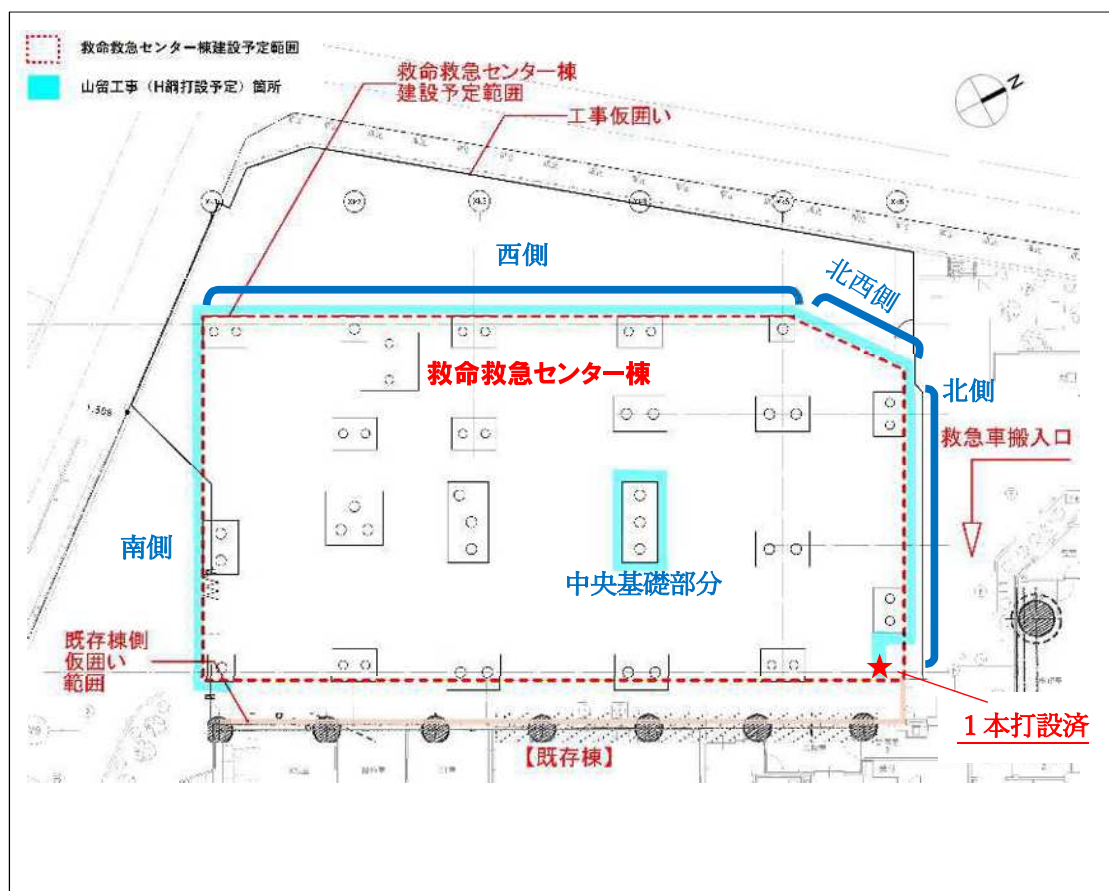

2 工期への影響について

地中障害物は今回、山留工事の実施箇所のうち西側、北西側、北側で見つかりましたが、他の実施箇所である、中央基礎部分、南側についても地中障害物の掘削作業を行うため、現時点でこの作業は4月中旬頃までかかることが見込まれております。

山留工事の再開はその後となることから、救命救急センター棟新築工事全体の工期に影響することが想定されます。現在、掘削調査しながら、確認・検討を進めておりますので、それがまとり次第、改めてお知らせいたします。

問合せ先

（再編整備に関すること）

川崎市病院局経営企画室病院施設整備担当

川口 044-200-3862

（工事内容に関すること）

川崎市まちづくり局施設整備部川崎病院再編担当

竹下 044-200-2975
