



社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						事業費 (百万円)							
A07-001	下水道事業	入江崎水処理センター (高度処理)	H29 R3	10,800	西系高度処理施設等	5,617 ----- 10,450	53.8%	西系高度処理施設等	事業費の精査	別紙1	○		
A07-002	下水道事業	等々力水処理センター (高度処理)	H29 R3	14,100	流量調整池、高度処理施設等	12,911 ----- 10,930	118.1%	流量調整池、高度処理施設等	事業費の精査	別紙3		○	
A07-003	下水道事業	広域ネットワーク	R1 R3	-	-	0 ----- 500	0.0%	光ファイバーケーブル等 (17施設へ接続)	追加	別紙1、2、3、4			○
事業費 計				24,900		18,528 ----- 21,880	84.7%						
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						事業費 (百万円)							
事業費 計				0		0 ----- 0	—						
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
						事業費 (百万円)							
事業費 計				0		0 ----- 0	—						


(参考図面)

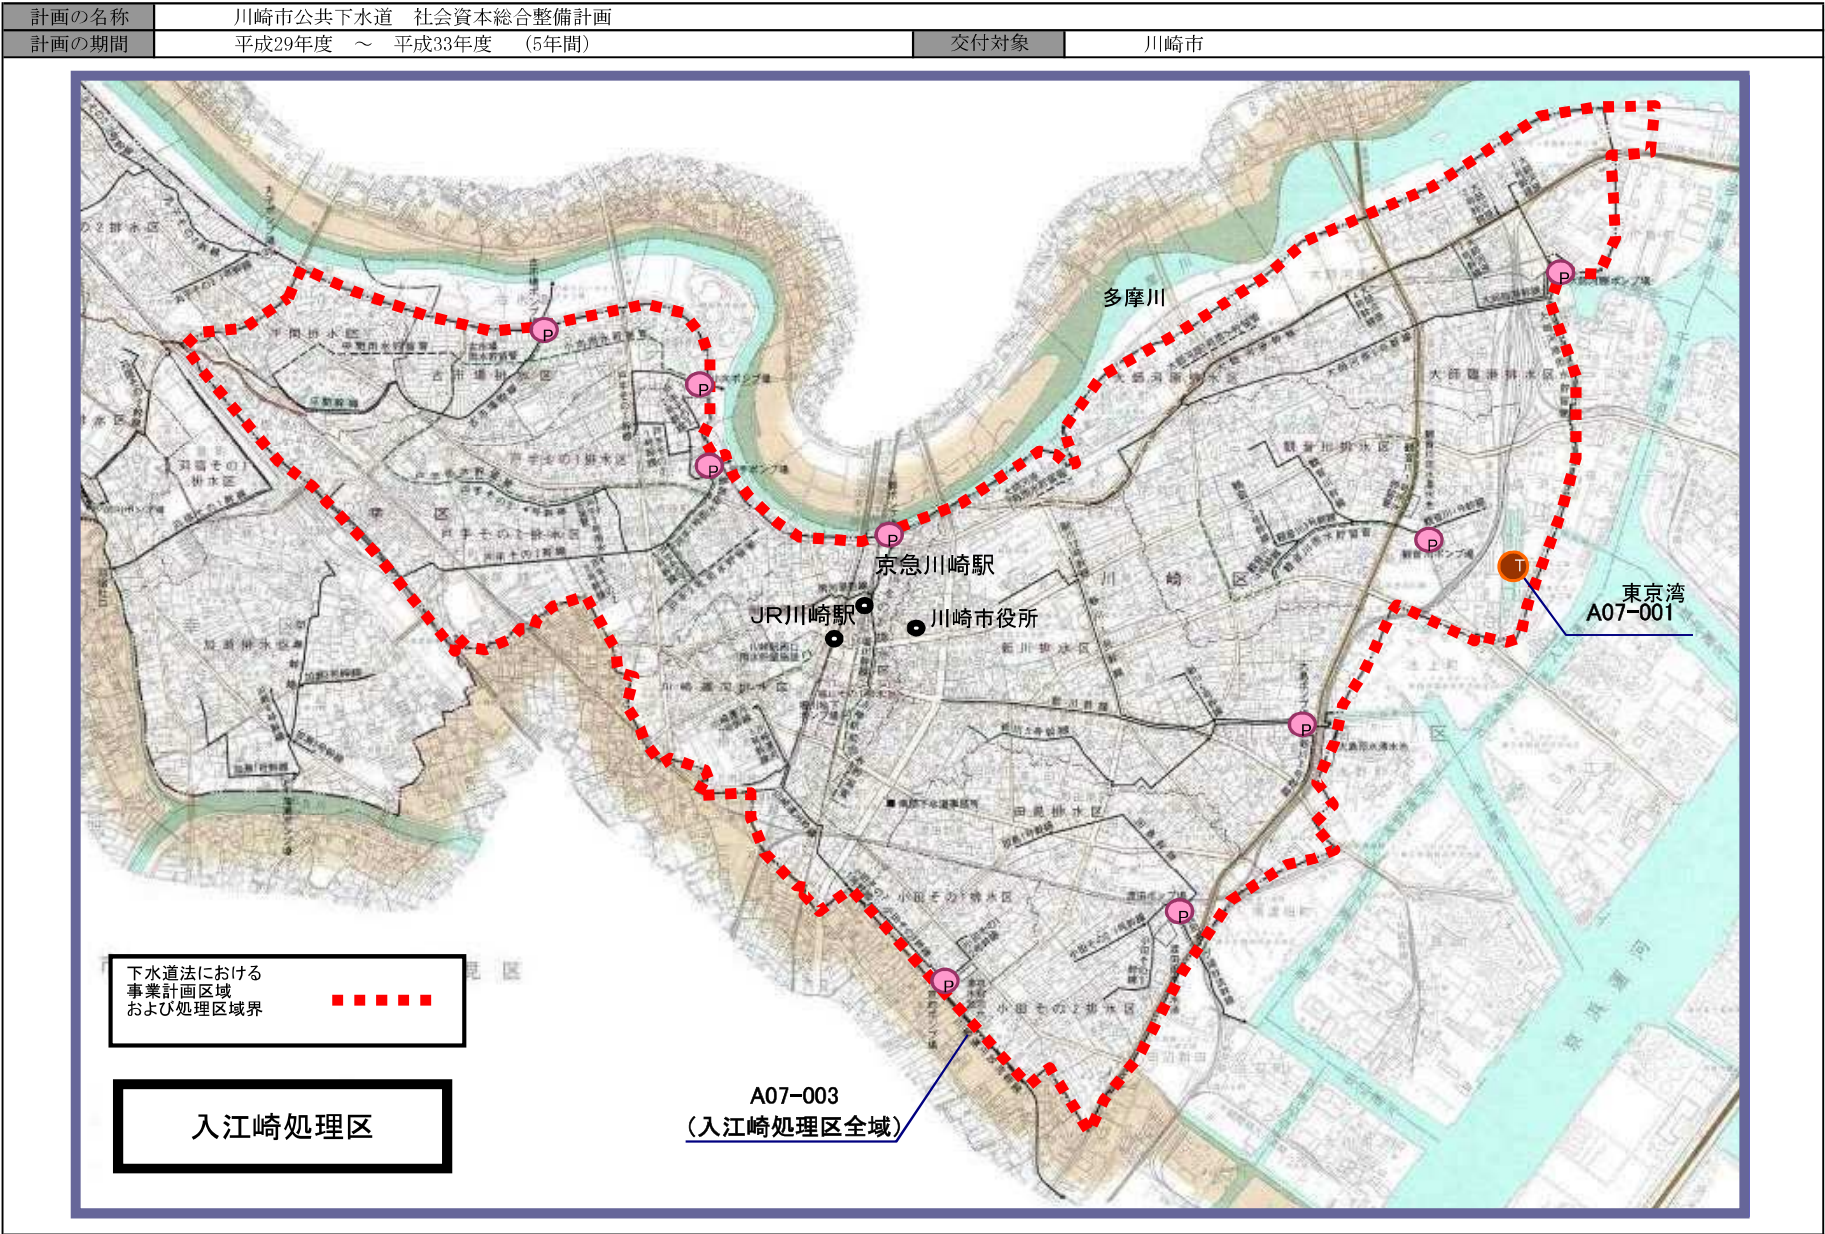

(参考図面)

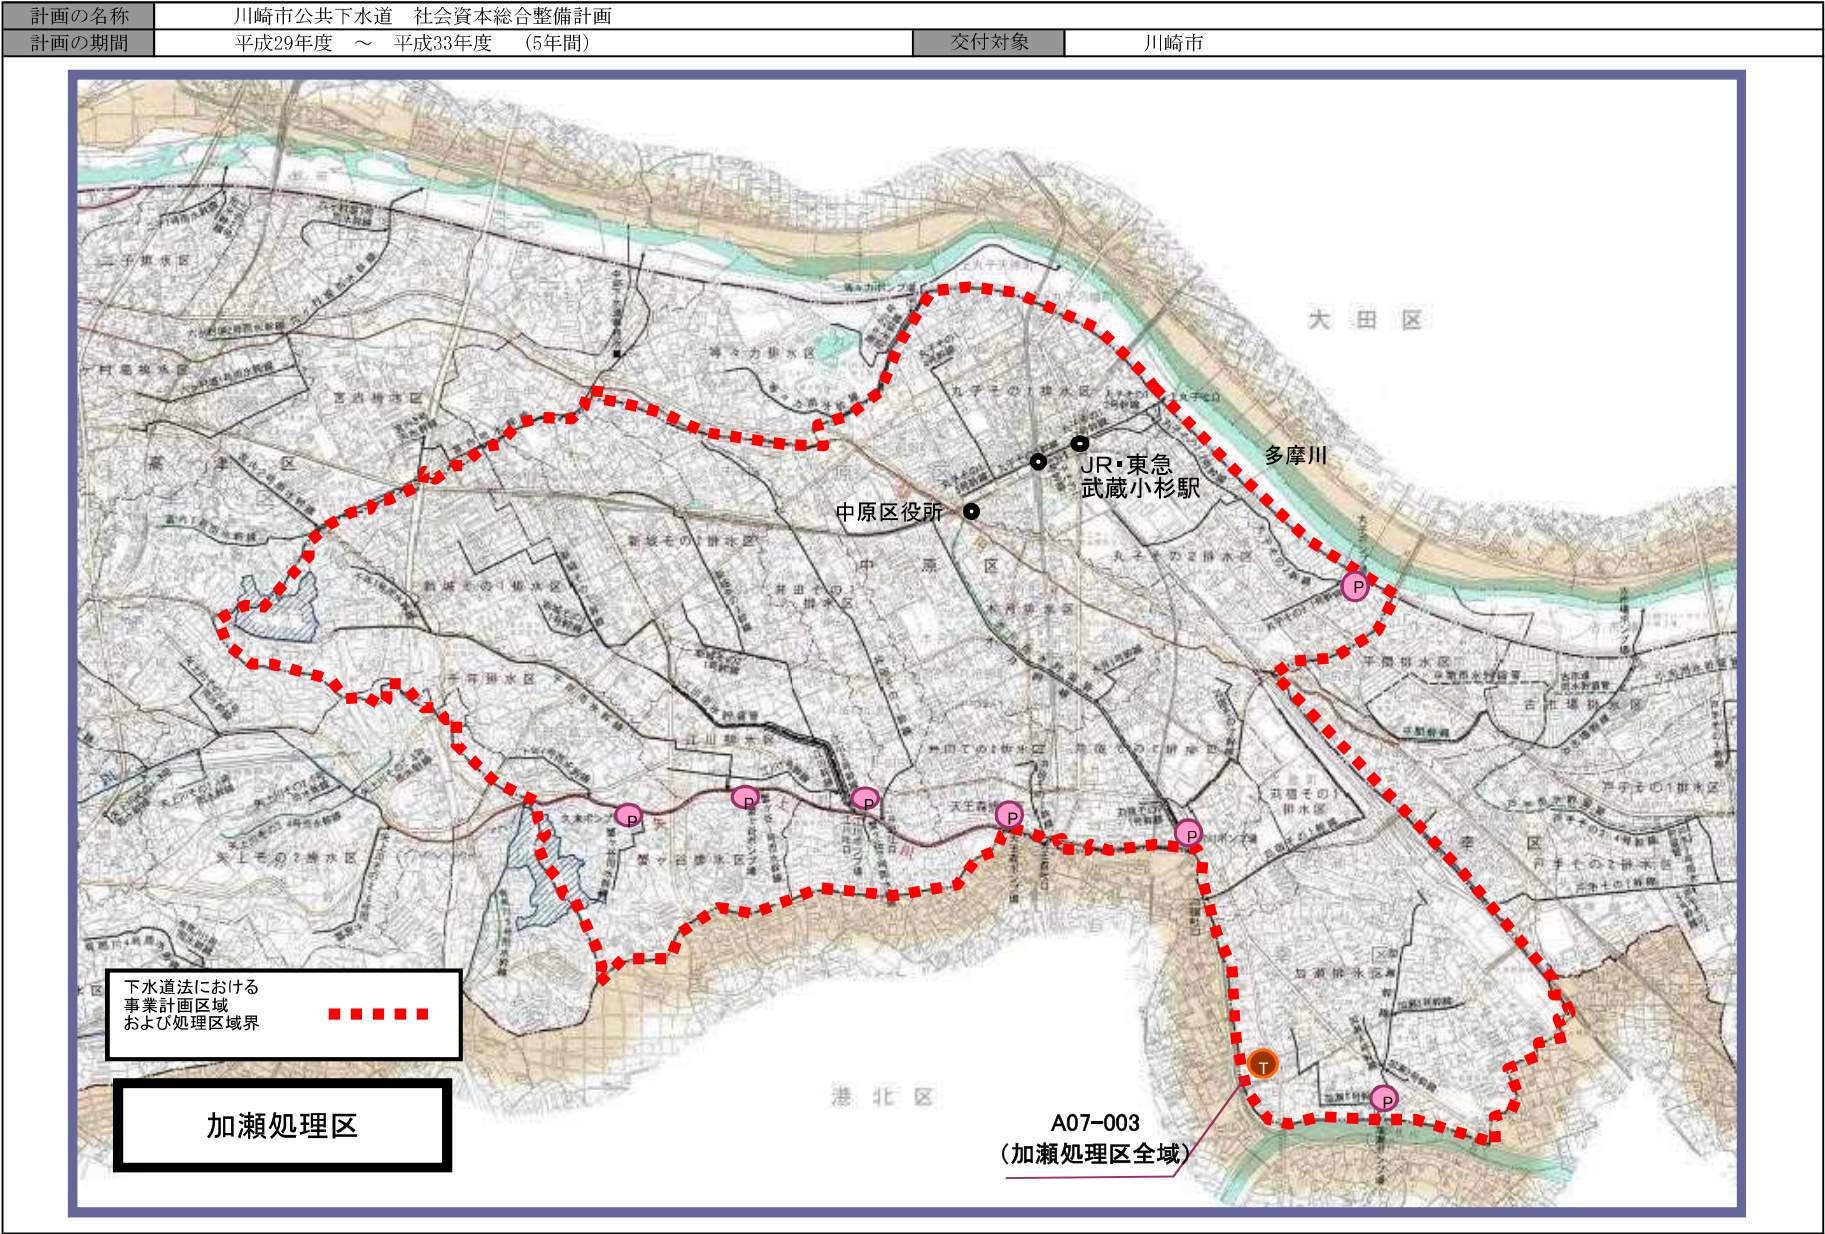

(参考図面)

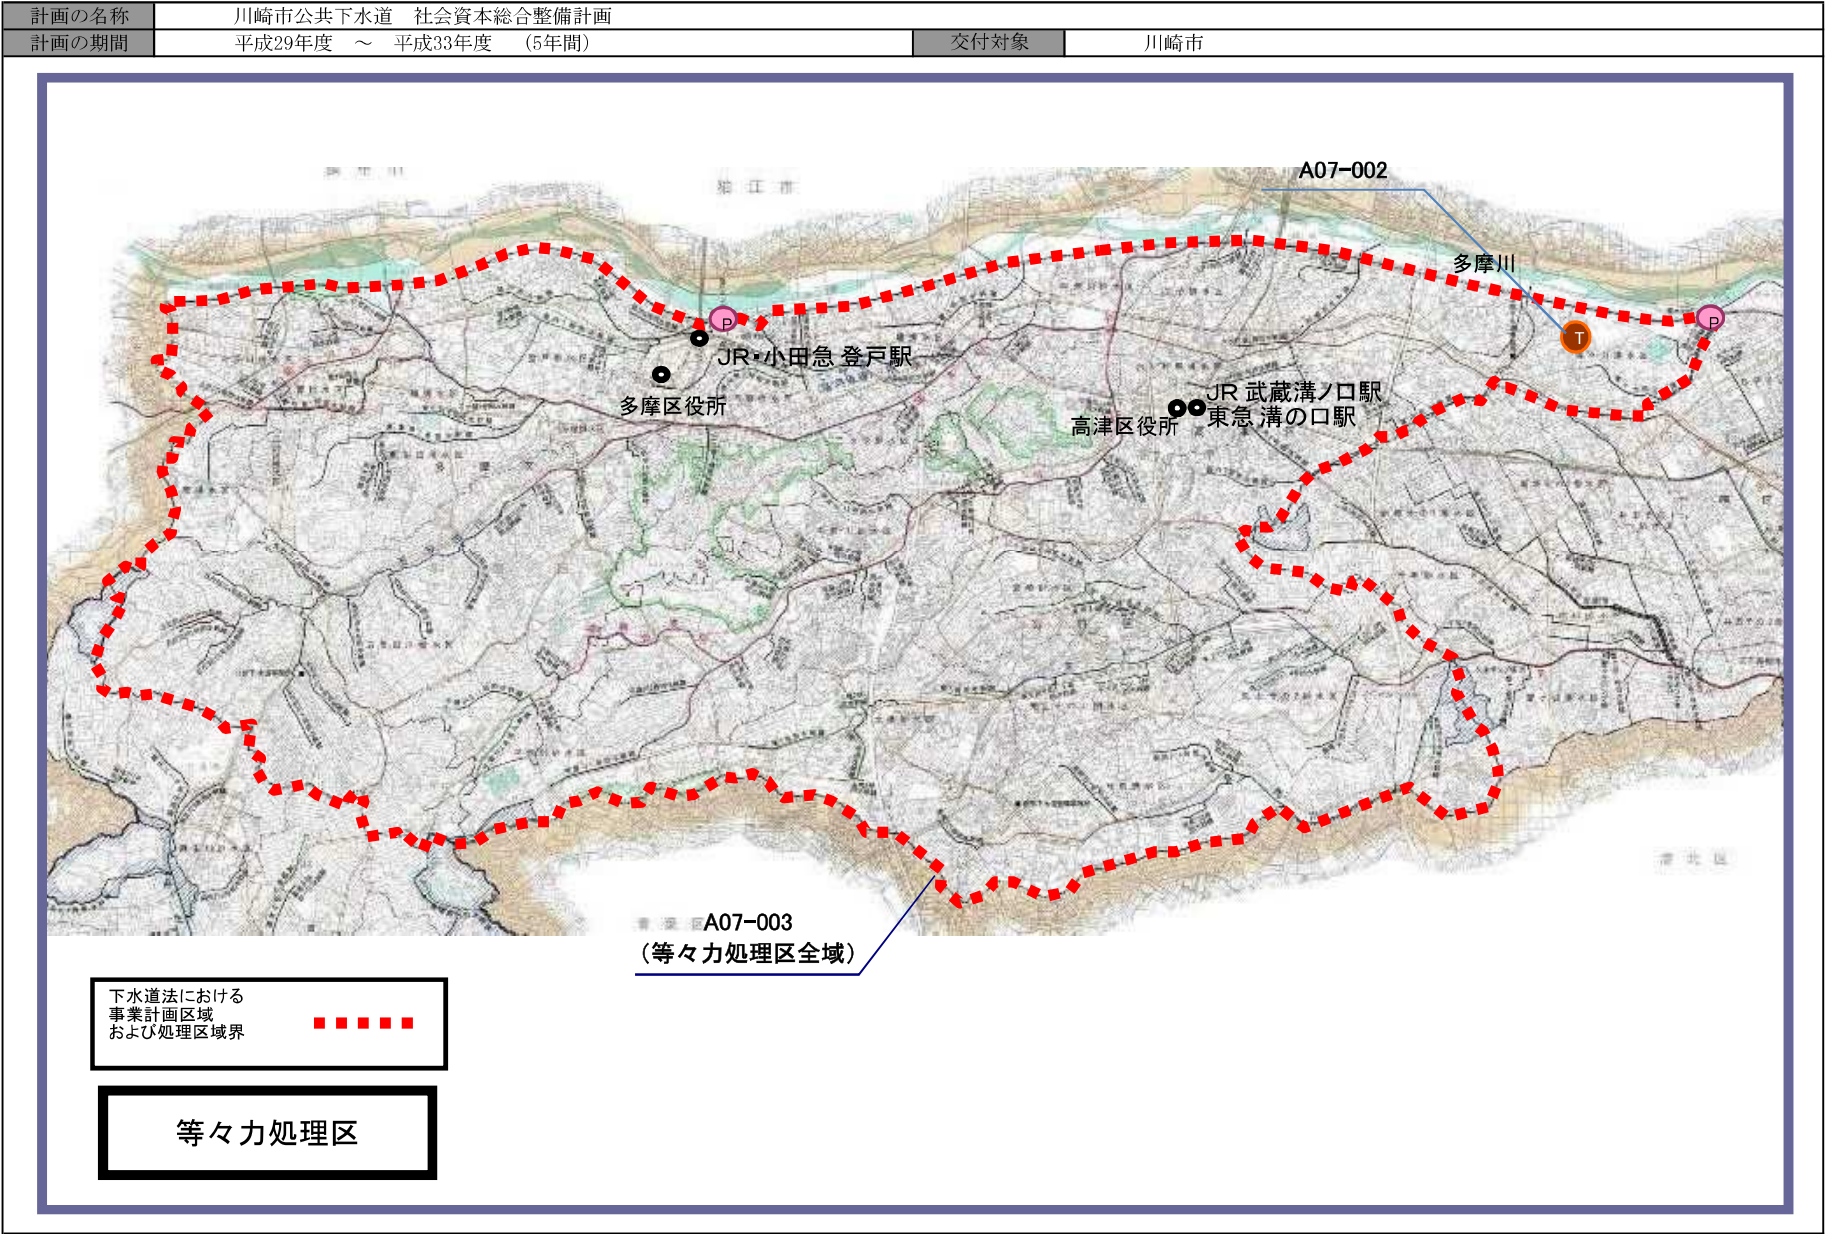

(参考図面)

