

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-001	下水道事業	新川幹線系統(地震対策)	H29 R1	1,040	L=1,450m	897 1,040	86.3%	L=1,450m	-	別紙1	○		
A07-002	下水道事業	田島幹線系統(地震対策)	H29 R1	130	L=120m	0 130	0.0%	L=120m	-	別紙1	○		
A07-003	下水道事業	川崎運河幹線系統	H29 R1	390	L=840m	0 390	0.0%	L=840m	-	別紙1	○		
A07-004	下水道事業	小田その1幹線系統(地震対策)	H29 R1	750	L=880m	666 750	88.8%	L=880m	-	別紙1	○		
A07-005	下水道事業	小田その2幹線系統(地震対策)	H29 R2	130	L=260m	174 130	133.8%	L=260m	-	別紙1	○		
A07-006	下水道事業	大師河原・大師臨港幹線系統(地震対策)	H29 R1	3,040	L=5,270m	2,645 3,040	87.0%	L=5,270m	-	別紙1	○		
A07-007	下水道事業	防災拠点接続管(地震対策)	H29 R1	1,720	L=5,170m	312 1,720	18.1%	L=5,170m	-	別紙1	○		
A07-008	下水道事業	緊急輸送路埋設管(地震対策)	H29 R3	580	L=1,670m	0 980	0.0%	L=3,670m	延長追加	別紙1			○
A07-009	下水道事業	都市再生緊急整備地域(地震対策)	H29 R1	70	L=570m	7 70	10.0%	L=570m	-	別紙1	○		

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-010	下水道事業	古市場幹線系統等(地震対策)	H30 R3	3,810	川崎駅以北	7,050 ----- 3,810	185.0%	川崎駅以北	-	別紙1、2、3、4		○	
A07-011	下水道事業	六郷ポンプ場(地震対策)	H30 R3	30	流入渠等	0 ----- 30	0.0%	流入渠等	-	別紙1	○		
A07-012	下水道事業	観音川ポンプ場(地震対策)	H30 R3	150	汚水沈砂池、ホッパー、流入渠等	6 ----- 140	4.3%	汚水沈砂池、ホッパー、流入渠等	-	別紙1	○		
A07-013	下水道事業	大師河原ポンプ場(地震対策)	H30 R1	50	汚水管理棟等	0 ----- 50	0.0%	汚水管理棟等	-	別紙1	○		
A07-014	下水道事業	大島ポンプ場(地震対策)	H30 R3	680	バイパス管設置等	0 ----- 680	0.0%	バイパス管設置等	-	別紙1		○	
A07-015	下水道事業	京町ポンプ場(地震対策)	H30 R3	20	流入渠等	0 ----- 20	0.0%	流入渠等	-	別紙1			○
A07-016	下水道事業	入江崎水処理センター(地震対策)	H30 R3	50	流入渠、放流渠等	0 ----- 50	0.0%	流入渠、放流渠等	-	別紙1			○
A07-017	下水道事業	大師河原・臨港地区(浸水対策)	H29	4,220	L=1,380m、ポンプ棟	1,088 ----- 810	134.3%	L=1,380m、ポンプ棟	重点計画へ移行	別紙1	○		
A07-018	下水道事業	六郷遮集幹線等(合流改善)	H29	5,790	L=2,850m等	494 ----- 500	98.8%	L=2,850m等	重点計画へ移行	別紙1		○	

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-019	下水道事業	緊急改築推進事業(老朽化対策)	H29	70	50年以上経過管渠	11 ----- 70	15.7%	50年以上経過管渠	-	別紙1	○		
A07-020	下水道事業	大師河原ポンプ場地震時機能停止リスク低減対策	R1 R3	-	-	629 ----- 200	314.5%	受変電設備等	追加	別紙1	○		
A07-021	下水道事業	渡田ポンプ場(老朽化対策)	H29 R3	2,760	沈砂池施設、雨水ポンプ施設等	531 ----- 2,320	22.9%	沈砂池施設、雨水ポンプ施設等	事業費の精査	別紙1		○	
A07-022	下水道事業	観音川ポンプ場(老朽化対策)	H29 R1	500	汚水沈砂池設備、次亜設備等	419 ----- 120	349.2%	汚水沈砂池設備、次亜設備等	事業費の精査	別紙1	○		
A07-023	下水道事業	大島ポンプ場(老朽化対策)	H29 R1	30	除塵機更新等	55 ----- 30	183.3%	除塵機更新等	-	別紙1	○		
A07-024	下水道事業	古市場ポンプ場(老朽化対策)	H29 R1	20	除塵機、揚水ポンプ更新等	23 ----- 20	115.0%	除塵機、揚水ポンプ更新等	-	別紙1	○		
A07-025	下水道事業	京町ポンプ場(老朽化対策)	H29 R1	550	次亜設備更新、雨水ポンプ設備等	496 ----- 370	134.1%	次亜設備更新、雨水ポンプ設備等	事業費の精査	別紙1	○		
A07-026	下水道事業	大島雨水滞水池(老朽化対策)	H30 R1	530	監視制御設備、受変電設備等	33 ----- 460	7.2%	監視制御設備、受変電設備等	事業費の精査	別紙1	○		
A07-027	下水道事業	観音川雨水滞水池(老朽化対策)	H29 R1	140	流入ゲート等	120 ----- 140	85.7%	流入ゲート等	-	別紙1	○		

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-028	下水道事業	渡田雨水滞水池(老朽化対策)	H29 R1	80	流入ゲート等	72 ----- 80	90.0%	流入ゲート等	-	別紙1	○		
A07-029	下水道事業	広域ネットワーク再構築事業(老朽化対策)	H30 R1	460	広域ネットワーク構築等	0 ----- 30	0.0%	広域ネットワーク構築等	他要素へ移行 (重点計画 A07-018)	別紙1、2、3、4	○		
A07-030	下水道事業	入江崎総合スラッジセンター(老朽化対策)	H29 R3	2,900	焼却設備、濃縮機、受変電設備等	729 ----- 1,900	38.4%	焼却設備、濃縮機、受変電設備等	他要素へ移行	別紙1			○
A07-031	下水道事業	丸子ポンプ場(地震対策)	H30 R3	570	バイパス管設置等	0 ----- 550	0.0%	バイパス管設置等	事業費の精査	別紙2			○
A07-032	下水道事業	加瀬水処理センター(地震対策)	H30 R3	1,170	最初沈殿池、最終沈殿池等	191 ----- 920	20.8%	最初沈殿池、最終沈殿池等	事業費の精査	別紙2			○
A07-033	下水道事業	丸子地区(合流改善)	H29	20	水面制御スクリーン設置	0 ----- 20	0.0%	水面制御スクリーン設置	-	別紙2	○		
A07-034	下水道事業	洪川ポンプ場(老朽化対策)	H30 R1	10	ポンプ井水位計更新等	2 ----- 10	20.0%	ポンプ井水位計更新等	-	別紙2	○		
A07-035	下水道事業	江川貯留管(老朽化対策)	H30 R1	30	貯留管水位計更新等	2 ----- 20	10.0%	貯留管水位計更新等	事業費の精査	別紙2	○		
A07-036	下水道事業	加瀬水処理センター(老朽化対策)	H29 R1	250	防食、覆蓋更新、汚泥圧送設備等	208 ----- 250	83.2%	防食、覆蓋更新、汚泥圧送設備等	-	別紙2	○		

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-037	下水道事業	等々力水処理センター(老朽化対策)	H29 R1	580	雨量情報配信システム、沈砂池設備等	288 ----- 580	49.7%	雨量情報配信システム、沈砂池設備等	-	別紙3	○		
A07-038	下水道事業	麻生汚泥圧送幹線(地震対策)	H29 R3	2,080	L=8,850m	1,918 ----- 2,080	92.2%	L=8,850m	-	別紙3、4	○		
A07-039	下水道事業	麻生水処理センター(地震対策)	H30 R3	90	流入渠、放流渠等	0 ----- 90	0.0%	流入渠、放流渠等	-	別紙4			○
A07-040	下水道事業	麻生水処理センター(老朽化対策)	H29 R1	520	沈砂池設備、計装設備、監視制御等	401 ----- 520	77.1%	沈砂池設備、計装設備、監視制御等	-	別紙4	○		
A07-041	下水道事業	入江崎水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	H30 R3	-	-	348 ----- 350	99.4%	西系高度処理施設等	追加	別紙1	○		
A07-042	下水道事業	等々力水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	H30 R3	-	-	3,083 ----- 3,170	97.3%	流量調整池等	追加	別紙3			○
A07-043	下水道事業	小向ポンプ場(老朽化対策)	R1 R3	-	-	0 ----- 50	0.0%	ゲート設備等	追加	別紙1			○
A07-044	下水道事業	戸手ポンプ場(老朽化対策)	R1 R3	-	-	0 ----- 240	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙1			○
A07-045	下水道事業	加瀬ポンプ場(老朽化対策)	R1 R3	-	-	86 ----- 130	66.2%	ゲート設備等	追加	別紙2	○		

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-046	下水道事業	丸子ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	852	100.2%	監視制御設備等	追加	別紙2			○
			R3			850							
A07-047	下水道事業	踊場ポンプ 場(老朽化 対策)	R1	-	-	0	0.0%	自家発電設備等	追加	別紙4			○
			R3			70							
A07-048	下水道事業	大師河原ポ ンプ場(合流 改善)	R1	-	-	0	0.0%	汚水沈砂池等	追加	別紙1		○	
			R3			250							
A07-049	下水道事業	大島ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙1		○	
			R3			100							
A07-050	下水道事業	渡田ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	21	13.1%	監視制御設備等	追加	別紙1		○	
			R3			160							
A07-051	下水道事業	観音川ポン プ場地震時 機能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	0	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙1		○	
			R3			470							
A07-052	下水道事業	京町ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙1		○	
			R3			60							
A07-053	下水道事業	古市場ポン プ場(老朽 化対策)	R1	-	-	0	0.0%	負荷設備等	追加	別紙1		○	
			R3			30							
A07-054	下水道事業	洪川ポンプ 場(老朽化 対策)	R1	-	-	0	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙2		○	
			R3			340							


社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-055	下水道事業	入江崎水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	反応タンク設備等	追加	別紙1			○
			R3			960							
A07-056	下水道事業	加瀬水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	373	9.7%	反応タンク設備等	追加	別紙2			○
			R3			3,830							
A07-057	下水道事業	等々力水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	2,130	57.4%	監視制御設備等	追加	別紙3			○
			R3			3,710							
A07-058	下水道事業	麻生水処理センター地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	汚水ポンプ設備等	追加	別紙4			○
			R3			600							
A07-059	下水道事業	入江崎総合スラッジセンター地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	100	0.8%	汚泥輸送設備等	追加	別紙1			○
			R3			12,360							
A07-060	下水道事業	入江崎総合スラッジセンター地震時機能停止リスク低減対策	H30	-	-	992	99.2%	受変電設備等	追加	別紙1		○	
			R3			1,000							
A07-061	下水道事業	観音川ポンプ場地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	汚水沈砂池設備等	追加	別紙1			○
			R3			360							
A07-062	下水道事業	大師河原ポンプ場地震時機能停止リスク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	汚水沈砂池等	追加	別紙1		○	
			R3			260							
A07-063	下水道事業	三沢川地区(浸水対策)	R1	-	-	0	0.0%	L=20m等	追加	別紙3		○	
			R3			30							

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況


交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-064	下水道事業	土橋地区 (浸水対策)	R1	-	-	0	0.0%	L=20m等	追加	別紙3	○		
			R3			20							
A07-065	下水道事業	丸子地区 (浸水対策)	R1	-	-	0	0.0%	施設計画の検討等	追加	別紙2	○		
			R3			20							
A07-066	下水道事業	雨水対策施設の改築 (大島雨水滞水池)	R1	-	-	66	94.3%	自家発電設備等	追加	別紙1	○		
			R3			70							
A07-067	下水道事業	排水樋管	R1	-	-	0	0.0%	遠隔操作設備等	追加	別紙2、3	○		
			R3			100							
A07-068	下水道事業	排水樋管	R1	-	-	140	93.3%	ゲート改良等	追加	別紙2、3	○		
			R3			150							
事業費 計				36,010		27,658	50.4%						
						54,860							
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0	-						
						0							
C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
C07-001	下水道事業	移動式ポンプ	R1	-	-	271	90.3%	排水ポンプ車	追加	別紙2、3	○		
						300							
事業費 計				0		271	90.3%						
						300							

計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備計画 (防災・安全)	交付対象	川崎市
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)		

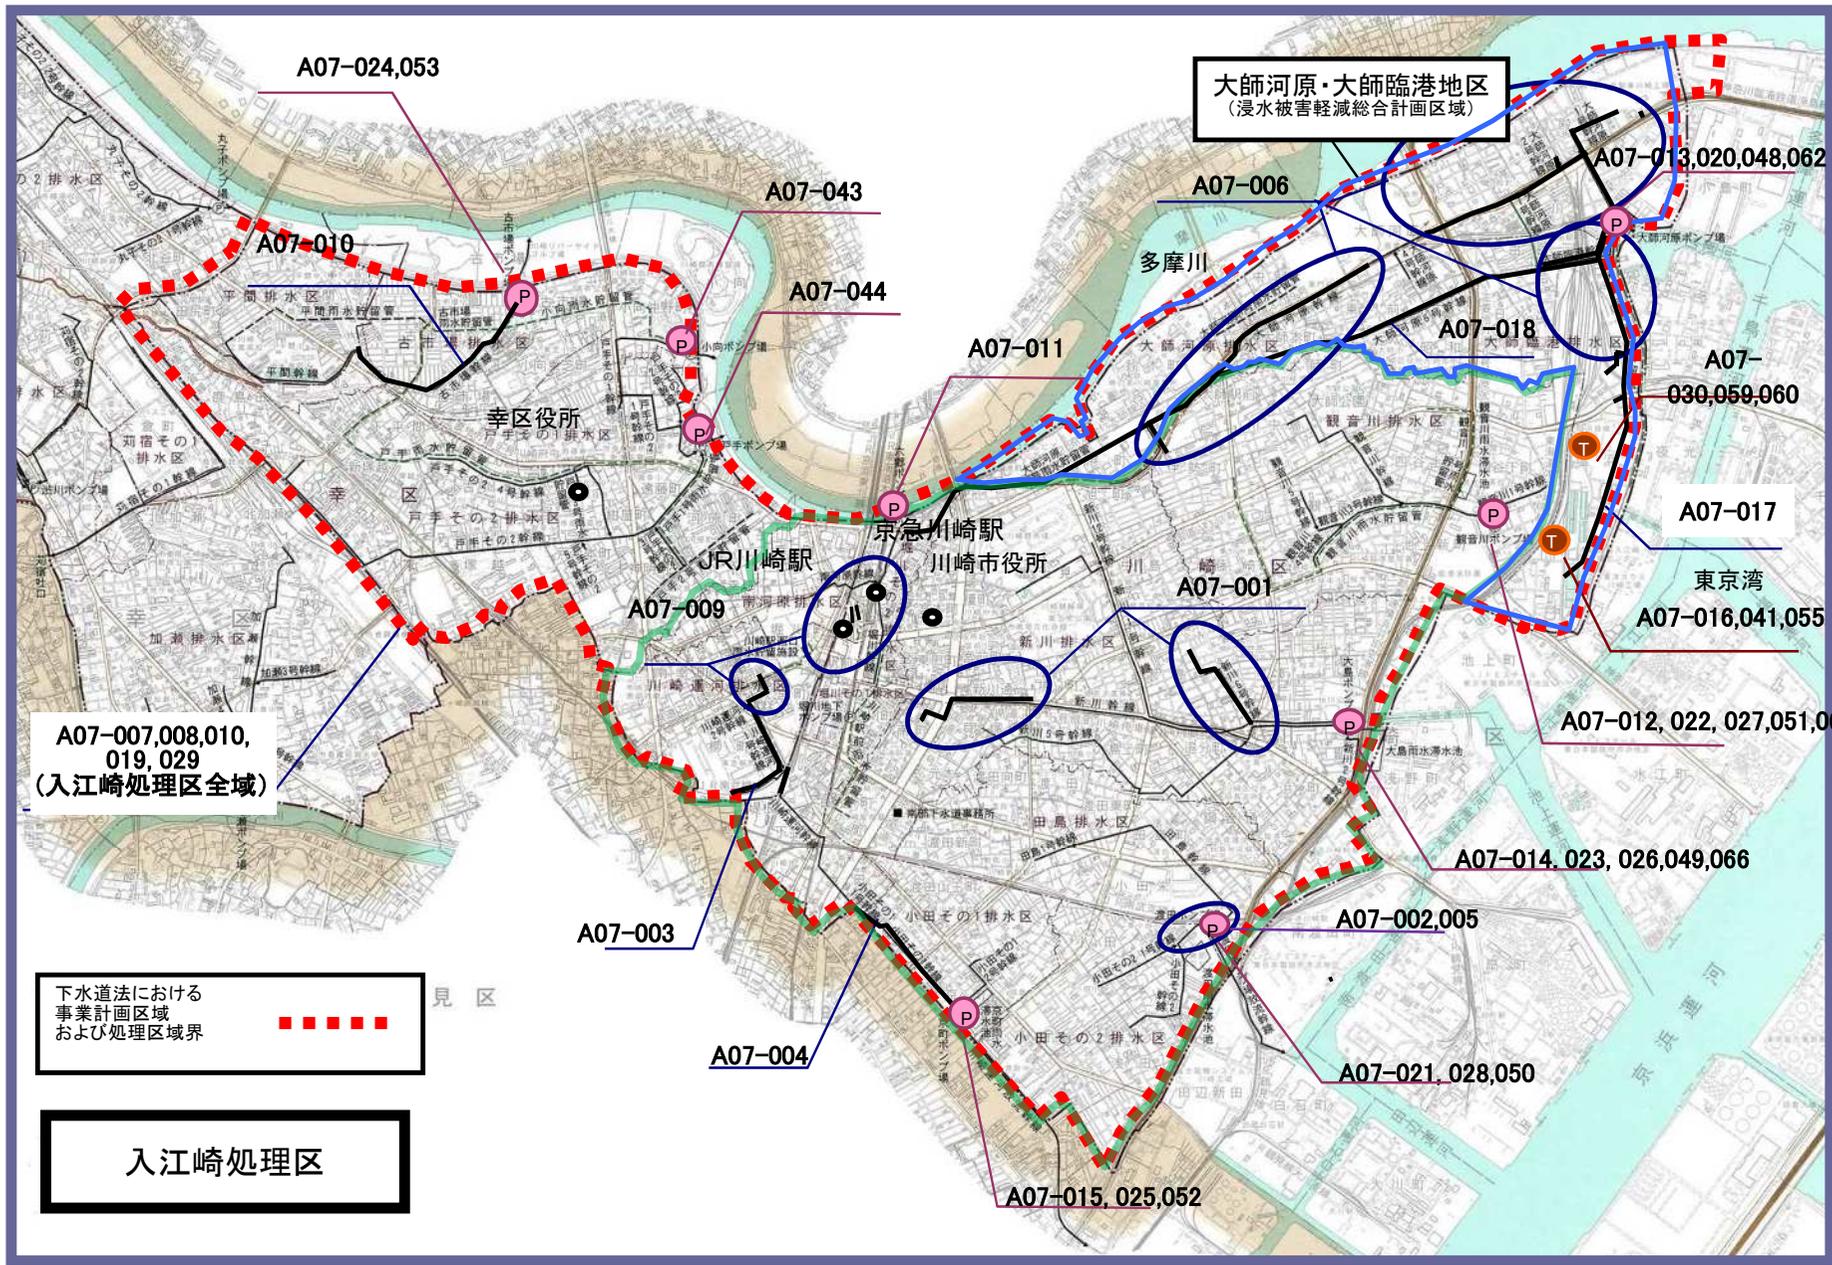


(参考図面)

計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備計画 (防災・安全)	交付対象	川崎市
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)		

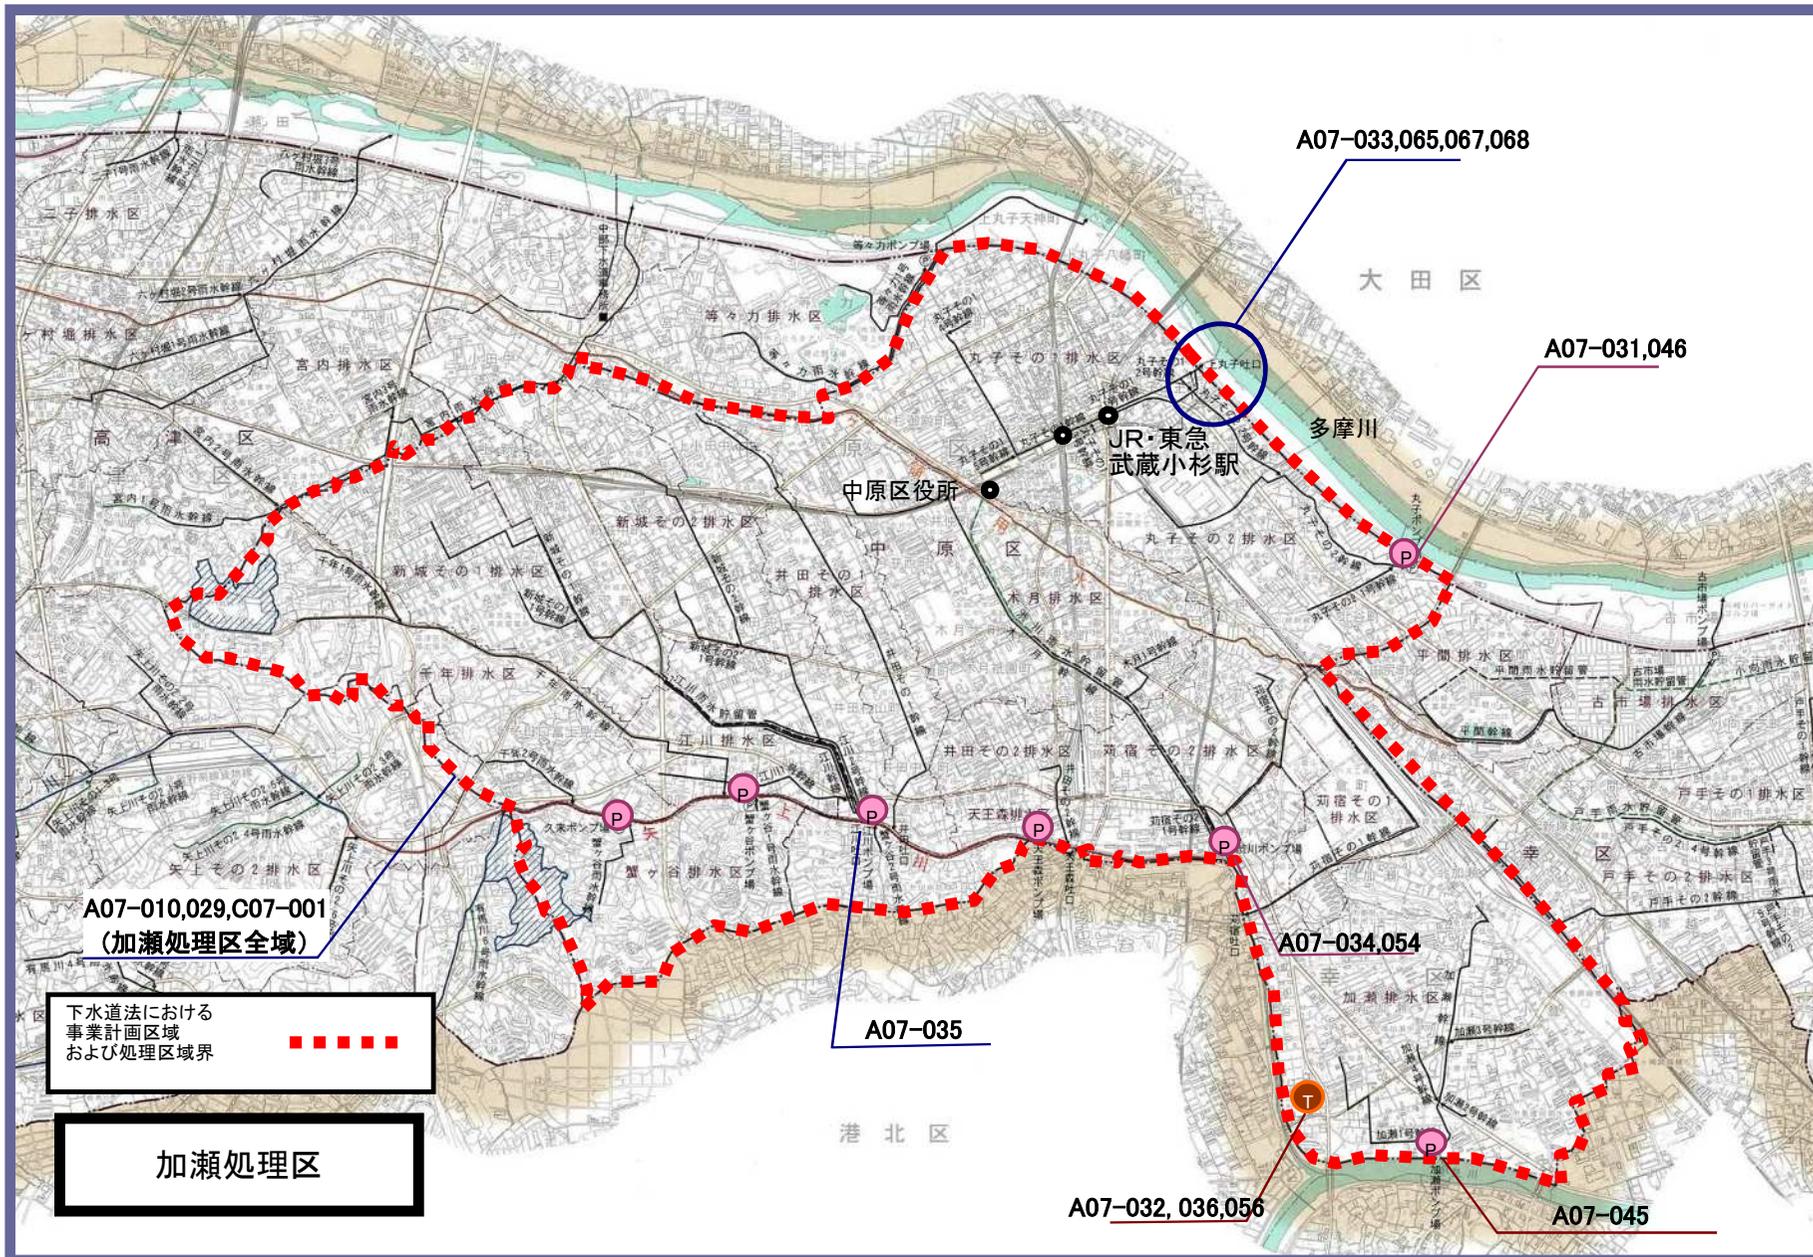

(参考図面)

計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備計画 (防災・安全)	交付対象	川崎市
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)		

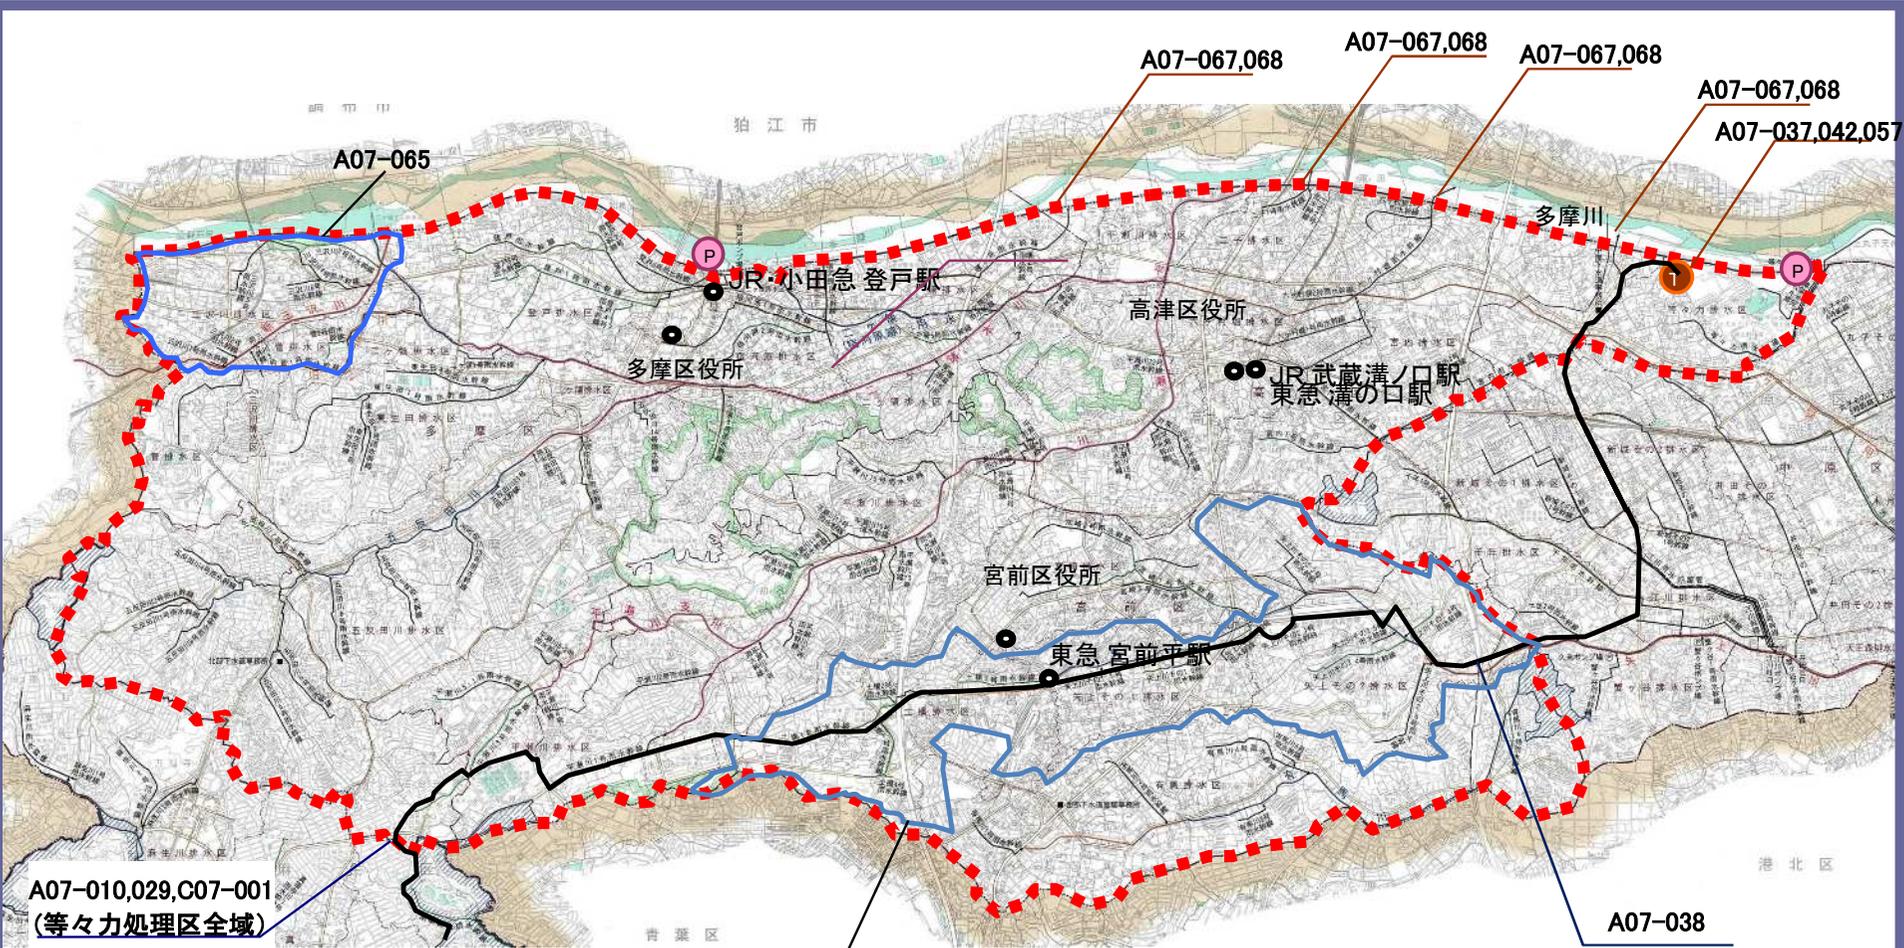

下水道法における
事業計画区域
および処理区域界

■■■■■

等々力処理区

(参考図面)

