

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業													
A 基幹事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A03-001	平瀬川支川都市基盤河川改修事業	平瀬川支川	令和2年度	561	護岸、用地買収	438	78.1%	護岸L=92m 用地買収A=622m2		別紙参照			○
			令和6年度			561							
A08-002	三沢川準用河川改修事業	三沢川	令和2年度	105	用地買収	0	0.0%			別紙参照			○
			令和6年度			105							
A08-003	麻生川準用河川改修事業	麻生川	令和2年度	24	橋りょう	18	75.0%	橋りょう		別紙参照			○
			令和6年度			24							
A03-004	平瀬川都市基盤河川改修事業	平瀬川	令和6年度			54	100.0%	仮設工	令和6年度 事業の追加	別紙参照			○
			令和6年度			54							
A03-005	平瀬川施設機能向上事業	平瀬川	令和3年度			714	59.0%	護岸耐震化 L=20m	令和3年度 事業の追加	別紙参照			○
			令和6年度			1210							
							-						
事業費 計				690		1224 1954	62.6%						

B 関連社会資本整備事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
							-						
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業													
番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
							-						
							-						
							-						
事業費 計				0		0 0	-						

1 平瀬川支川 都市基盤河川改修事業

事業箇所：一級河川平瀬川支川



1 平瀬川支川 都市基盤河川改修事業

河道拡幅・多自然川づくり

○本計画期間中の事業内容


- ・事業区間：平瀬川支川（多摩区長沢）
- ・事業内容：護岸工、用地買収
- ・事業期間：令和2年度～令和6年度

○事業実施内容（実績）

- ・事業内容：護岸工 92m 用地買収 622m²
- 一級河川平瀬川支川延長 2,330m
- 令和2年3月末 整備済み延長 1,607m(整備率69%)
- 令和7年3月末 整備済み延長 1,699m(整備率73%)予定
- ・事業期間：令和2年度～令和6年度

○効果


護岸整備を行ったが片側拡幅部が大分を占めたため河道を拡幅できた区間はわずかであった。また、河道拡幅に際し護岸に、植物の生育や小動物の生息場所となる多孔質の溶岩ブロックを使用することにより、生態系の基盤構築に寄与した。

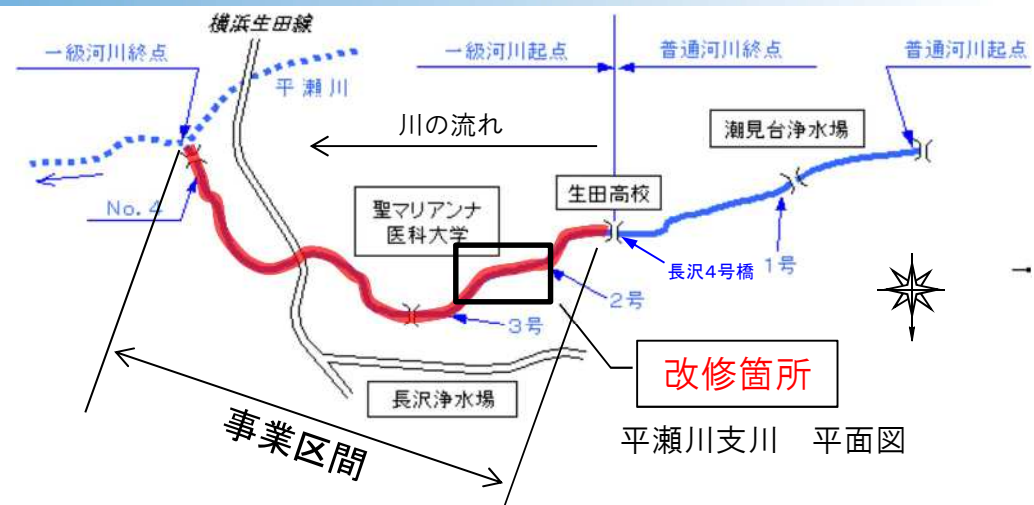

整備前



整備後

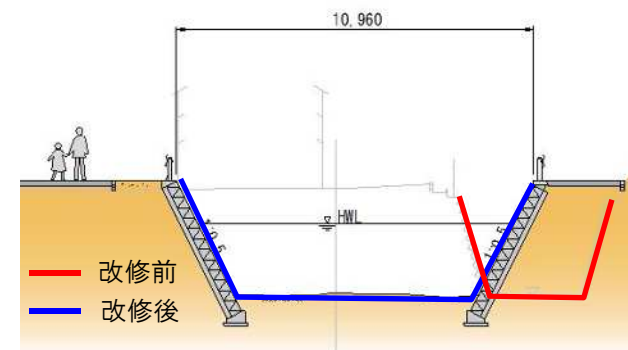

改修前後の河道断面

1 平瀬川支川 都市基盤河川改修事業

○令和2年～令和6年整備箇所詳細



両側護岸整備箇所
前後区間が現河道のため擦り付け区間
を要し河道拡幅区間はわずかであった

2 三沢川 準用河川改修事業

事業箇所：準用河川三沢川




2 三沢川 準用河川改修事業

河道拡幅

○本計画期間中の事業内容

- ・ 事業区間：三沢川（麻生区黒川）
- ・ 事業内容：測量委託、設計委託、用地買収
- ・ 事業期間：令和2年度～令和6年度

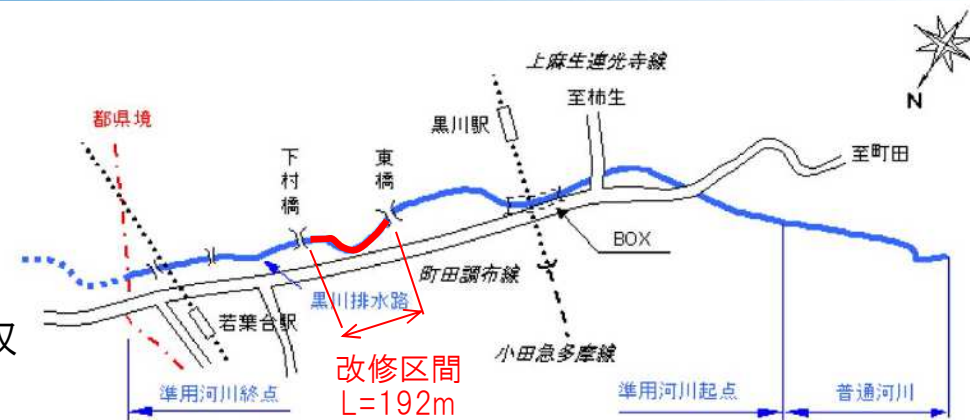


○事業実施内容（実績）

- ・ 事業内容：測量委託、設計委託、用地買収(730m²)
令和2年3月末用地取得率 19%
令和7年3月末用地取得率 58% 予定
- ・ 事業期間：令和2年度～令和6年度

○効果

時間雨量50mm相当の降雨に対応可能な河道を整備するための測量、設計、用地買収を進めた。引き続き、事業の完了に向け取り組んでいく。

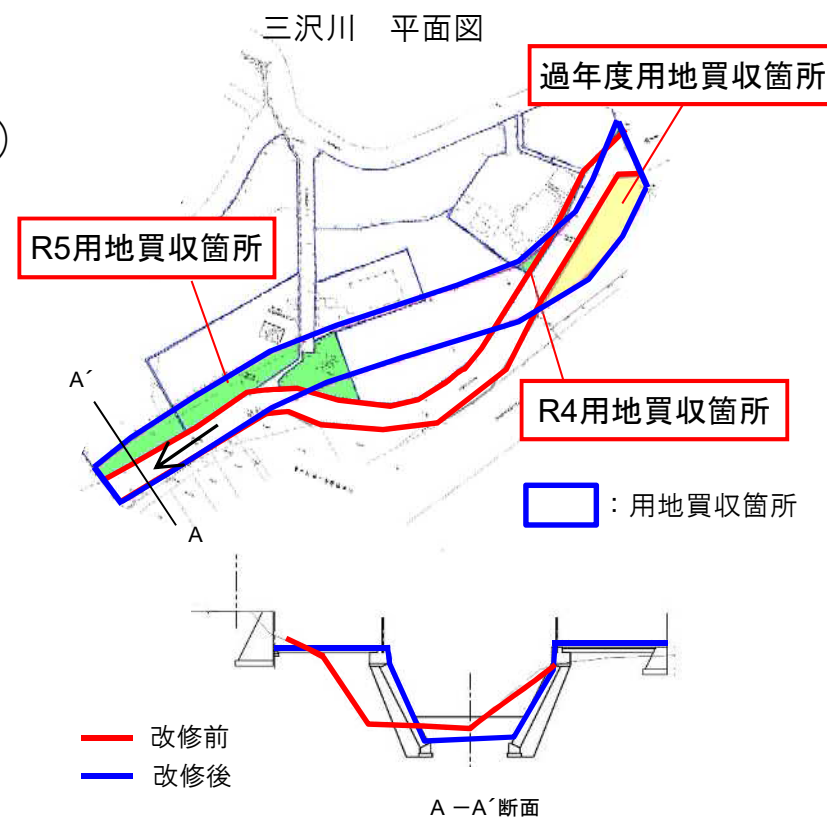

3 麻生川 準用河川改修事業

事業箇所：準用河川麻生川




3 麻生川 準用河川改修事業

河道拡幅

○本計画期間中の事業内容

- ・ 事業区間：柿生橋（麻生区片平）
- ・ 事業内容：橋梁架替、河道拡幅
- ・ 事業期間：令和2年度～令和6年度

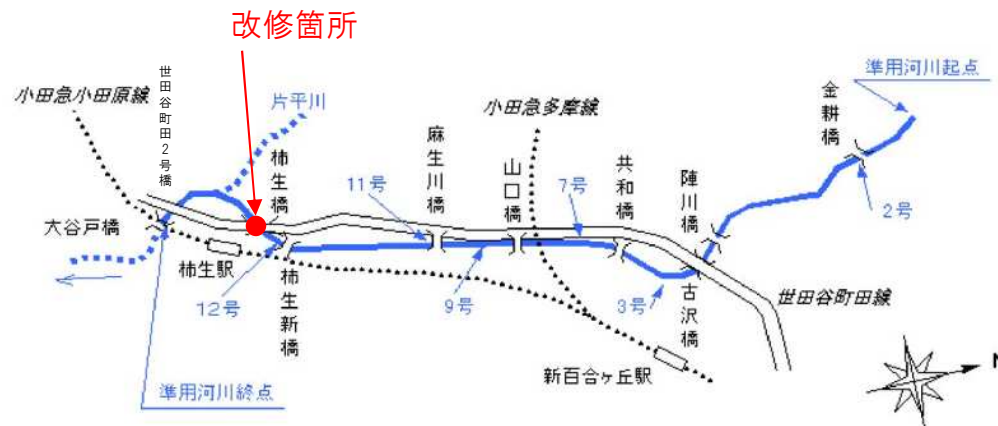

○事業実施内容（実績）

事業内容：橋梁架替 1 橋 河道拡幅 10m

準用河川麻生川延長 2,905m

令和2年3月末 整備済み延長 2,885m（整備率 99.3%）

令和7年3月末 整備済み延長 2,895m（整備率 99.6%） 予定

事業期間：令和2年度～令和6年度



柿生橋架替前



橋梁架替後

○効果

柿生橋の架け替えが完了したことにより、河道断面が時間雨量50mm相当に対応できるようになったことから、治水安全度が向上した。

4 平瀬川 都市基盤河川改修事業

事業箇所：一級河川平瀬川



4 平瀬川 都市基盤河川改修事業

堤防整備

○本計画期間中の事業内容（令和6年度追加）


- ・ 事業区間：平瀬川（高津区久地）
- ・ 事業内容：仮設工
- ・ 事業期間：令和6年度

○事業実施内容（実績）

事業内容：仮設工（準備工）
事業期間：令和6年度

○効果


多摩川の堤防と同程度の堤防整備に向け、令和6年度は準備工を実施した。引き続き、事業の完了に向け取り組んでいく。

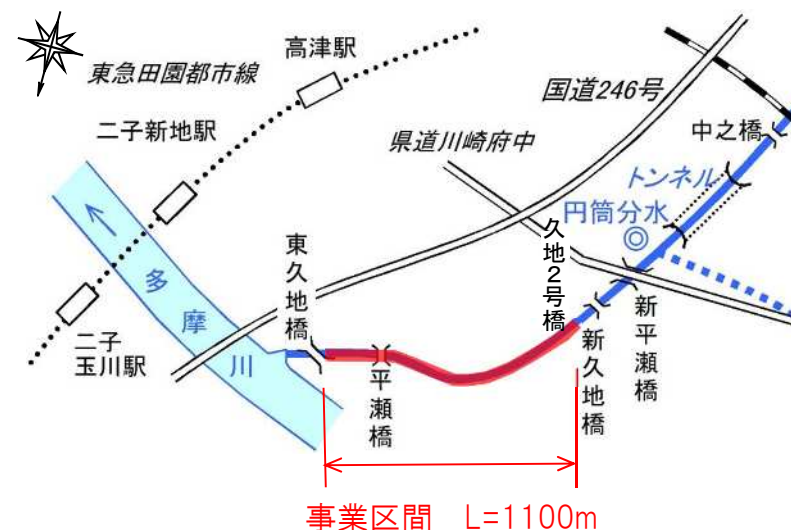

河川整備のイメージ（平瀬川）




整備前

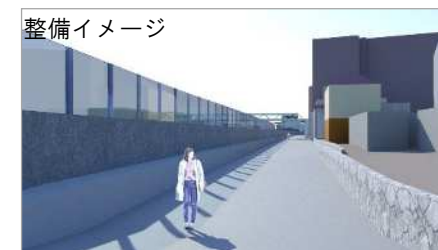

整備後

5 平瀬川 施設機能向上事業

事業箇所:一級河川平瀬川

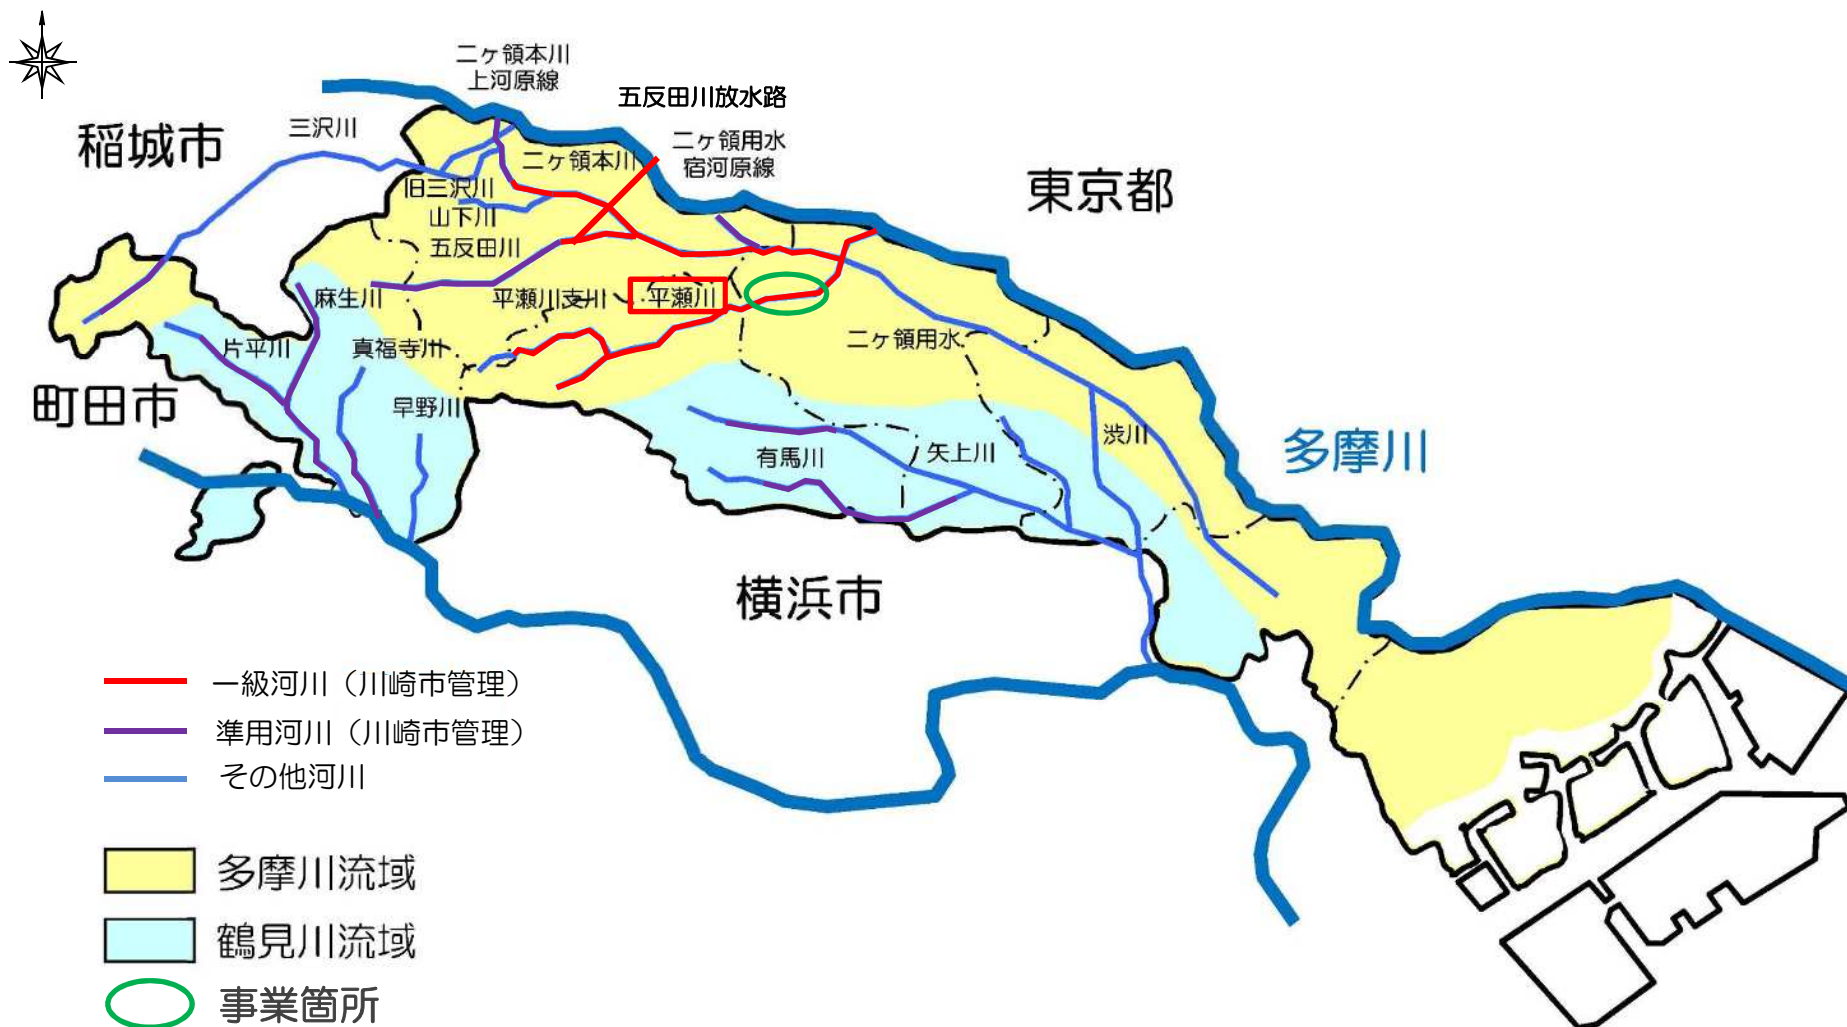

5 平瀬川 施設機能向上事業

機能向上（護岸耐震化）

○本計画期間中の事業内容（令和3年度追加）



- ・ 事業区間：新井台橋～前橋（高津区上作延）
- ・ 事業内容：護岸耐震化
- ・ 事業期間：令和3年度～令和6年度

○事業実施内容（実績）


- ・ 事業内容：護岸耐震化
耐震化対策延長（優先区間）168m※
※護岸は河川の両岸（右岸・左岸）に対して行うため
河川延長である168mの2倍が対策予定延長となる
対策済み延長 40m（令和7年3月末）
耐震化率 11.9%（令和7年3月末）
- ・ 事業期間：令和3年度～令和6年度

○効果

老朽化した護岸を耐震化することにより
地震時の治水安全度が向上した。

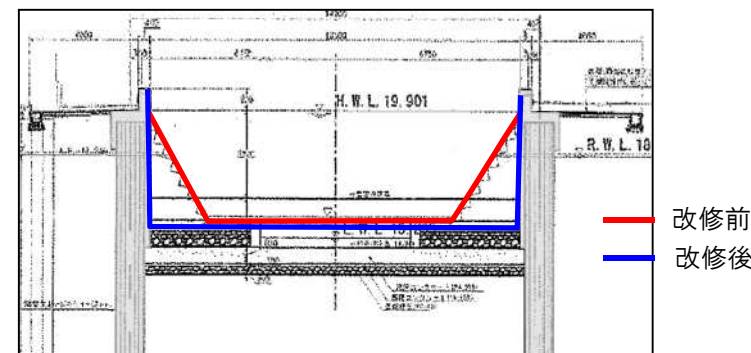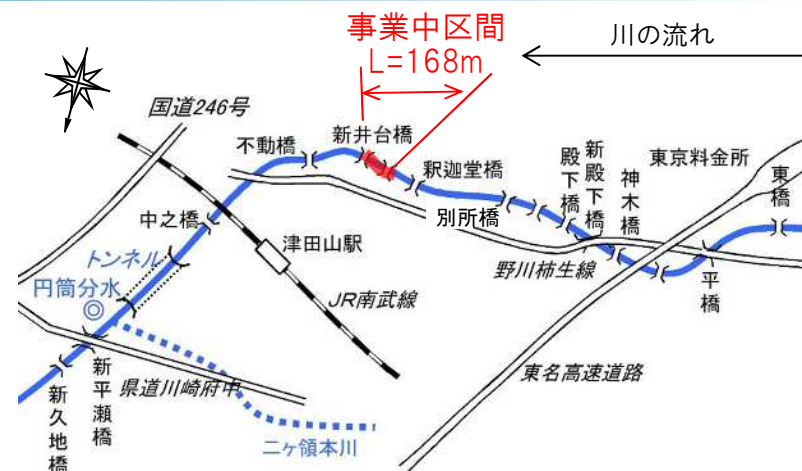

平瀬川横断面図

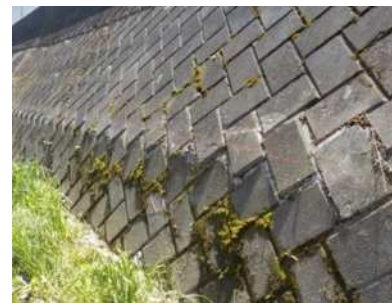

護岸の変状（整備前）



整備後
