


川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業進捗図 (令和5年1月15日時点)

凡 例

仮換地指定箇所	
宅地使用開始箇所	
道路整備箇所 (暫定整備も含む)	

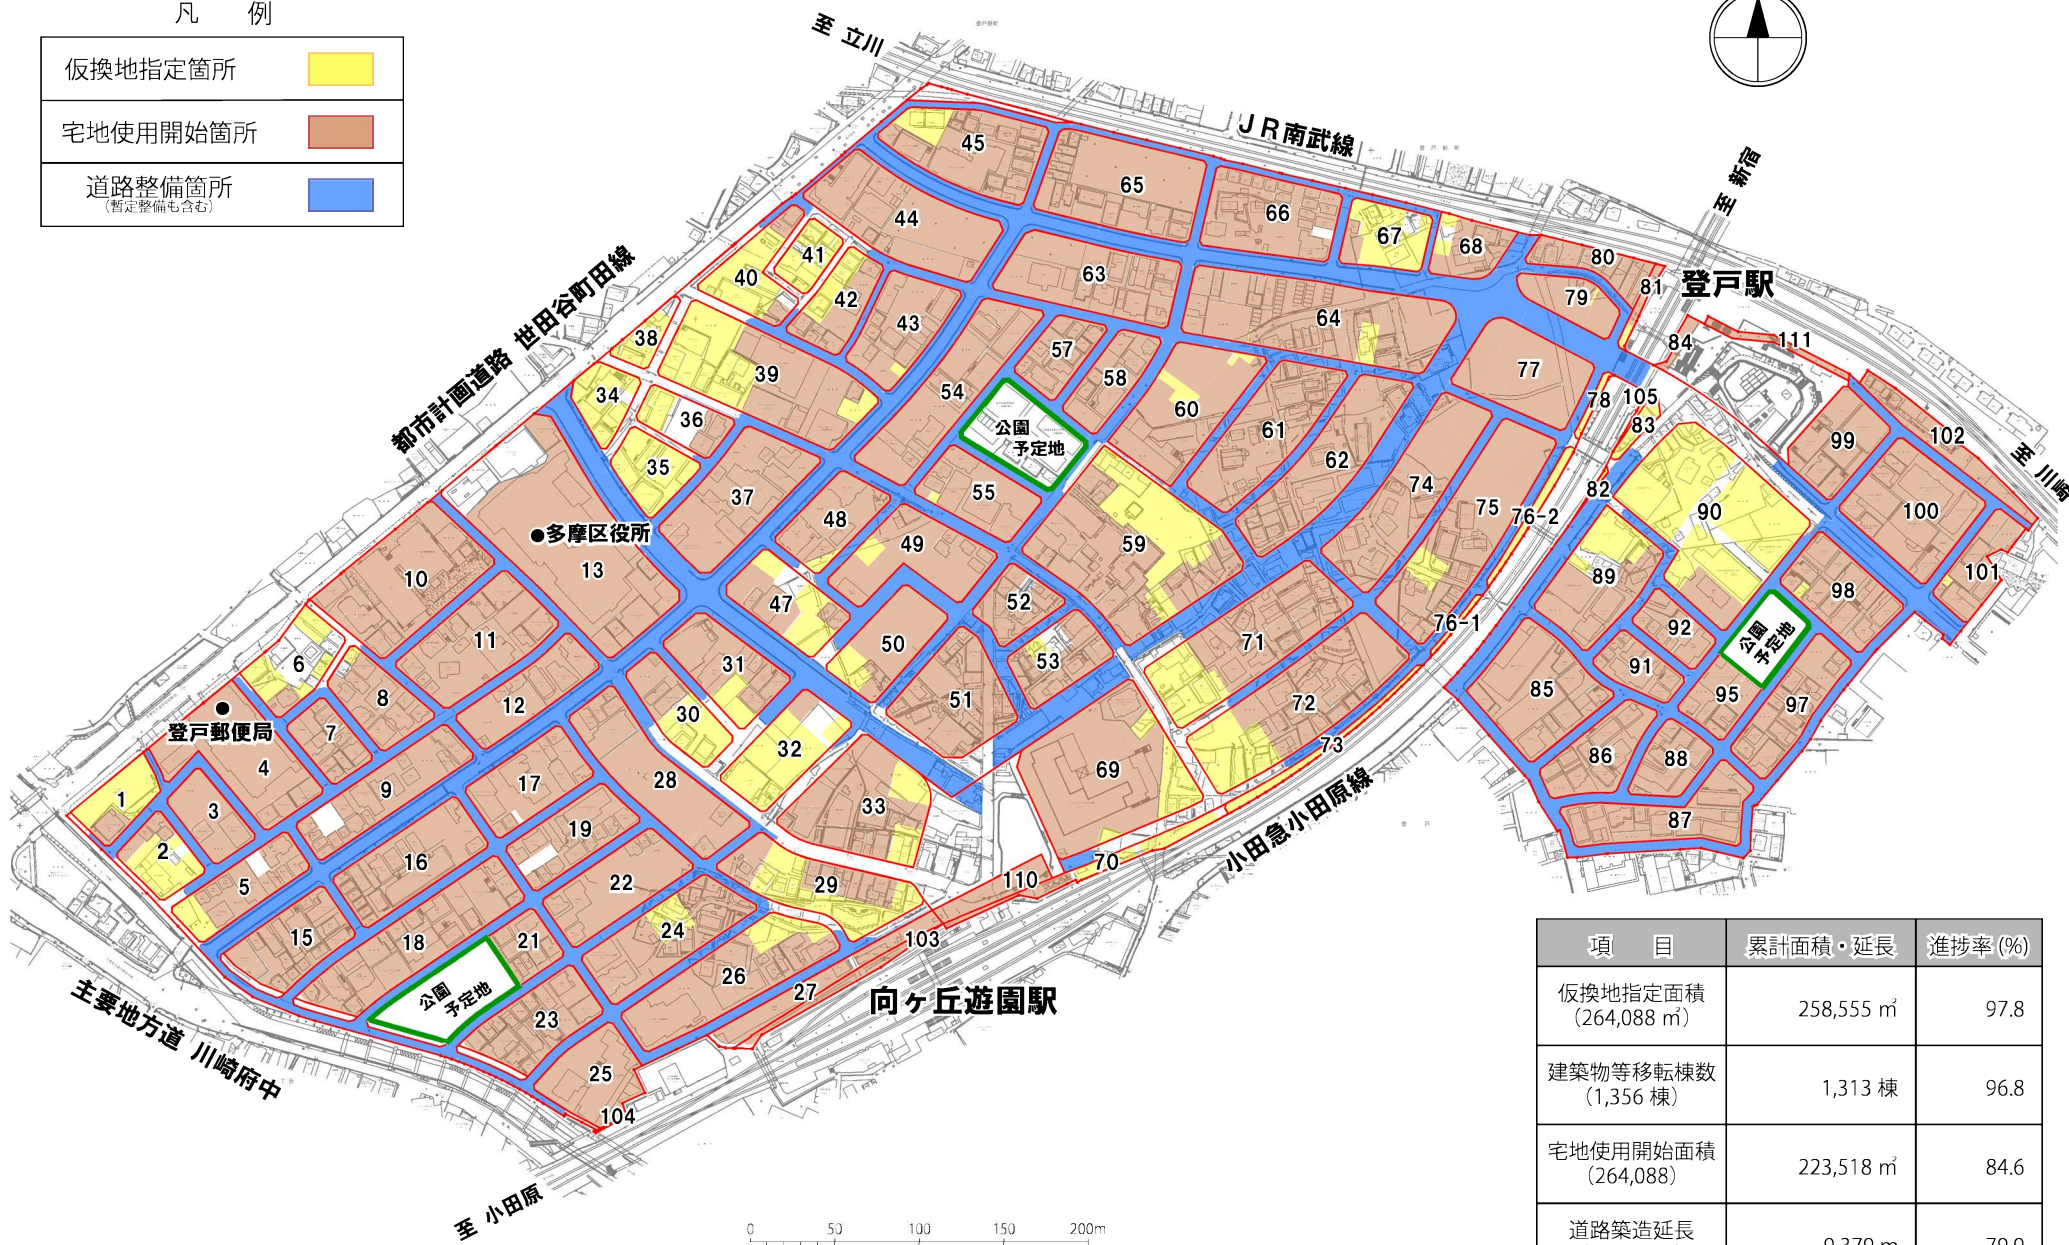

項 目	累計面積・延長	進捗率(%)
仮換地指定面積 (264,088 m ²)	258,555 m ²	97.8
建築物等移転棟数 (1,356 棟)	1,313 棟	96.8
宅地使用開始面積 (264,088)	223,518 m ²	84.6
道路築造延長 (11,734 m)	9,379 m	79.9
