


川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業進捗図 (令和6年4月1日時点)

凡 例

|                     |   |
|---------------------|---|
| 仮換地指定箇所             |  |
| 宅地使用開始箇所            |  |
| 道路整備箇所<br>(暫定整備も含む) |  |

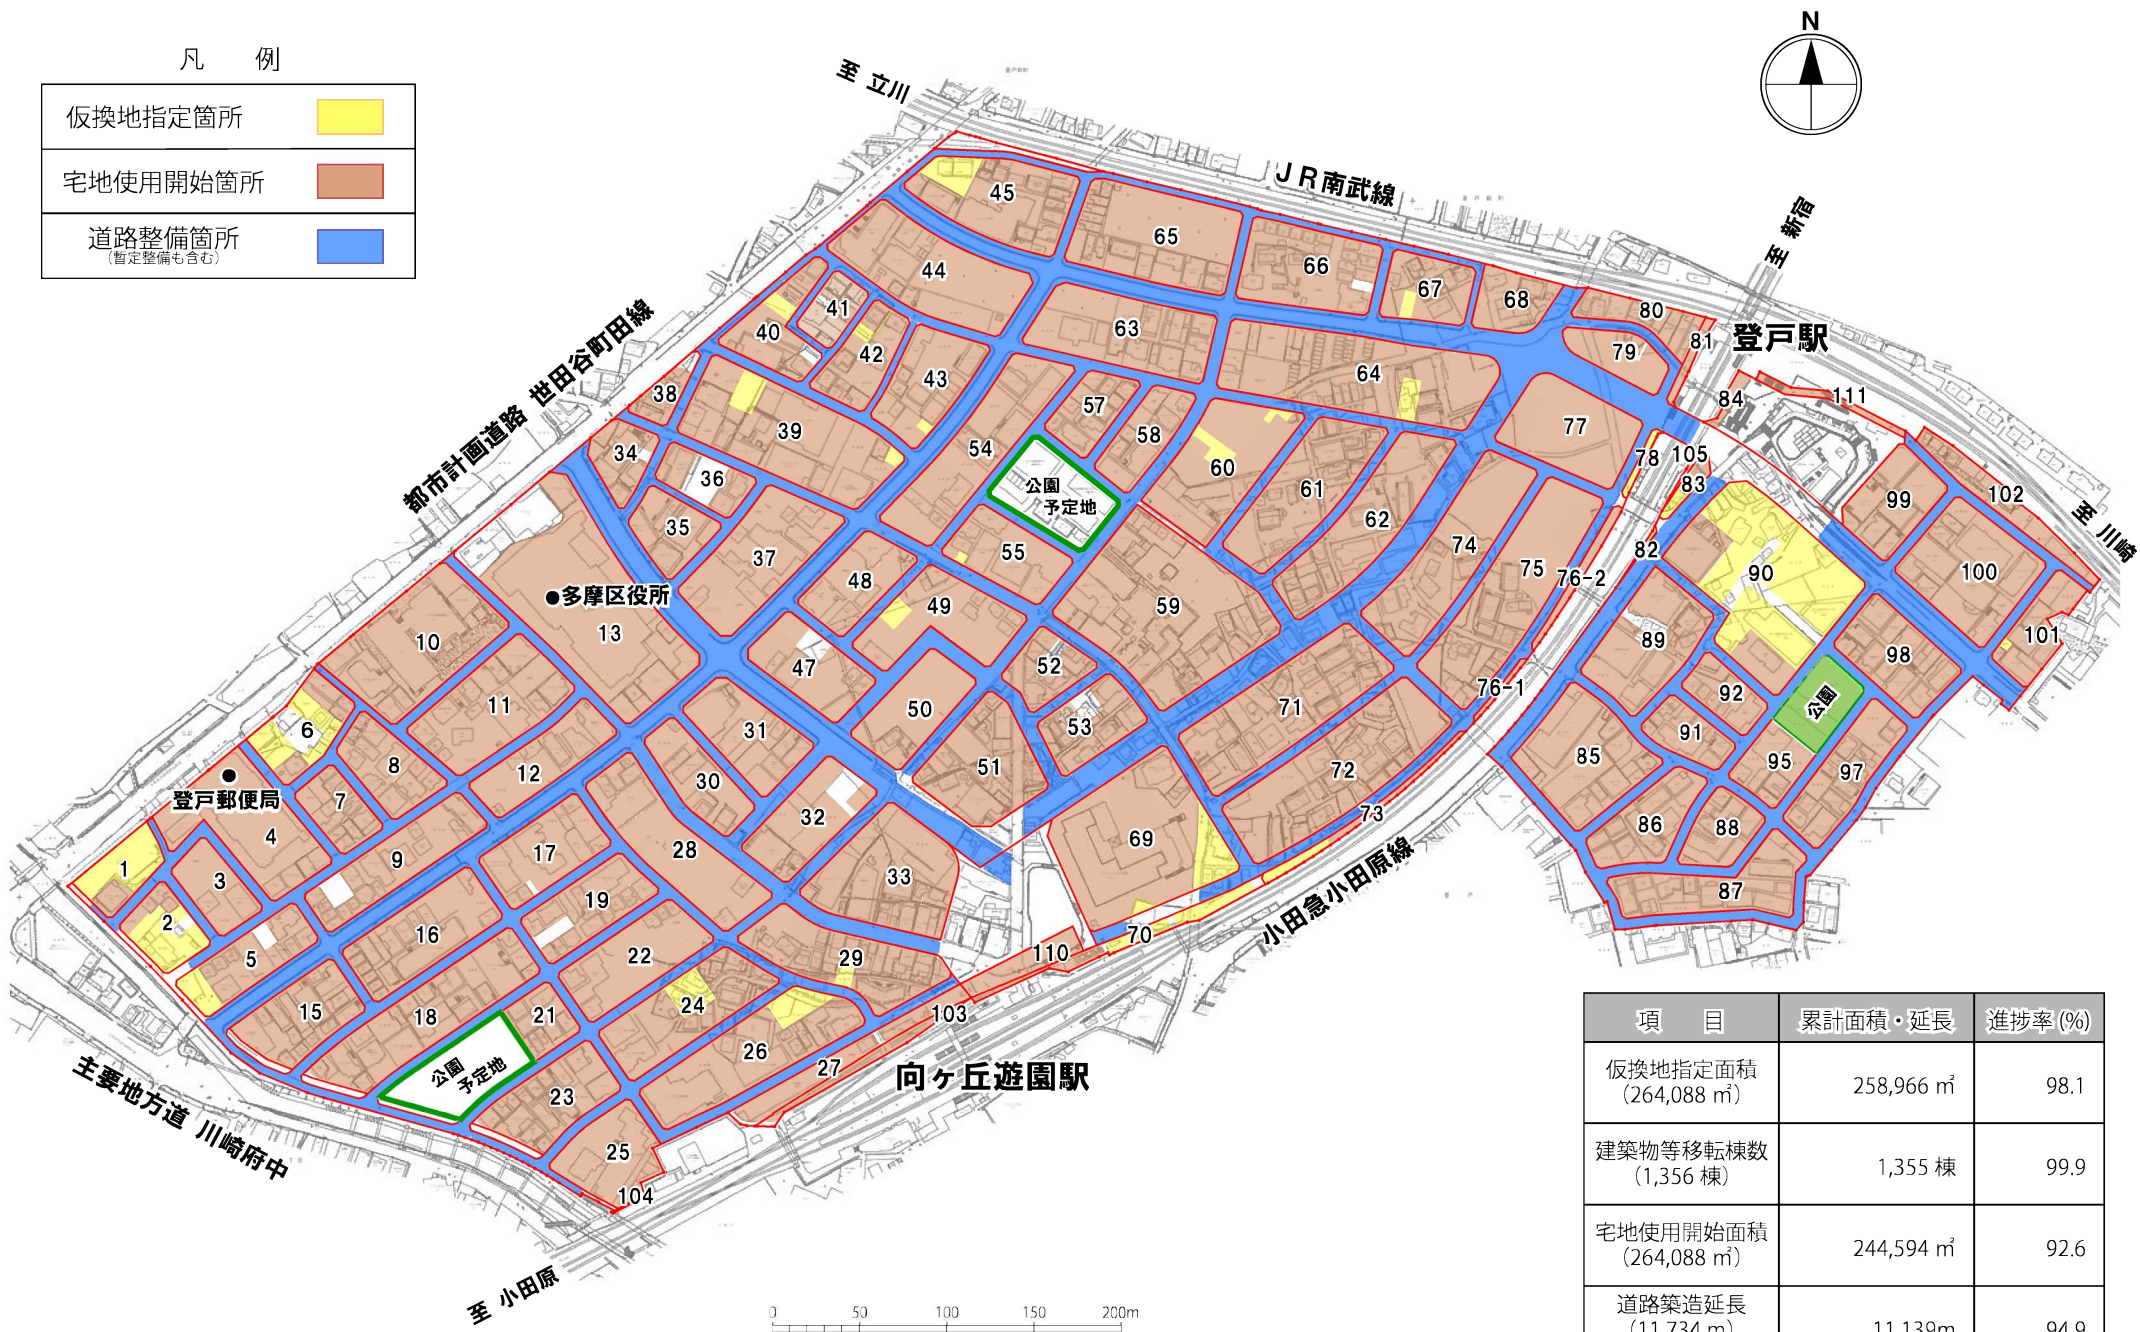

| 項 目                                   | 累計面積・延長                | 進捗率(%) |
|---------------------------------------|------------------------|--------|
| 仮換地指定面積<br>(264,088 m <sup>2</sup> )  | 258,966 m <sup>2</sup> | 98.1   |
| 建築物等移転棟数<br>(1,356 棟)                 | 1,355 棟                | 99.9   |
| 宅地使用開始面積<br>(264,088 m <sup>2</sup> ) | 244,594 m <sup>2</sup> | 92.6   |
| 道路築造延長<br>(11,734 m)<br>※駅前広場を除く      | 11,139m                | 94.9   |
