


都市計画道路苅宿小田中線（Ⅲ期）道路築造（立体交差化）工事 工事進捗状況について

令和3年5月吉日

工事概要

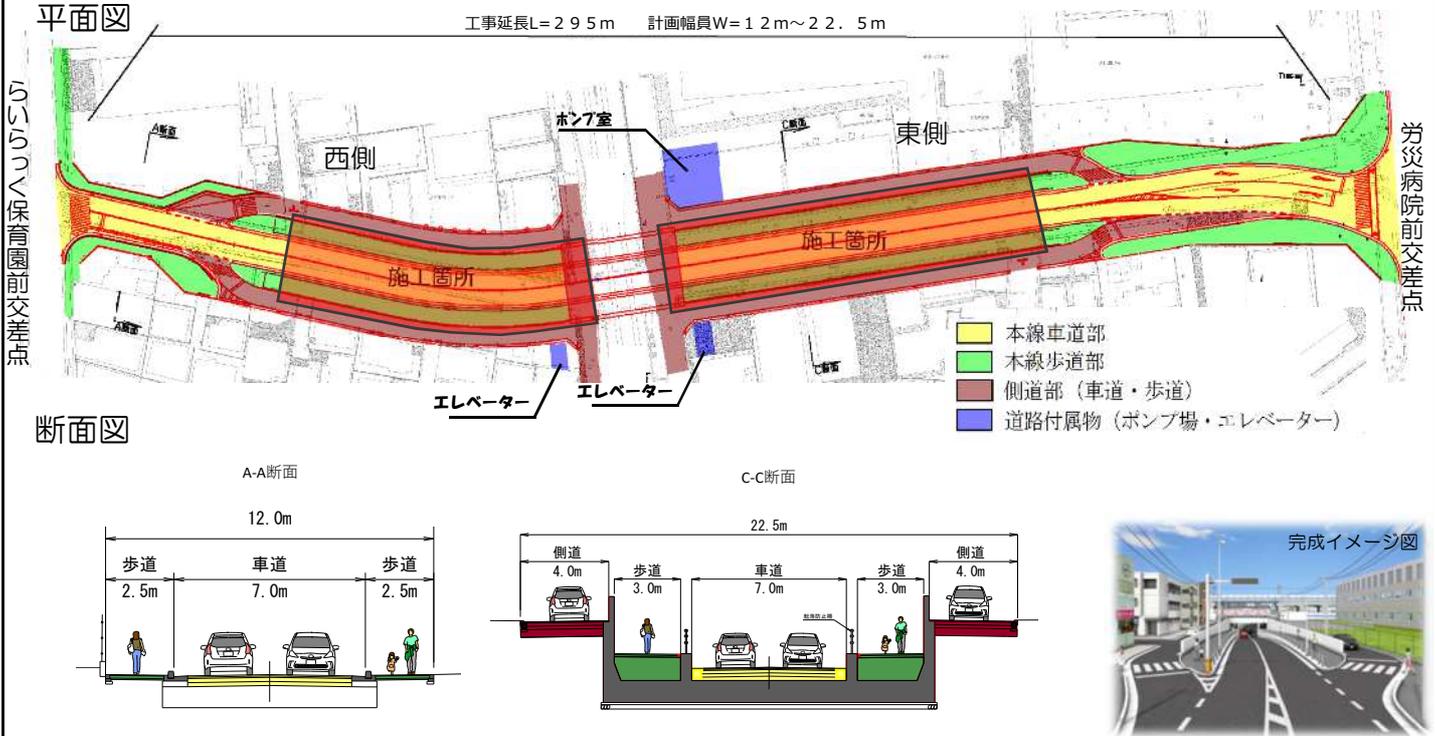

進捗状況 東側(令和3年4月時点)

本工事の東側につきましては、鋼矢板の打設を行っております。鋼矢板の打設完了後は、中間杭の打設および覆工板の設置を行ってまいります。

1. 切回し仮舗装工




2. 鋼矢板・中間杭打設工



3. 路面覆工工



4. 掘削・土留工

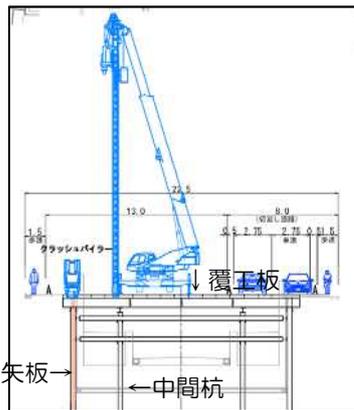

2. 鋼矢板打設

掘削に伴い、周辺地盤の変動が無いように、鋼矢板という鉄の板で掘削する範囲を囲う工事です。

地下にとっても固い層があり、オガ-機械で土をほぐしながら鋼矢板を圧入する工法です。

進捗状況 西側(令和3年4月時点)

本工事の西側につきましては、東側同様、鋼矢板の打設を行っております。鋼矢板の打設完了後は、中間杭の打設および覆工板の設置を行ってまいります。

1. 切回し仮舗装工




2. 鋼矢板・中間杭打設工



3. 路面覆工工




4. 掘削・土留工

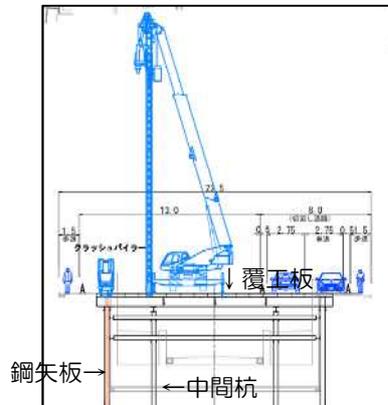

2. 鋼矢板打設
東側と同様の工法です。圧入機を吊り上げるクレーンと鋼矢板を吊り上げるクレーンの2台が必要となります。

今後の予定について

- 今年の夏頃、道路切り回し（南側・元住吉駅側）を予定しております。切り回し後は、現在行っている工事と同様の工法を行います（右図参照）。



- 鋼矢板・中間杭施工後、掘削を開始する前に右の写真のような覆工板を敷き並べます。設置後は、覆工板上を車・歩行者が通行することになります。
- 今後、側道部分の一部通行止め、鉄道近接部分の夜間施工を予定しております。周辺の方々には、随時お知らせを配布する予定です。
- 交通規制について
路面覆工工事に伴い、令和4年3月以降に踏切通行止め(車両)を予定しております(1回目/全3回)。
※詳細は、市HPに掲載します。



皆様には、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

ご不明な点等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。

■問合せ先

川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
フジタ・織戸共同企業体

TEL : 044-755-2277

TEL : 044-982-9091
