

文教委員会資料

【宮前平中学校の校舎増築について】

資料 宮前平中学校の校舎増築について . . . 2

令和6年1月26日
教育委員会事務局

1 事業の概要について

本事業は、宮前平中学校の生徒増加に伴う教室不足を解消するため、現在のテニスコートに増築校舎を整備する計画となっています。

【増築校舎の概要】

所在地	宮前区宮前平2-7	建築面積	594.39㎡
事業費※	約9億円	延べ面積	1,575.83㎡
工事内容	R C造、3階建、高さ12.93m、校舎増築（特別支援教室4室、特別教室他）、屋外付帯等 ※増築に係る工事費（建築、電気設備、衛生設備、冷暖房設備、昇降機設備の各工事）と工事監理費の合計		

2 完成時期について

令和7年4月からの増築校舎供用開始に向けて令和5・6年度工事の進めを進めていましたが、令和5年9月の入札が不調となったことにより供用開始が遅れることとなりました。

宮前平中学校は早期に増築校舎の整備が必要であることから、令和6・7年度工事として再発注の進めを急ぎ、令和7年10月の増築校舎完成に向けて調整を進めています。


【工事工程の概要】

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度以降	
当初工程	準備工	本体工事	供用	内部改修	
現在予定工程		準備工	本体工事	供用	内部改修（※）

（※スケジュールについては今後調整）

当初計画から約6か月の遅延

（参考）増築校舎配置図

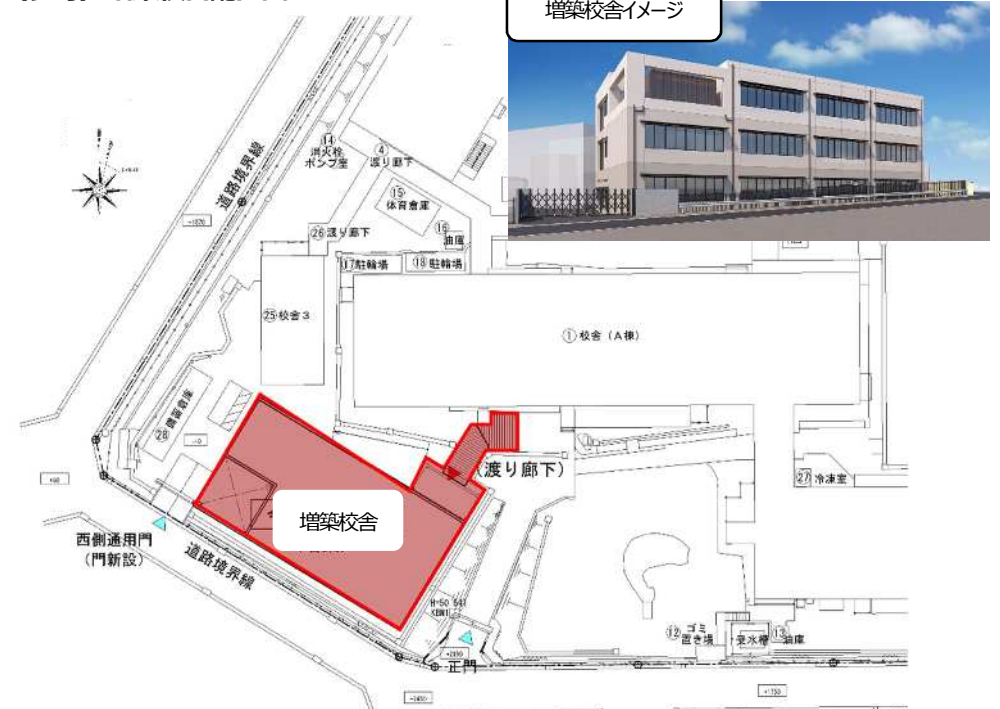

3 事業費の増額について

入札不調により事業の開始年度が遅れ、建築コストの高騰等の影響を受けたことから、事業費全体で約2億円の増額（約9億円→約11億円）となる見込みです。

【増額の主な項目】

【増額の主な項目】		増額計
建築コストの高騰	労務単価、材料単価等の上昇に伴う増額	約2億円

4 補正予算等について

令和5年度予算が不要となることから、令和6年第1回市議会定例会に令和5年度予算の減額補正の議案を提出し、併せて令和6年度当初予算に再計上する予定です。

【補正予算の概要】

	R5年度	R6年度
予算	当初予算	再計上
	減額補正	

5 今後のスケジュールについて

早期に増築校舎を整備するため契約準備により令和5年度から進め、市議会に建築工事の契約議案を提出する予定です。

【契約議案】

令和6年第2回市議会定例会

【令和6年の建築工事の契約に係る主な予定】

	3月	4月	5月	6月	7月
契約手続	入札	仮契約	（提出予定の契約議案についての報告） ・教育委員会	契約議案提出 ・令和6年第2回市議会定例会	契約締結
