

井田病院再編整備事業Ⅲ期工事のスケジュールの見直しについて

平成27年3月に着手しました井田病院Ⅲ期工事のうち建築工事について、このたび契約手続きの遅延により、立体駐車場等の供用開始が遅れることになりましたのでお知らせします。

1 建築工事の概要

(1) 構造・規模

ア 立体駐車場

鉄骨造地上2階建（自走式 スキップフロア方式）

建築面積 約2,200㎡

延べ面積 約2,900㎡（約150区画）

イ 院内保育園

鉄筋コンクリート造1階建

建築面積 約300㎡

延べ面積 約300㎡

ウ その他

バス停・歩道庇、外構（バスロータリー等）、

既存建築物解体（杭撤去等）工事ほか


(2) 計画事業費

1,215,842千円

(3) 工期(見込み)

14ヶ月

2 Ⅲ期工事のスケジュールの見直し

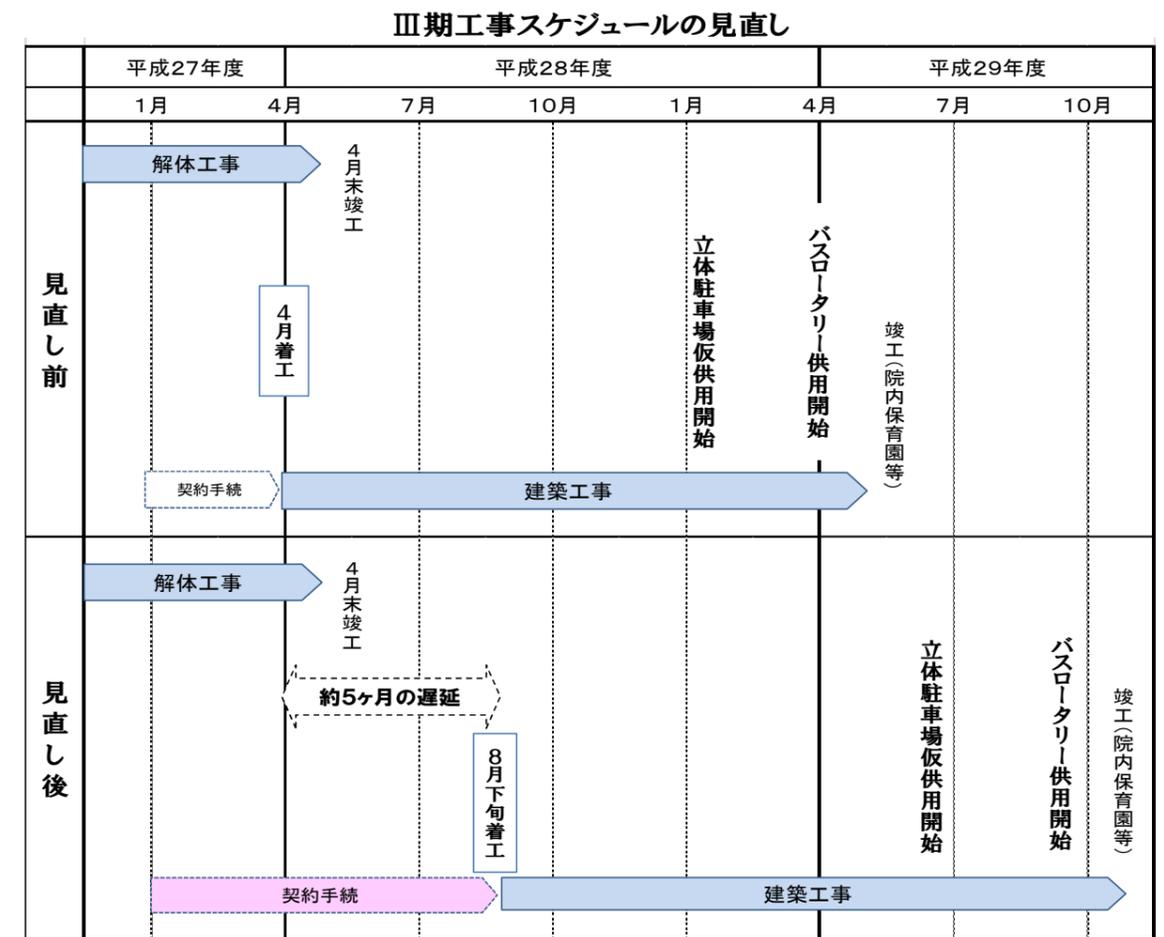


※ スケジュールは、入札時に入札業者が提出することになりますので現時点では想定になります。


3 工事期間中の暫定対応について

立体駐車場の仮供用開始までは、現在の仮設駐車場(約120区画)を引続き使用し、工事期間中も駐車場を確保します。

井田病院再編整備事業 III期工事イメージ図

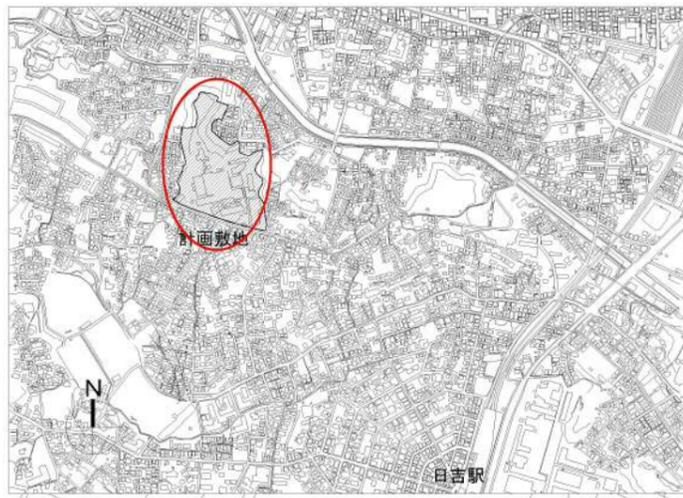

敷地案内図

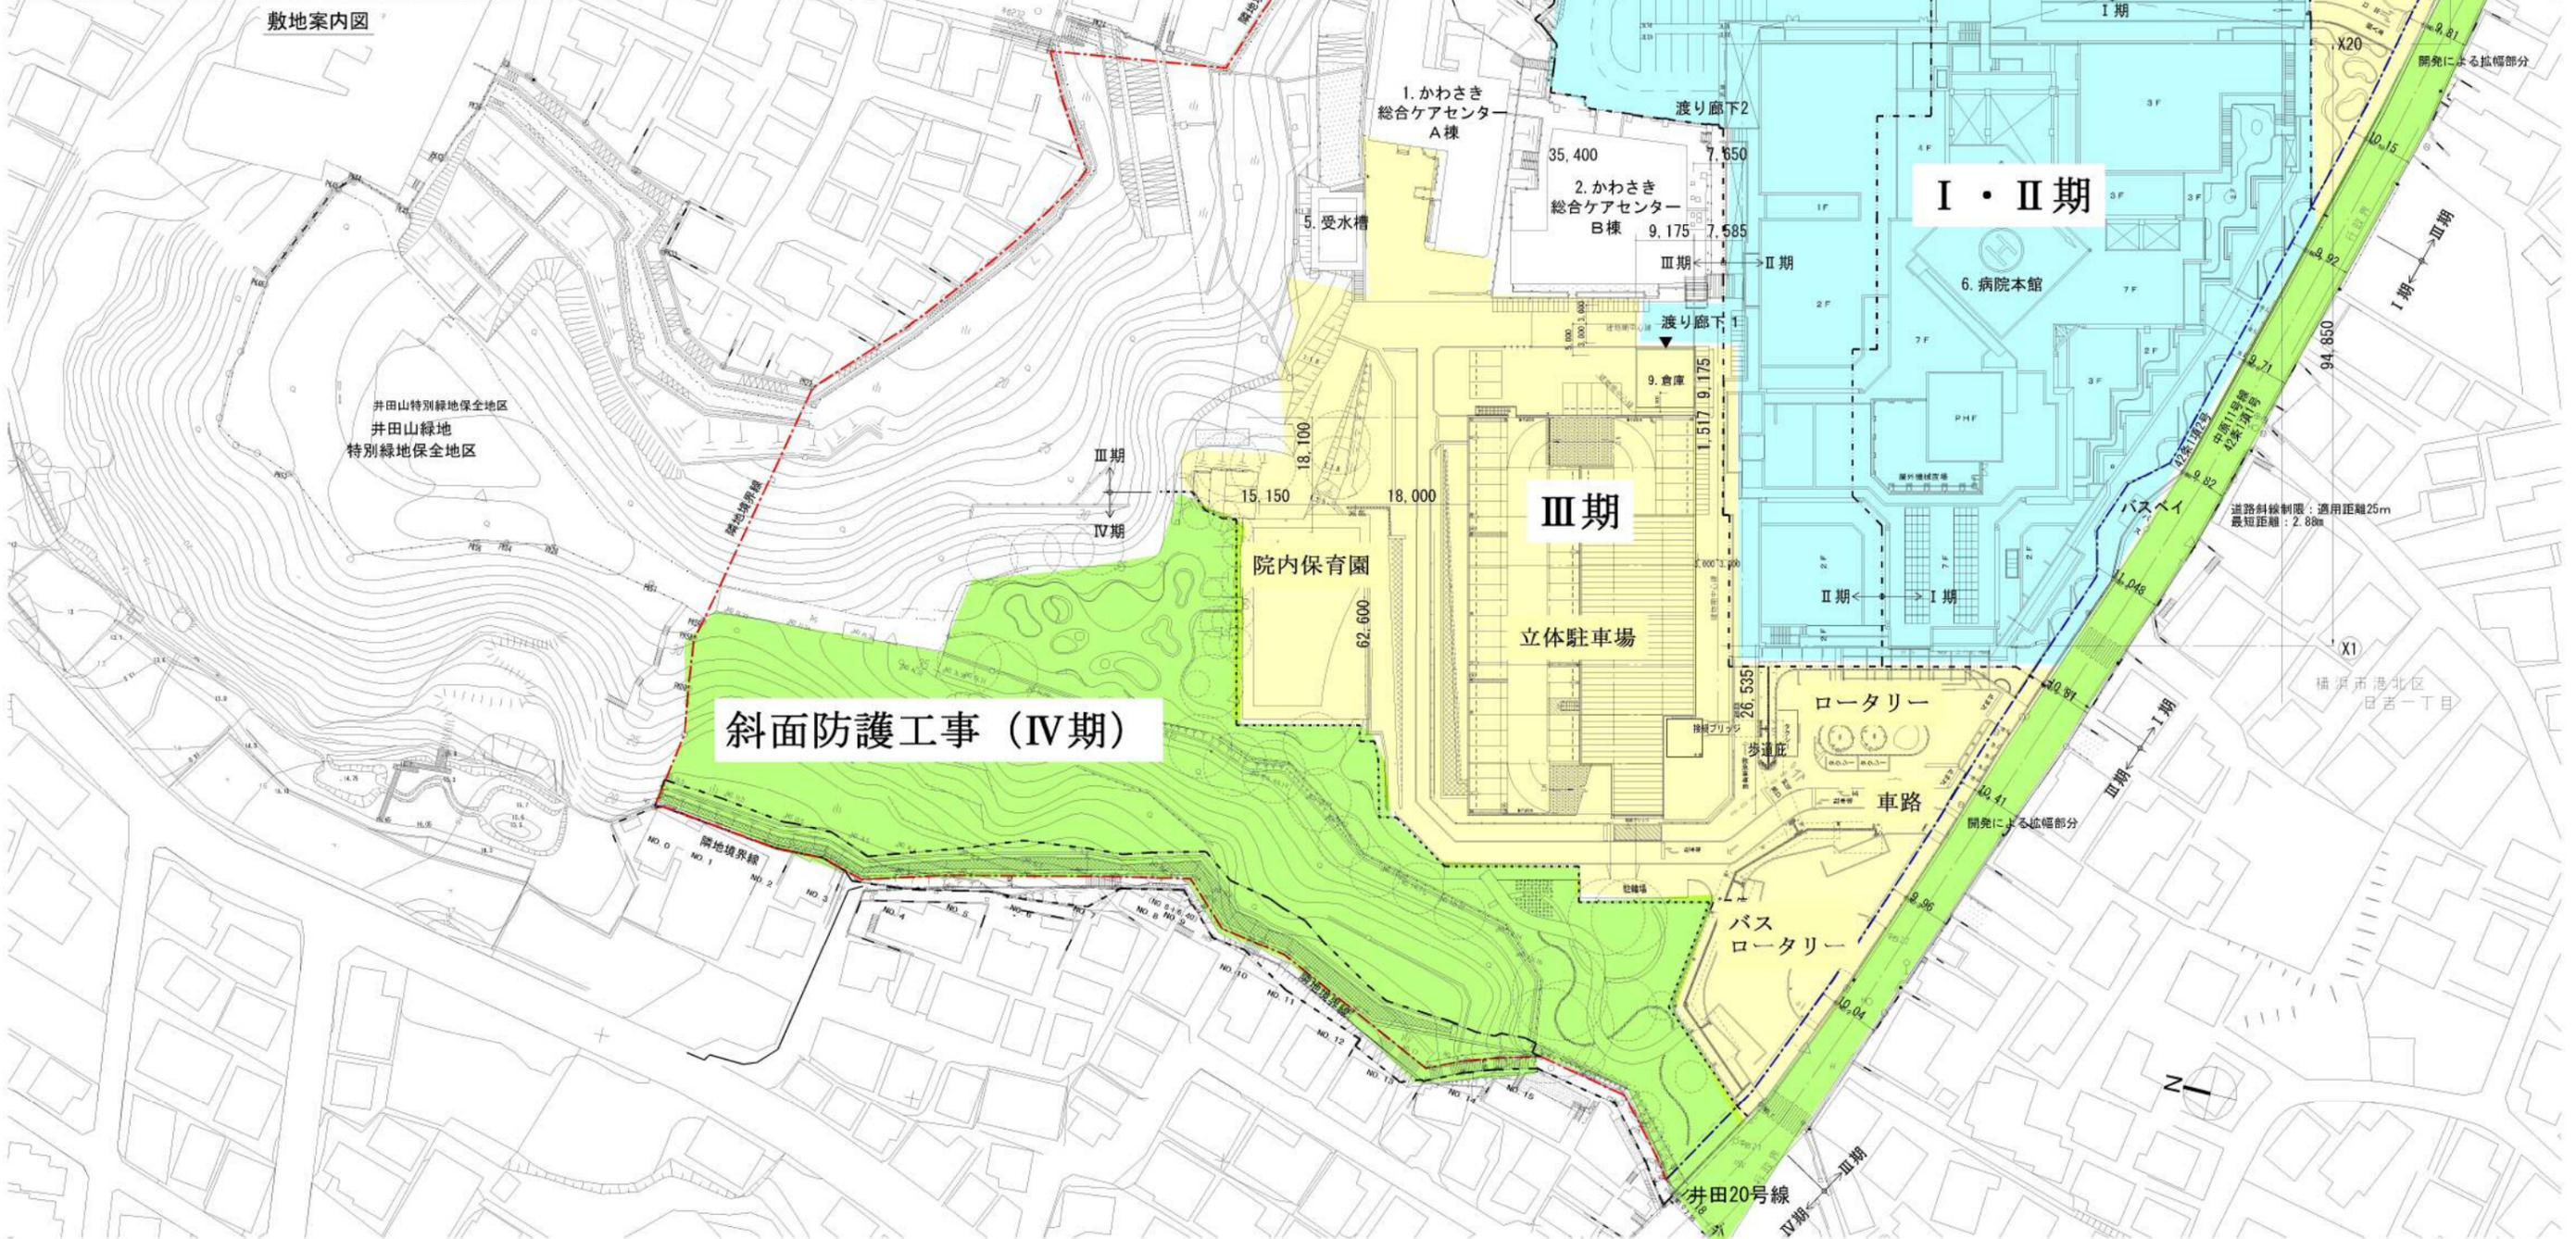

井田病院再編整備事業概要

1 目的等

井田病院は、昭和24年に設置し、現在では、南部地域の中核・地域がん診療連携拠点病院として、増大するがん等の成人疾患医療、救急医療、緩和ケア医療を担うほか、市内唯一の結核病床を有する病院として、結核患者への透析の対応も行っています。市の中心部における地域住民の医療ニーズを満たす公立病院として、その機能を果たしています。

病院施設としては、1号棟を昭和35年に、2号棟を昭和45年に、3号棟を昭和50年に、緩和ケア病棟を平成10年にそれぞれ建設し、これらの4棟で構成されていました。しかしながら、1号棟から3号棟は、昭和56年以前の旧耐震設計基準に基づいて建てたもので、耐震診断の結果、早急な対応が必要な状況にあり、また、老朽化も進んでいたため、平成17年度に基本構想を策定し、医療機能の強化を基本に再編整備を推進しています。

総事業費：15,743,139千円

2 工事経過と予定

(1) 経過

平成17年度	基本構想策定
平成18年度	基本計画策定
平成19年度	基本設計
平成20年度	実施設計

○ 平成21年4月から8月まで	準備工事 結核病棟の移設等
○ 平成21年7月から平成26年12月まで	I・II期工事 旧1号棟の解体等 I期工区病院棟の建築 I期建物引渡し 一部開院 旧2号棟、看護宿舎の解体等 II期工区病院棟の建築等 I・II期工事竣工 全面開院
(平成24年 1月)	
(平成24年 5月)	
(平成26年12月)	
(平成27年 4月)	
○ 平成27年3月から平成28年4月まで	III期工事(解体) 旧3号棟の解体等

(2) 今後の予定

- ア III期工事(建築工事)
立体駐車場、院内保育園、バスロータリーの整備等
- イ 斜面防護工事
井田病院西側斜面防護、公道の復元工事等
- ※ 継続費対象外

井田病院改築工程概要

