

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-001	下水道事業	戸手ポンプ場(地震対策)	H30	70	雨水ポンプ棟(管理棟)	0 ----- 70	0.0%	雨水ポンプ棟(管理棟)	-	別紙1	○		
A07-002	下水道事業	京町・渡田地区等(浸水対策)	H29 R3	930	L=1,600m等	0 ----- 930	0.0%	L=1,600m等	-	別紙1			○
A07-003	下水道事業	大師河原・大師臨港地区(合流改善)	H30 R3	1,820	送水ポンプ棟	1,516 ----- 1,820	83.3%	送水ポンプ棟	-	別紙1			○
A07-004	下水道事業	六郷遮集幹線(合流改善)	H30 R3	5,880	L=2,850m	1,904 ----- 5,880	32.4%	L=2,850m	-	別紙1			○
A07-005	下水道事業	天王森ポンプ場(地震対策)	H30 H31	10	雨水ポンプ棟(管理棟)	0 ----- 10	0.0%	雨水ポンプ棟(管理棟)	-	別紙2			○
A07-006	下水道事業	加瀬水処理センター(地震対策)	H31 R3	120	塩素混和地	56 ----- 210	26.7%	最終沈殿池、塩素混和地等	対象追加	別紙2			○
A07-007	下水道事業	等々カポンプ場(地震対策)	H30 R1	20	雨水ポンプ棟(管理棟)	31 ----- 20	155.0%	雨水ポンプ棟(管理棟)	-	別紙3	○		
A07-008	下水道事業	三沢川地区(浸水対策)	H30 R3	840	L=1,400m	172 ----- 840	20.5%	L=1,400m	-	別紙3			○
A07-009	下水道事業	土橋地区(浸水対策)	R1 R3	1,300	L=1,300m	200 ----- 1,300	15.4%	L=1,300m	-	別紙3			○
A07-010	下水道事業	観音川ポンプ場(地震対策)	R1 R3	-	-	0 ----- 10	0.0%	汚水ポンプ棟等	追加	別紙1	○		
A07-011	下水道事業	丸子ポンプ場(地震対策)	R1 R3	-	-	0 ----- 50	0.0%	汚水ポンプ棟等	追加	別紙2		○	

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-012	下水道事業	渡田ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	549	124.8%	沈砂池施設、雨水ポンプ 施設等	追加	別紙1			○
			R3			440							
A07-013	下水道事業	大島雨水滞 水池地震時 機能停止リス ク低減対策	H30	-	-	66	94.3%	監視制御設備等	追加	別紙1			○
			R3			70							
A07-014	下水道事業	京町ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			60							
A07-015	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (観音川ポン プ場)	R1	-	-	0	0.0%	消毒設備等	追加	別紙1			○
			R3			20							
A07-016	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (京町ポンプ 場)	R1	-	-	112	93.3%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			120							
A07-017	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (江川貯留 管)	R1	-	-	0	0.0%	貯留管水位等	追加	別紙1			○
			R3			10							
A07-018	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (広域ネット ワーク)	R1	-	-	175	33.7%	光ファイバーケーブル等	追加	別紙1、2、3、4			○
			R3			520							
A07-019	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (江川ポンプ 場)	R1	-	-	1,065	91.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙2			○
			R3			1,170							
A07-020	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (渋川ポンプ 場)	R1	-	-	158	54.5%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙2			○
			R3			290							
A07-021	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (古市場ポン プ場)	R1	-	-	0	0.0%	揚水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			10							
A07-022	下水道事業	大島ポンプ 場地震時機 能停止リス ク低減対策	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			260							

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率	事業内容 (延長・面積・箇所数等)			完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-023	下水道事業	大島雨水滞 水池地震時 機能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	293	35.3%	受変電設備等	追加	別紙1			○
			R3			830							
A07-024	下水道事業	渡田ポンプ 場地震時機 能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	21	1.2%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			1,760							
A07-025	下水道事業	渡田雨水滞 水池地震時 機能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	251	35.9%	受変電設備等	追加	別紙1			○
			R3			700							
A07-026	下水道事業	京町ポンプ 場地震時機 能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			250							
A07-027	下水道事業	京町雨水滞 水池地震時 機能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	251	39.8%	受変電設備等	追加	別紙1			○
			R3			630							
A07-028	下水道事業	観音川ポン プ場地震時 機能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			1,070							
A07-029	下水道事業	観音川雨水 滞水池地震 時機能停止 リスク低減 対策	R1	-	-	185	30.3%	監視制御設備等	追加	別紙1			○
			R3			610							
A07-030	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (戸手ポン プ場)	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙1			○
			R3			70							
A07-031	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (加瀬ポン プ場)	R1	-	-	0	0.0%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙2			○
			R3			1,650							
A07-032	下水道事業	雨水対策施 設の改築 (洪川貯留 管)	R1	-	-	0	0.0%	監視制御設備等	追加	別紙2			○
			R3			390							
A07-033	下水道事業	丸子ポンプ 場地震時機 能停止リ スク低減対 策	R1	-	-	507	43.7%	雨水ポンプ設備等	追加	別紙2			○
			R3			1,160							

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの変更概要 (事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-034	下水道事業	雨水対策施設の改築 (等々カポンプ場)	R1	-	-	0	0.0%	ゲート設備等	追加	別紙3			○
			R3			90							
A07-035	下水道事業	雨水対策施設の改築 (広域ネットワーク)	R1	-	-	340	61.8%	光ファイバーケーブル等	追加	別紙1、2、3、4			○
			R3			550							
A07-036	下水道事業	雨水対策施設の改築 (古市場ポンプ場)	R1	-	-	0	0.0%	スクリーンかす設備等	追加	別紙1			○
			R3			190							
A07-037	下水道事業	川崎駅東口周辺地区等	R1	-	-	103	103.0%	浸水安全度向上のための検討	追加	別紙1	○		
			R3			100							
A07-038	下水道事業	大島ポンプ場(地震対策)	R2	-	-	35	175.0%	汚水ポンプ井等	追加	別紙1	○		
			R3			20							
A07-039	下水道事業	小向ポンプ場(地震対策)	R2	-	-	0	0.0%	汚水ポンプ井	追加	別紙1			○
			R3			10							
A07-040	下水道事業	古市場ポンプ場(地震対策)	R2	-	-	0	0.0%	汚水ポンプ井	追加	別紙1	○		
			R3			10							
A07-041	下水道事業	踊場ポンプ場(地震対策)	R2	-	-	16	160.0%	汚水ポンプ井	追加	別紙4	○		
			R3			10							
A07-042	下水道事業	踊場ポンプ場(地震対策)	R2	-	-	0	0.0%	燃料タンク	追加	別紙4			○
			R3			20							
A07-043	下水道事業	入江崎水処理センター (地震対策)	R2	-	-	258	172.0%	燃料タンク	追加	別紙1			○
			R3			150							

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
A07-044	下水道事業	麻生水処理 センター(地震 対策)	R2	-	-	0	0.0%	燃料タンク	追加	別紙1			○
			R3			60							
A07-045	下水道事業	排水樋管	R1	-	-	401	267.3%	遠隔操作設備等	追加	別紙2、3			○
			R3			150							
A07-046	下水道事業	排水樋管	R1	-	-	239	239.0%	ゲート改良等	追加	別紙2、3			○
			R3			100							
A07-047	下水道事業	下水道施設 の耐水化	R2	-	-	60	120.0%	防水扉整備等	追加	別紙1、2、3、4			○
			R3			50							
A07-048	下水道事業	ポンプ場(地震 対策)	R2	-	-	204	136.0%	耐震診断等	追加	別紙1、2、3、4			○
			R3			150							
事業費 計				10,990		9,168 24,890	36.8%						


B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0 0	-						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画		当初計画からの 変更概要 (事業の削除・ 追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況			
				事業費 (百万円)	事業内容 (延長・面積・箇所数等)	執行額 (百万円) 事業費 (百万円)	進捗率			事業内容 (延長・面積・箇所数等)	完成	完成 見込み	次期計画 へ移行
事業費 計				0		0 0	-						

計画の名称	川崎市公共下水道 社会資本総合整備重点計画 (防災・安全)	交付対象	川崎市
計画の期間	平成30年度 ~ 平成33年度 (4年間)		

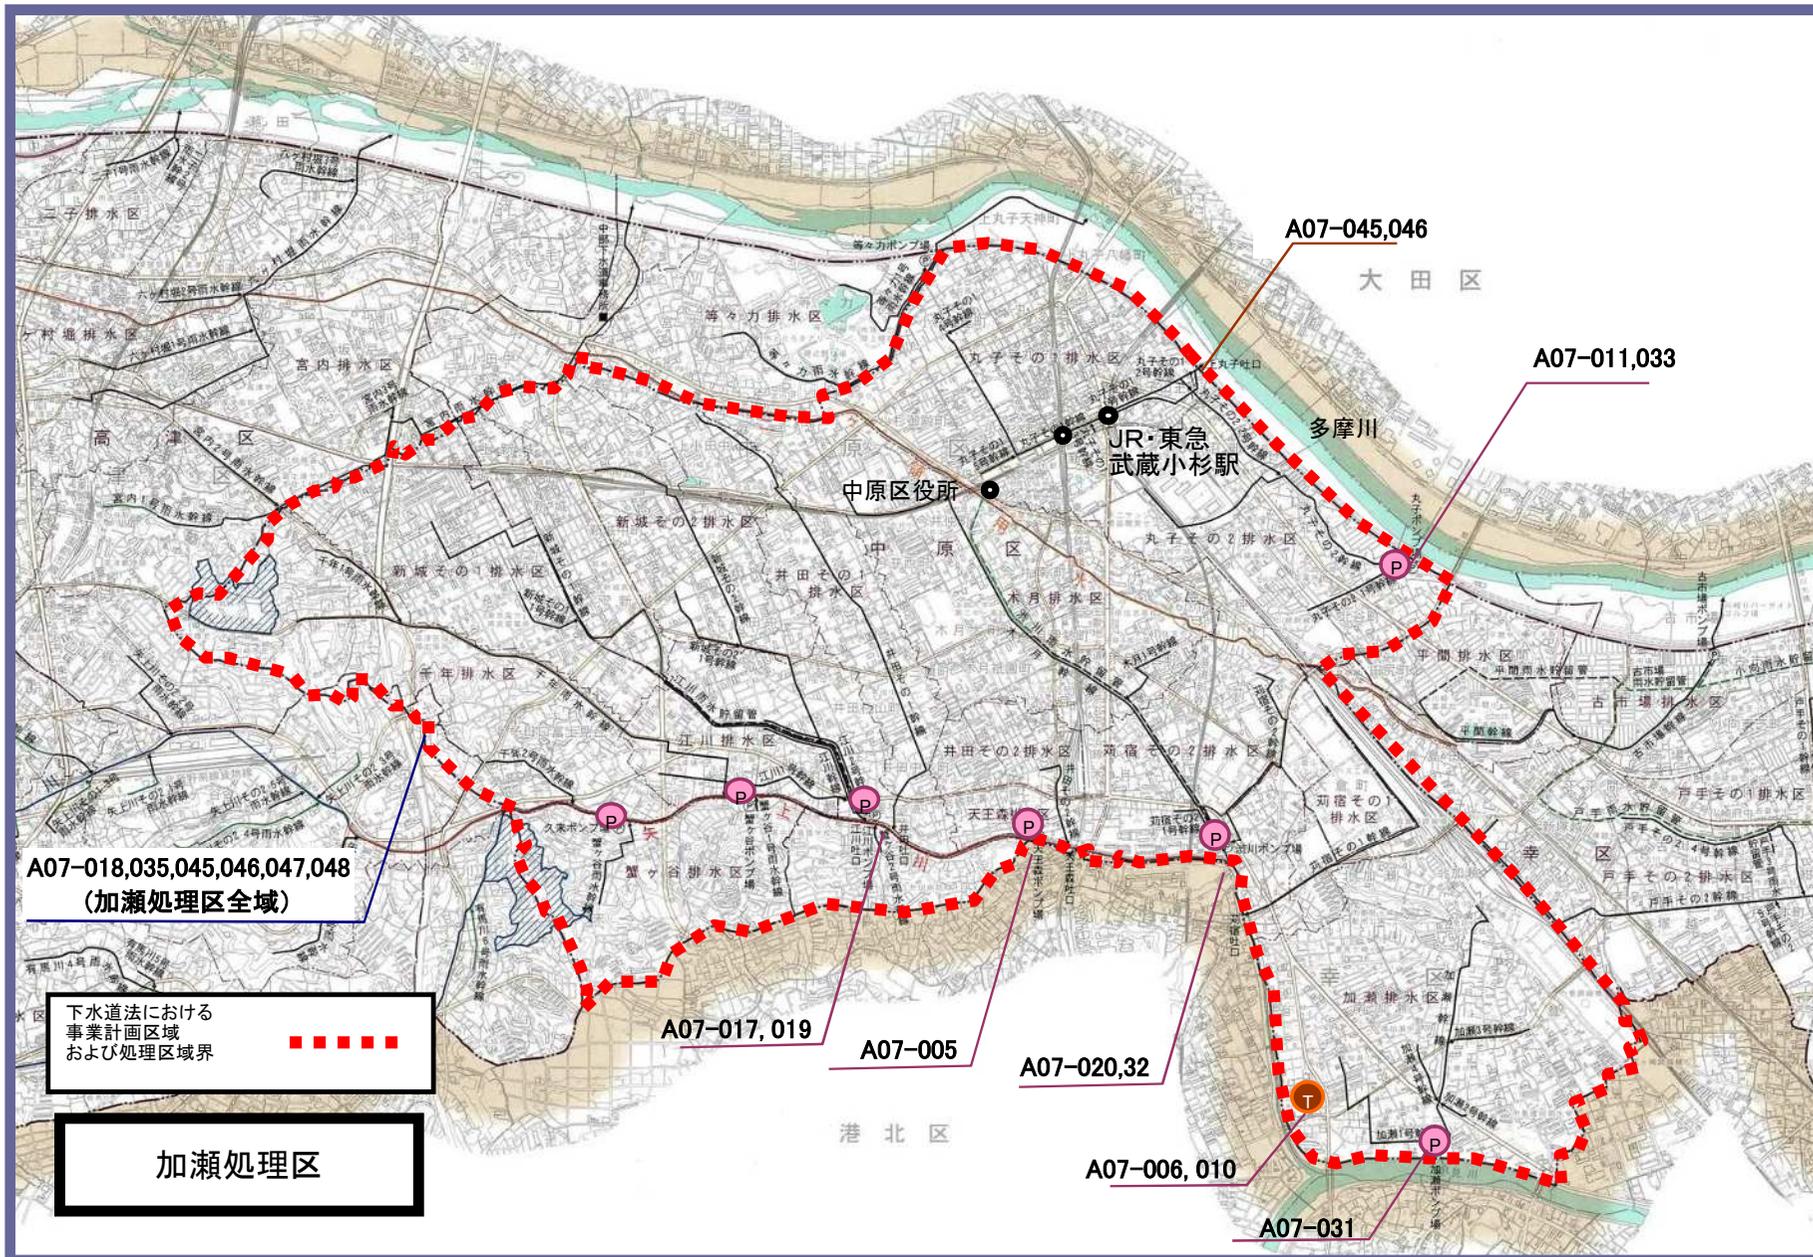

(参考図面)

