

1 事業の概要について

本事業は、特別支援学校の施設の狭あい化の解消や障害に応じた教育環境の確保のため、中央支援学校高等部分教室の体育館棟及び増築校舎棟を増築する計画となっています。

【計画の概要】

所在地	中原区上小田中3丁目10番5号（聾学校敷地内）		
構造・規模	体育館棟 鉄骨造3階建 増築校舎棟 鉄骨造3階建	建築面積	体育館棟 795.55㎡ 増築校舎棟 345.51㎡
事業費	約21億円（※）	延べ面積	体育館棟 1,735.09㎡ 増築校舎棟 921.24㎡
工事内容	体育館棟（特別教室、アリーナ、小体育館ほか）の増築（建替え） 増築校舎棟（通級指導室、特別教室、管理諸室ほか）の増築		

※工事費（建築、電気設備、機械設備、昇降機設備の各工事）と工事監理費の合計

2 完成時期について

令和8年4月からの供用開始に向けて、令和6・7年度工事の進捗を進めていましたが、令和6年6月の入札が不調となったことにより供用開始が遅れることとなりました。

建替えのために体育館は既に解体を終えており、体育館・特別教室等の整備の遅れにより良好な教育環境が確保できない状況が続くなどの学校運営への影響を踏まえ、早期に整備する必要があることから、令和6～8年度工事として再発注の進捗を急ぎ、令和8年9月末の工事完成に向けて調整を進めています。

【工事工程の概要】

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
当初工程	契約	増築工事	供用	既存改修工事
現在見込		契約	増築工事	供用
				既存改修工事（※）

※スケジュールについては今後調整

当初計画から半年程度の遅れ

3 事業費の増額について

入札不調による事業の開始時期の遅れにより、建築コストの高騰等の影響を受けたことから、事業費全体で約7億円の増額（約2.1億円→約2.8億円）となる見込みです。

【増額の主な項目】		増額計
建築コストの高騰	資材コストや労務費の上昇に伴う増額	約7億円

<参考>


案内図



配置図

聾学校敷地内

【別途工事】普通教室は既存校舎内に整備予定

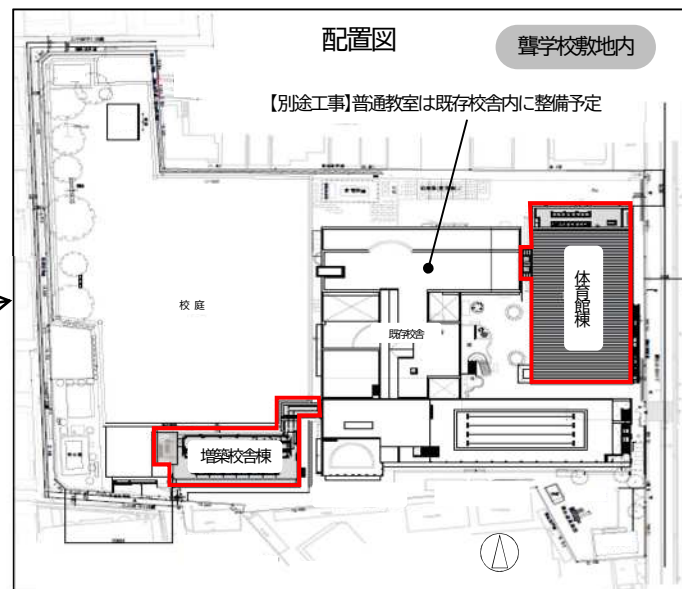

4 補正予算等について

令和6年第3回市議会定例会に令和6年度当初予算の一部減額補正及び債務負担行為変更の議案を提出する予定です。

【補正予算の概要】

		令和6年度	令和7年度	令和8年度
予算	当初工程	1年目工事予算	2年目工事予算	
	現在見込	一部減額補正※	2年目工事予算	3年目工事予算

※債務負担行為の設定期間を令和6・7年度の2か年から令和6～8年度の3か年に変更

5 今後のスケジュールについて

体育館・特別教室等を早期に整備するため、令和6年度中の契約締結に向けた進捗を進め、令和7年第1回市議会定例会に工事の契約議案を提出する予定です。

【令和6年度の建築工事の契約に係る主な予定】

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
契約手続	入札	仮契約		教育委員会（定例会） （提出予定議案の報告）	市議会定例会 （契約議案提出）	契約締結
