

令和元年11月1日

まちづくり委員会資料

等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について

建設緑政局

等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について

1 整備の目的

等々力硬式野球場は、高校野球や社会人野球の大会開催が可能な硬式野球場として、競技や観戦が円滑かつ安全に行えるよう、施設の機能向上、競技者や大会関係者等の諸室の整備、防球対策を進め、また施設の多目的利用、集約化などを図るとともに、防災備蓄倉庫の整備など災害時の活動拠点としての機能導入を行います。



2 整備の概要

フィールド 人工芝及びアンツーカ舗装、センター122m、両翼100m、面積13,445.10㎡
構造・規模 鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上3階建て
収容人員数 内野約5,300席 外野約4,000席 計約9,300席
建物機能 観覧場、防災備蓄倉庫、いこいの家、事務所
電気設備 LED ナイター照明、フルカラーLED スコアボード、サブスコアボード、太陽光発電設備
昇降機設備 内野1台、外野1台、計2台
整備する諸室等
選手ロッカー室、シャワー室、選手用トイレ男子女子、ダッグアウト、屋内練習場、屋内ブルペン、記録放送室、本部室、審判員室、報道関係室、医務室、審判員控室、カメラマン席、キーパー室、会議室、事務室、男子女子トイレ、多目的トイレ、器具庫、作業員室、非常用自家発電気室
災害時の防災機能
フィールド：消防機関の活動拠点、屋内ブルペン：救援物資等の市集積場所

3 工事の概要

(1) 概要 工事名：等々力硬式野球場改築工事（建築工事）

工期：平成28年6月21日～令和2年12月15日

工事場所：川崎市中原区等々力1番

請負者：鹿島・石井・松浦共同企業体

契約金額：7,649,346,080円

その他附帯工事契約金額：1,203,860,880円（電気設備、機械設備工事）

総工事契約金額：8,853,206,960円

(2) 工事の進捗状況


平成28年の工事着手後、廃棄物混じり土の処分、地盤の軟弱部分における強化改良、杭支持層の変更など、追加対策が必要となり、平成29年度に予算の補正及び変更契約を行い、平成30年度末までに追加対策を実施しました。



《今後の工事予定》

内野側
地上躯体工事、外装工事、内装工事、観客席工事

外野側
地上躯体工事、擁壁躯体工事、外装工事、内装工事、芝生席盛土

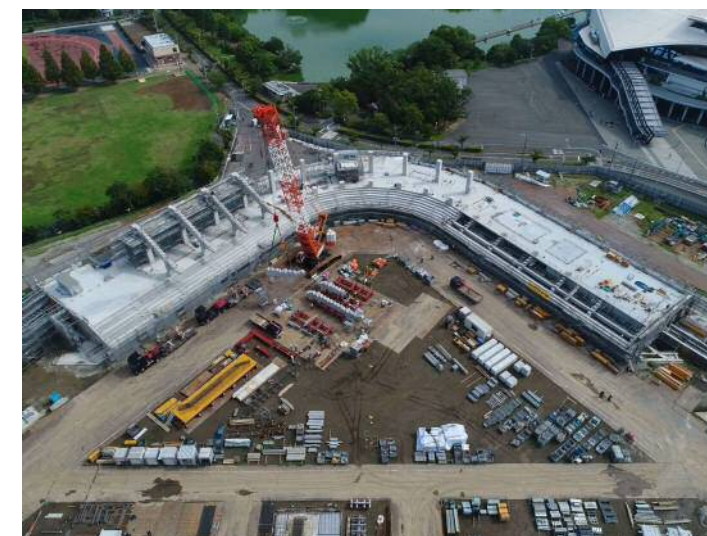

現在、1階躯体が概ね完了し、上層スタンドを構築する柱や梁の施工を行っています。柱や梁に引き続いて、床板の設置を行い、躯体工事を進めます。

進捗状況写真

令和元年8月末時点

等々力硬式野球場の整備進捗と供用開始について

4 野球場の供用開始予定について

(1) 施設管理開始：令和2年（2020年）9月上旬

供用開始：令和2年（2020年）10月上旬

※詳細な施設管理及び供用開始日については引き続き調整します。

(2) 野球場施設の管理について

等々力緑地では、民間活用を踏まえた、さらなる魅力向上に向け、一体的な運営・維持管理手法等の検討を進めていますが、民間活力導入による事業実施までの間、令和2年10月上旬の供用開始に向けて、野球場施設の管理を令和2年9月上旬から業務委託により行う予定です。

(3) 使用料について

改築整備により新たな諸室等が整備されることなどから、今後、想定される維持管理費を基に原価計算を行い、旧等々力球場や他都市の同様の球場使用料も参考に、新たな野球場の使用料について検討します。

5 今後のスケジュール

項目	令和元年度						令和2年度						
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
改築工事	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 本体工事 </div>												
	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 外構工事 </div>												
管理	所管事務報告	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 管理内容の検討 </div>						<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 業務委託発注・契約手続き </div>					
		<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 10%; margin: 5px;"> 管理開始 </div>											
使用料	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 使用料の検討 </div>						<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%; margin: 5px;"> 周知期間 </div>						
	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block; width: 10%; margin: 5px;"> 供用開始 </div>												



民間活力の導入
