

環境委員会資料

2 所管事務の調査（報告）

（2）令和元年度東日本台風（台風19号）の対応状況について

資料 令和元年度東日本台風（台風19号）の対応状況について

港 湾 局

（令和2年8月27日）

令和元年度東日本台風（台風19号）の対応状況について

1 川崎港における気象・海象状況

最大瞬間風速 南風 5.8 m/sec（令和元年10月12日 21時10分）

最高潮位 KP+2.46 m（令和元年10月12日 17時20分）

最大潮位偏差 1.20 m（令和元年10月12日 22時30分）

※KP：川崎港工事基準面

2 主な被災施設と対応状況

主な被災施設	対応状況
① 浮島2期廃棄物処分場	<p>国の災害査定を受け、補助金を活用した災害復旧事業に認定。現在、2か年の債務負担工事として、復旧工事を施工中。</p> <p>工事費：437,800,000円 受注者：東洋建設 株式会社 工期：令和2年4月20日～令和3年8月31日</p>
② 川崎港コンテナターミナル	<p>国の災害査定を受け、国直轄の災害復旧事業に認定。現在、国土交通省が復旧工事を施工中。</p> <p>工事費：230,120,000円 受注者：東洋建設 株式会社 工期：令和2年5月18日～令和3年2月26日</p>
③ 東扇島西公園	<p>令和元年11月1日に公園の部分開放。被災した各施設の復旧工事を施工中。</p> <p>工事費：12,881,000円 受注者：株式会社 幸栄工業 工期：令和2年5月26日～令和2年9月18日</p>
④ 浮島町護岸 (市道浮島2号線脇)	<p>4月に復旧工事が入札不調。大型土嚢による仮復旧工事完了。本復旧に向けて手続中。</p>

令和元年度東日本台風(台風19号)における主な被災施設の位置図

③東扇島西公園
 ・令和2年5月契約、9月完了予定





④浮島町護岸 (市道浮島2号線脇)
 ・令和2年8月応急復旧




①浮島2期廃棄物処分場
 ・令和2年4月契約、令和3年8月完了予定



②川崎港コンテナターミナル
 ・令和2年5月契約、令和3年2月完了予定

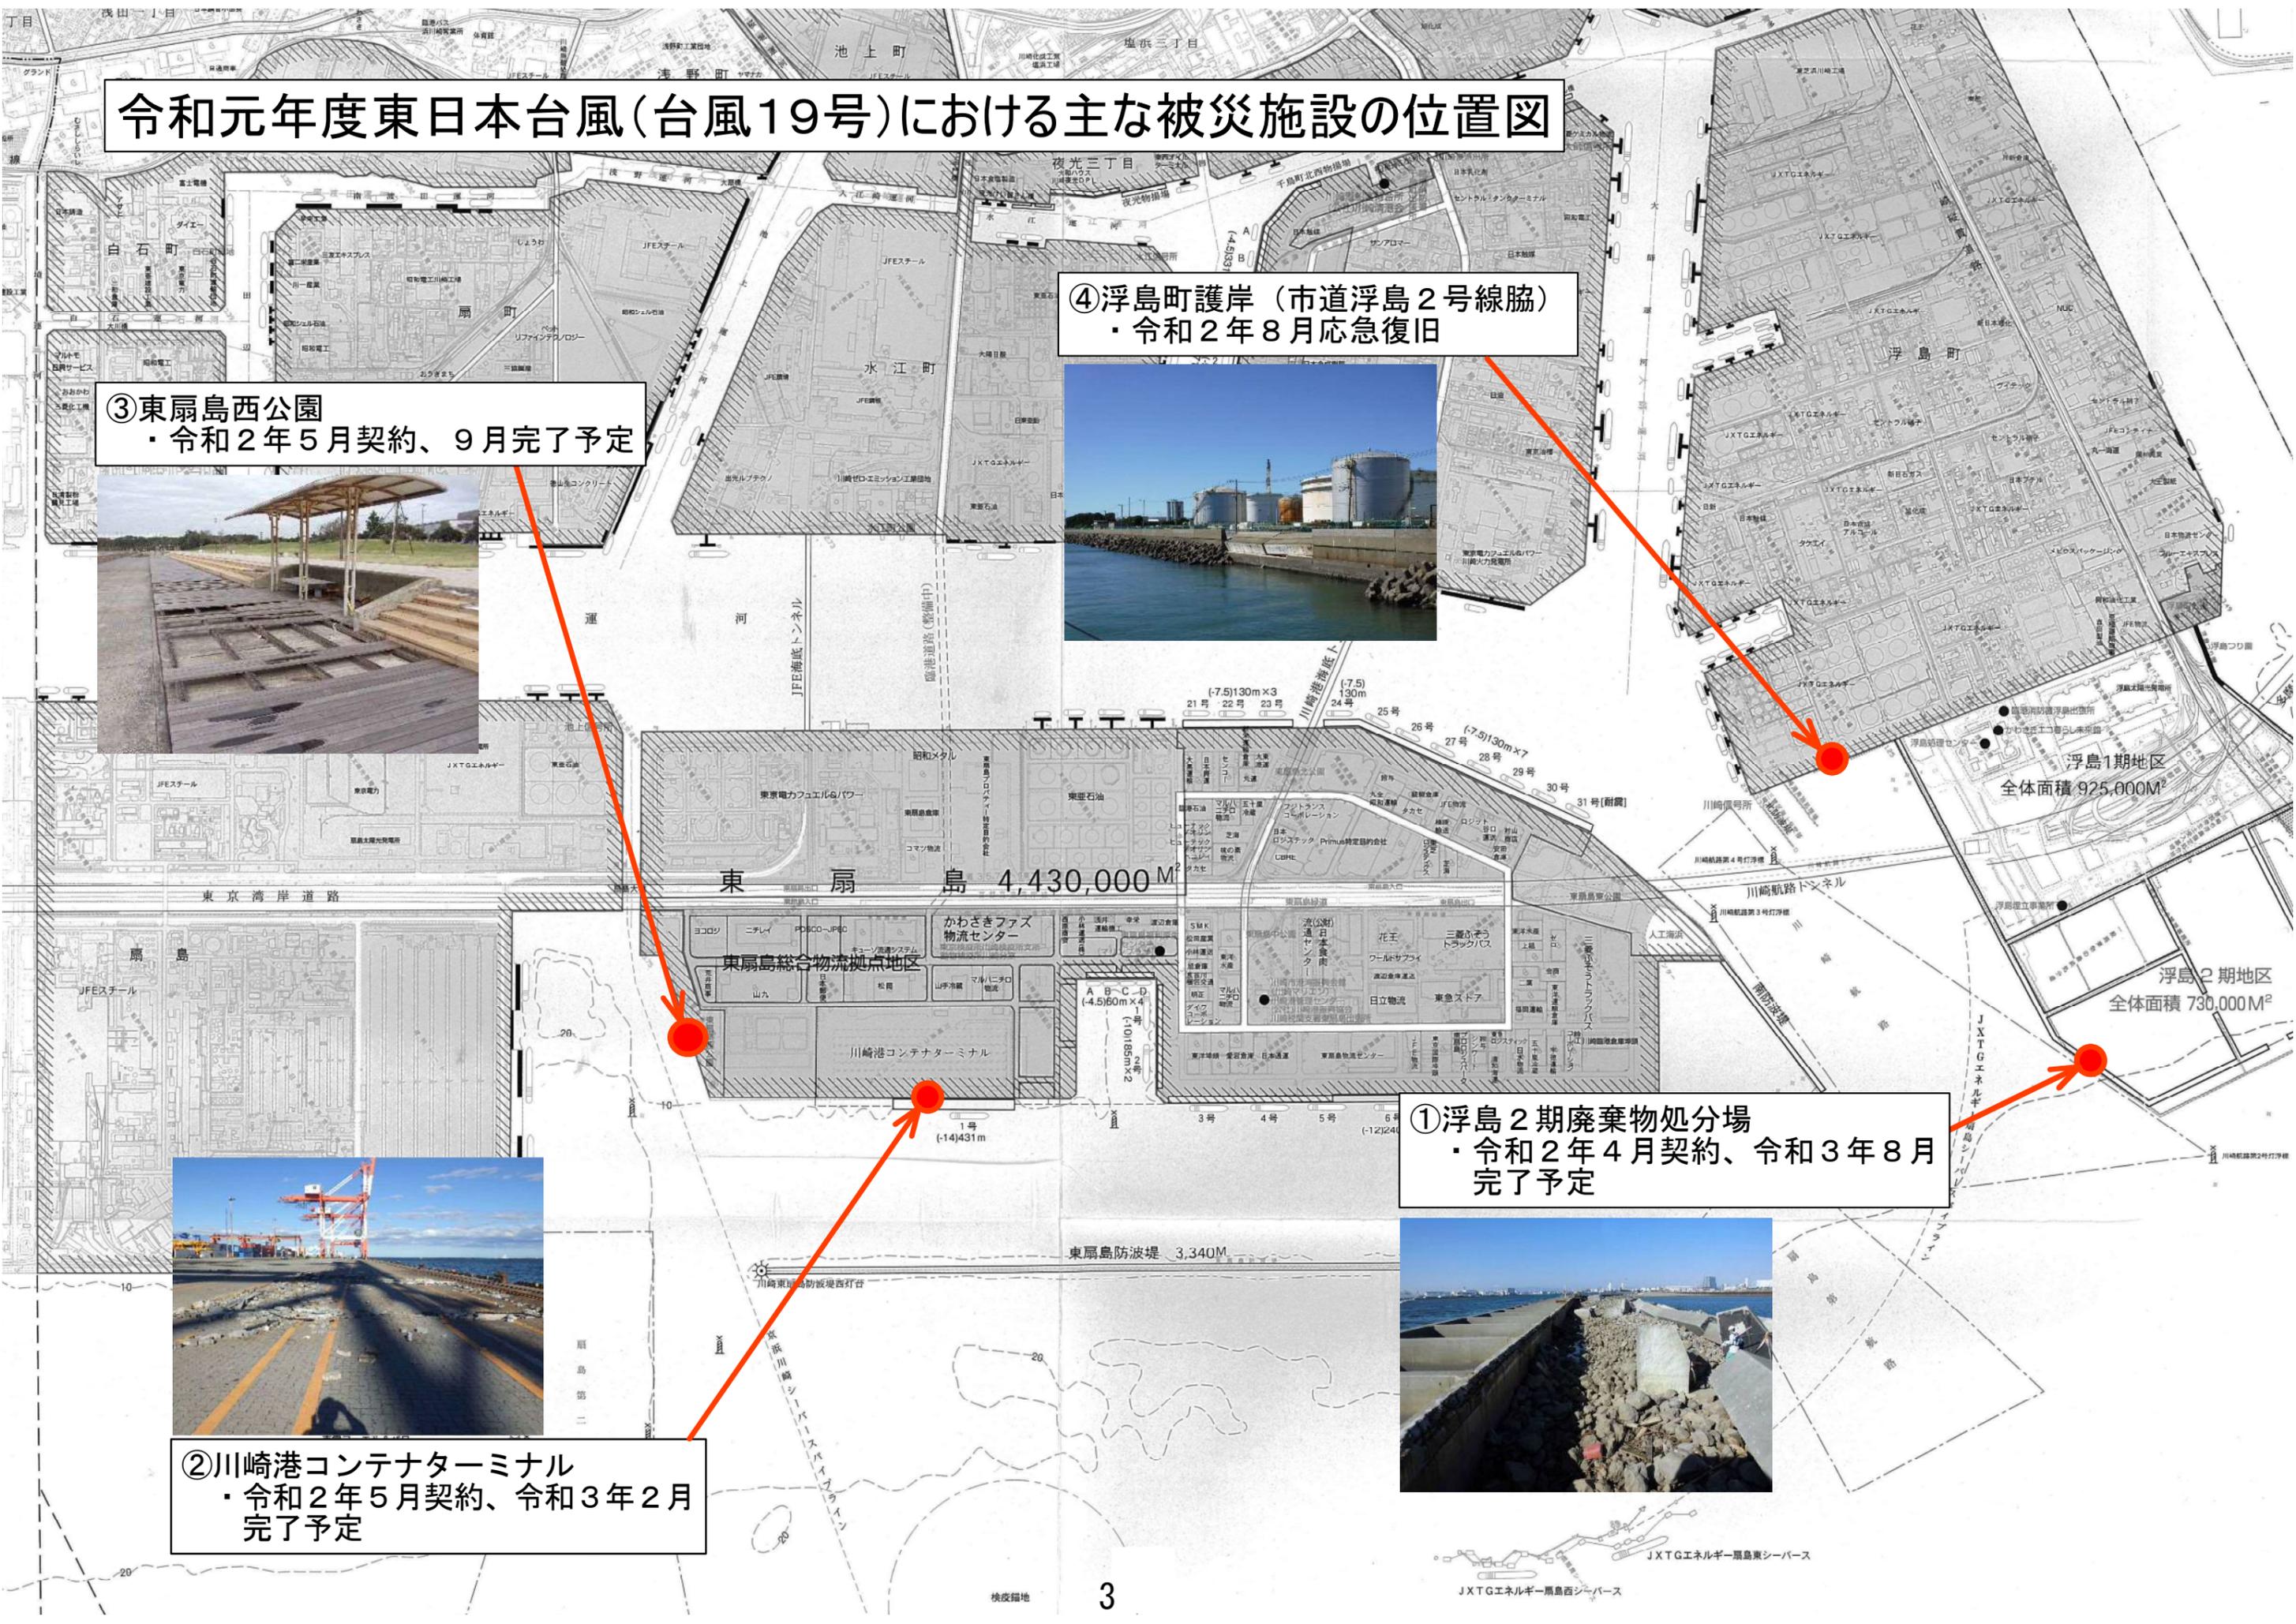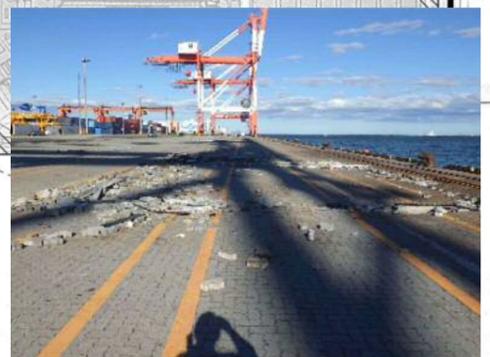

① 浮島 2 期廃棄物処分場 被災状況と施工状況

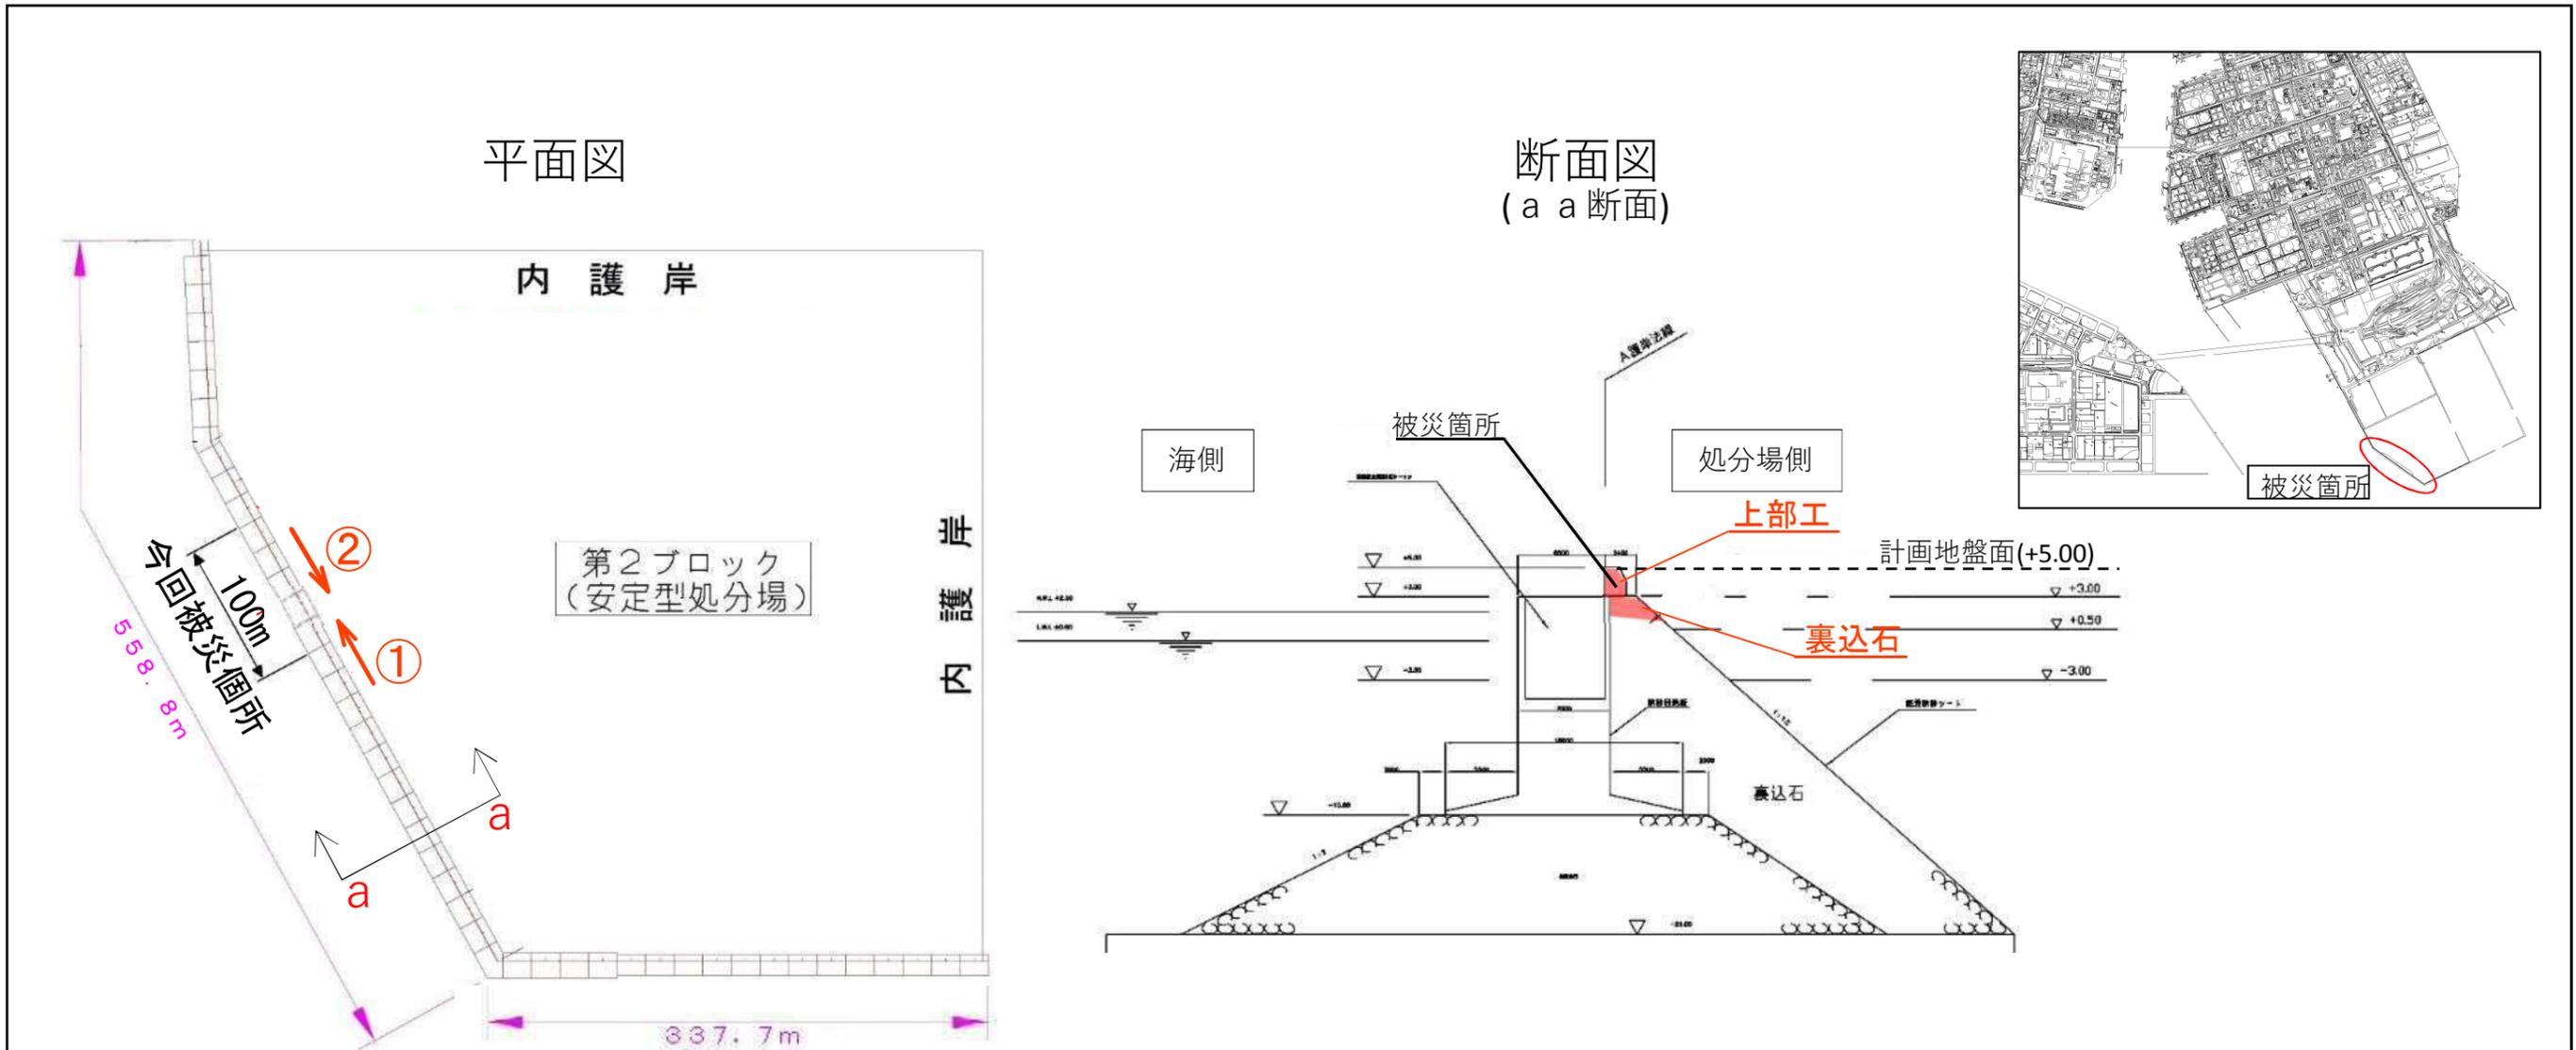

被害状況 ①



被害状況 ②



施工状況


② 川崎港コンテナターミナル 被災状況と施工状況




③ 東扇島西公園 被災状況と施工状況

- ・特に被害が大きい南側を除き、仮復旧及び安全対策を実施、令和元年11月1日より部分開放。
- ・令和2年4月1日には、工事箇所を除き、釣り施設等を全面開放。現在、フェンス等の復旧工事を実施中。
- ・令和2年9月中旬完成予定。


被害状況

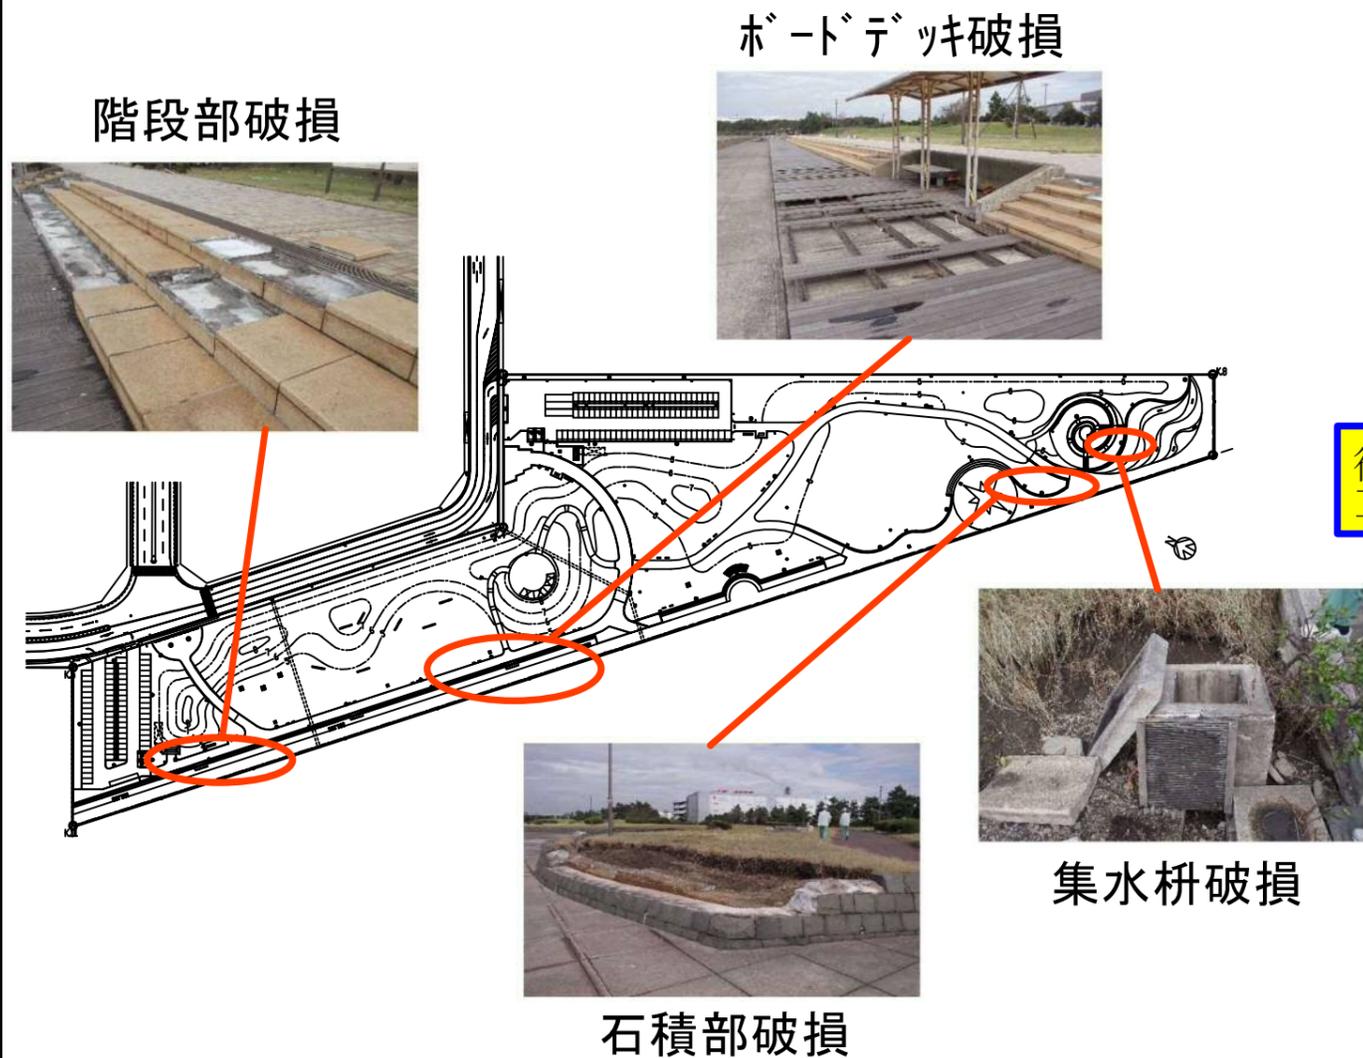

復旧状況

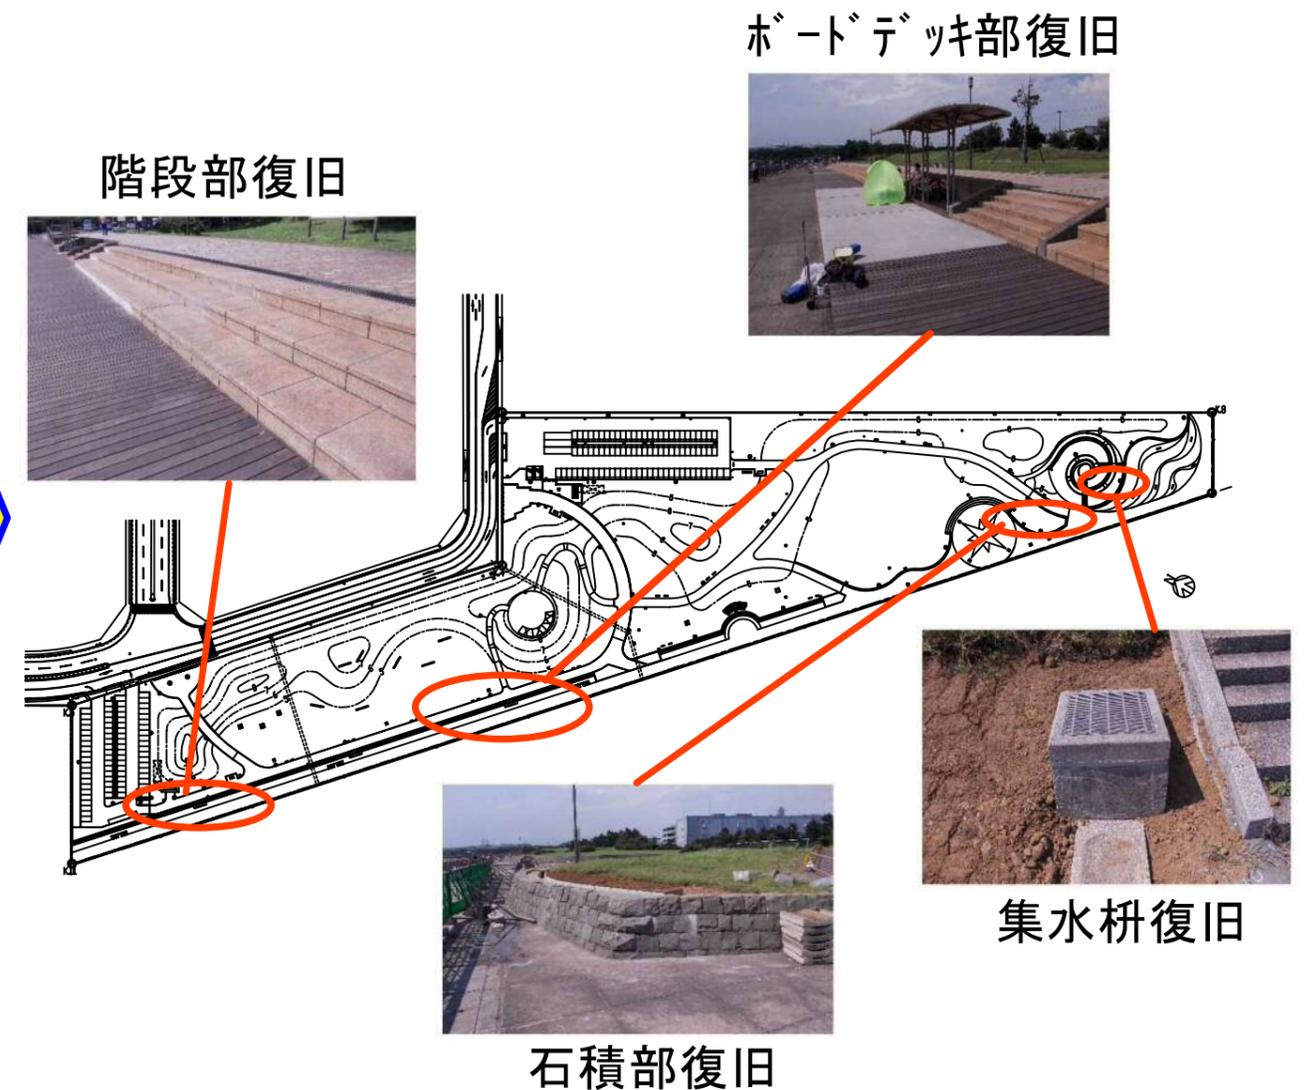


④ 浮島防波護岸 被災状況と施工状況

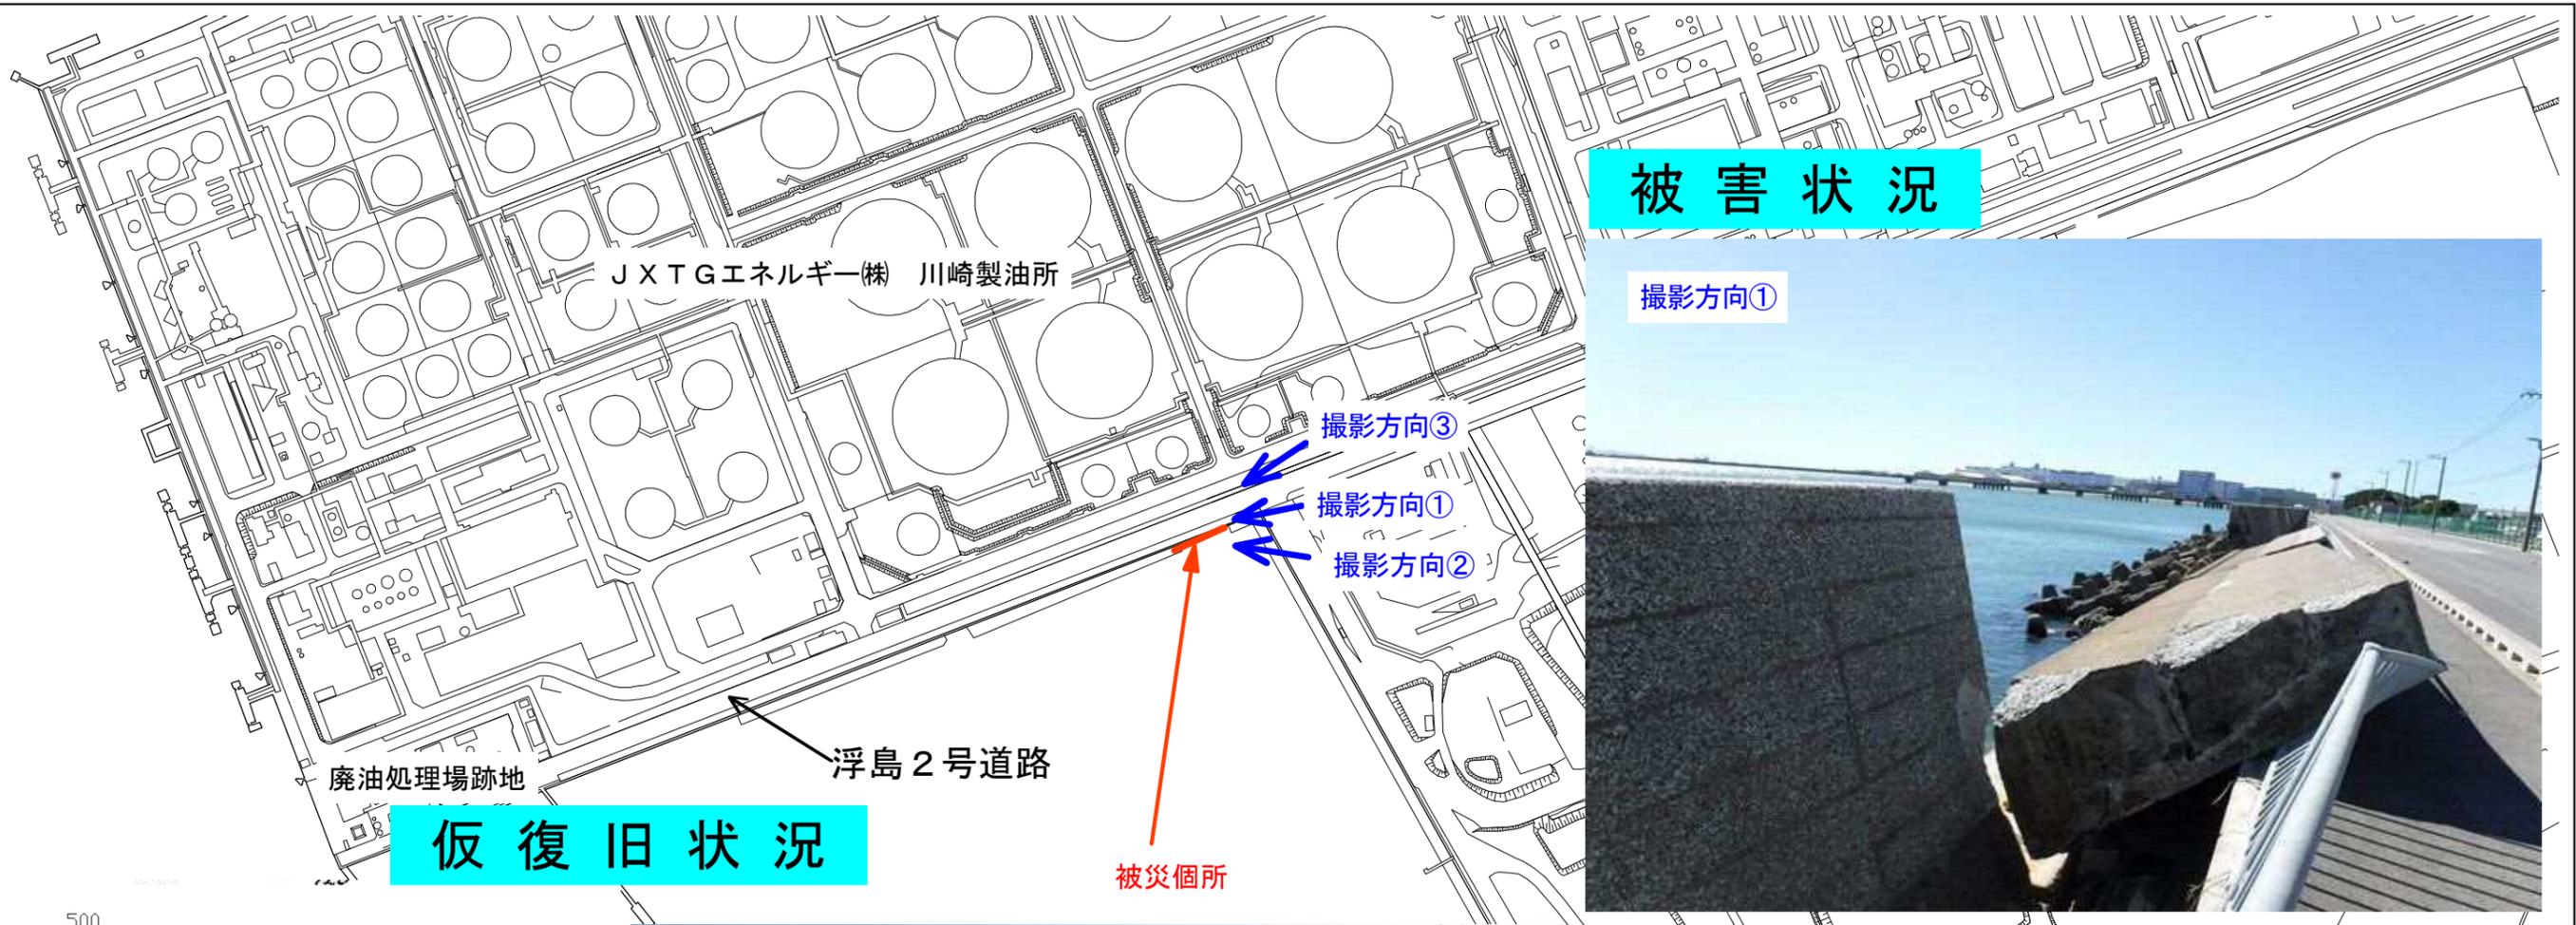

被害状況



仮復旧状況

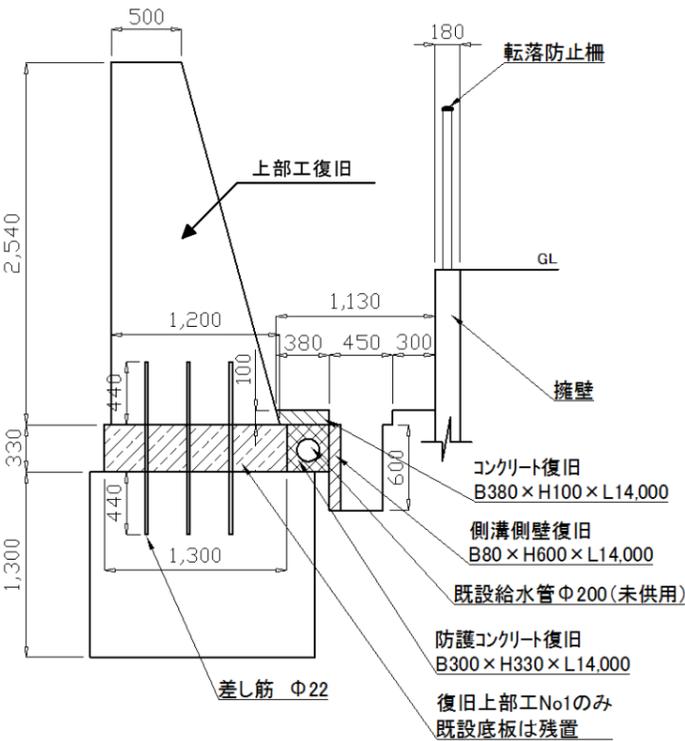

断面図 (本格復旧)
