

健康福祉委員会資料

(病院局関係)

1 所管事務の調査（報告）

(4) 川崎病院医療機能再編整備事業の進捗等について

資料1 川崎病院医療機能再編整備事業の進捗等について

病院局


令和7年8月21日

川崎病院医療機能再編整備事業の進捗等について

川崎病院医療機能再編整備事業は、平成 30 年 3 月に策定した基本計画に基づき、救急医療の需要増加等への対応のための「救命救急センター棟」の新築、医療機能の向上を目指して実施する「既存棟」の改修工事を順次実施するものです。

この事業の取組のうち、水害対策や省エネルギー化等のためにエネルギー関連設備を集約した「エネルギー棟」と「給水ポンプ棟」の整備は、令和 5 年 8 月から運用を開始しています。また、既存棟の 1 階中央待合ホール上部の「特定天井」の改修工事は令和 6 年 7 月に完了しています。

＜川崎病院の配置図＞

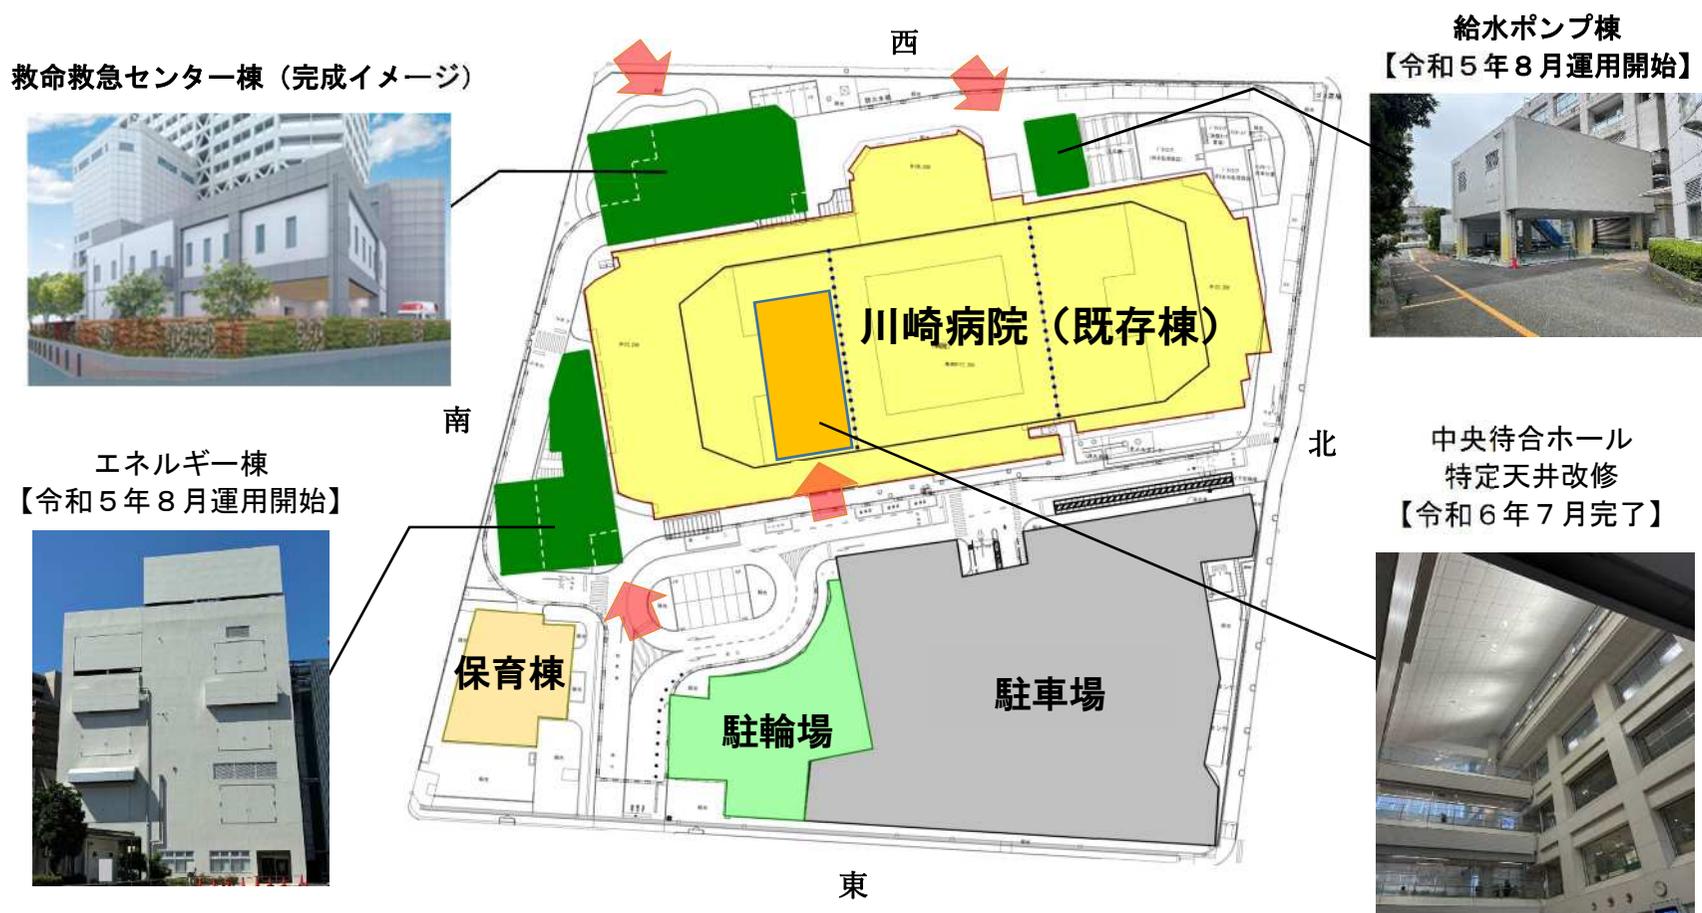

1 救命救急センター棟新築工事について

高齢化の進展に伴い、今後も増加すると見込まれている、地域の救急医療需要に対応するためには、現在の既存棟内に設置されている救命救急センターは狭隘であること等から、現在、救命救急センター棟の新築を進めています。

【建物概要】

建築面積	810.16 m ²
延べ床面積	1,605.36 m ²
階数	地上3階
高さ	13.6m
構造	鉄筋コンクリート造
入院病床数	20床



工事現場の状況 (8月5日時点)

【工期について】 ※令和7年5月30日情報提供

地中に埋設されていた地下ピットの空洞対応、山留工事に支障となる地中障害物撤去作業等
=10か月程度の延長見込み なお、工事はその後、順調に進捗

年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
救命救急センター棟 新築工事	中期経営計画策定時		R5.11.27 - R7.9.30			
	現状			R5.11.27 - R8.8.10	準備	R8.8.10完成予定 R8.11月中旬頃運営開始

令和8年8月10日 救命救急センター棟完成
 令和8年8月11日から 医療器械の設置等、運営開始に向けた準備
 令和8年11月中旬頃 運営開始

【工事費の見込額】

現計予算 約28億5千万円 (当初予算 約22億1千万円)
 → 山留工事中の地中障害物撤去等による増額を含めた概算 (見込) 約29億8千万円
 ※ 不足額については令和8年度予算に所要額を計上予定

2 既存棟改修工事について

市の基幹病院として、今後、増加が見込まれる医療需要を見据えながら的確に対応できるように、内視鏡センターや周産期部門等の既存棟の改修を順次行います。

【改修概要】※令和7年1月31日健康福祉委員会報告


	整備箇所	主な整備の概要	工事实施時期	
1	外来部門（1階）	・感染診察室の整備（3室）等	1期	R8.1-R9.4
2	外来部門（2・3階）	・診察室の増設（各階2室増設）	3期	R10.12-R12.3
3	薬剤部門（2階）	・無菌調製室等の改修、倉庫の拡張	1期	R8.1-R9.4
4	検査部門（2階）	・採血室の拡張	3期	R10.12-R12.3
5	内視鏡センター（3階）	・内視鏡ブースの増設（3→5室）等	1期	R8.1-R9.4
6	外来治療センター（3階）	・治療スペースの拡張等	3期	R10.12-R12.3
7	臨床工学部門（6・7階）	・MEセンターの拡張、保管庫の整備		
8	小児病棟（8階）	・小児救急への対応等、需要に見合った病棟再配置	2期	R9.5-R10.11
9	周産期部門（8階）	・立会い分娩のため分娩室等を改修		
10	精神科病棟（9階）	・保護室の増設（4→6室）等	3期	R10.12-R12.3
11	病棟部門（10～14階）	・リハビリ室、カンファレンス室の整備		
12	地下1階	・ロッカー室等を整備	2期	R9.5-R10.11

【工事発注等の状況】

令和6年6月14日	既存棟改修工事の入札不調（入札参加申込みなし）
令和6年6月から	再発注に向けた検討実施（業者ヒアリング、アンケート等）
令和6年10月	工期を3期に分割、業種（建築、電気、機械）ごとに発注する方針策定
令和7年7月2日	1期工事入札公告（令和8年1月末工事着手、令和9年4月末完成予定）

【今後の予定】

令和7年9月上旬 1期工事契約
 令和8年1月末 1期工事着手
 令和9年度以降 2期以降の工事の着手
 令和12年3月末 全工程完了

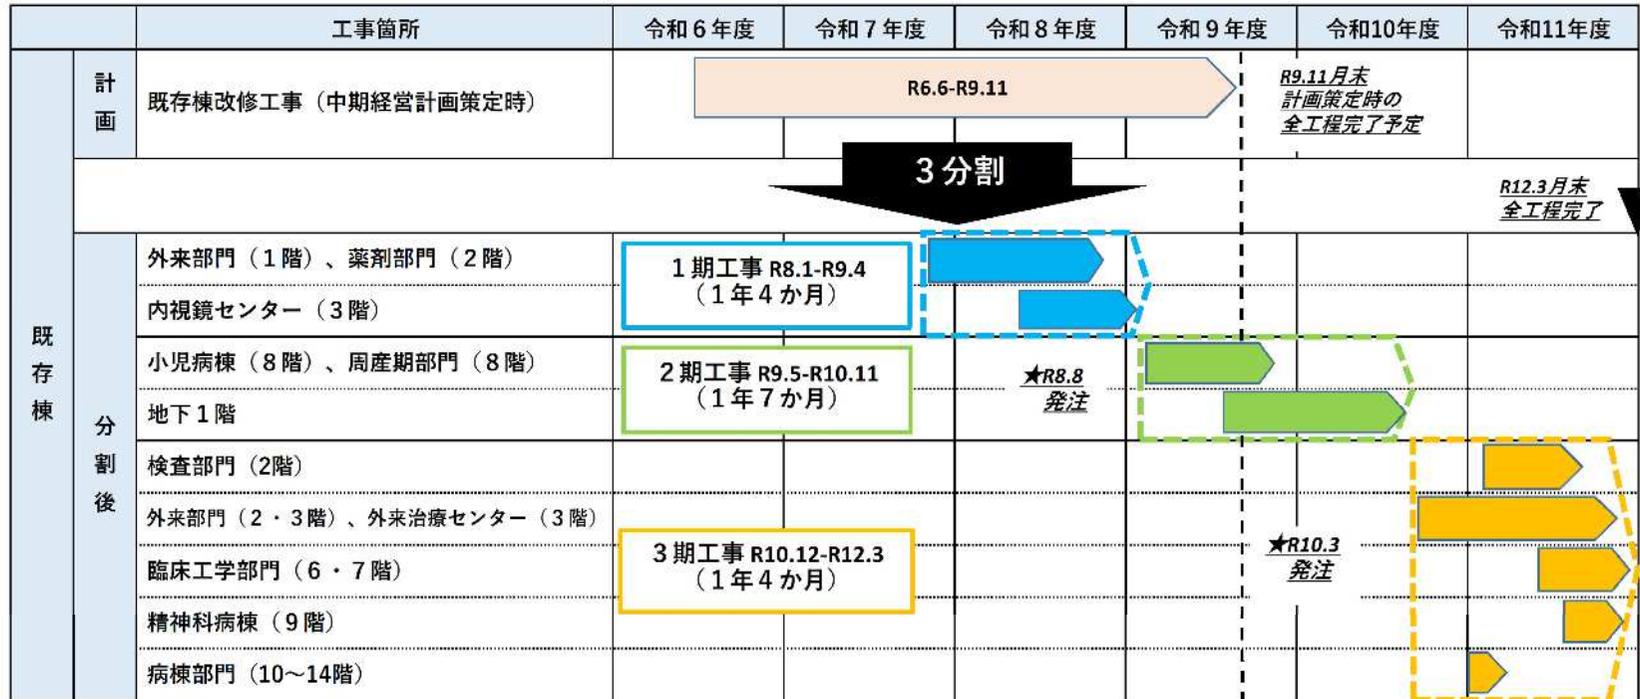


【工事費の見込額】

中期経営計画策定時（見込） 約25億2千万円 → 工期の3分割による概算（見込） 約34億7千万円

※1期工事の契約状況を踏まえ、2期以降の工事費は、令和8年度以降の予算に所要額を計上予定

1階

整備前

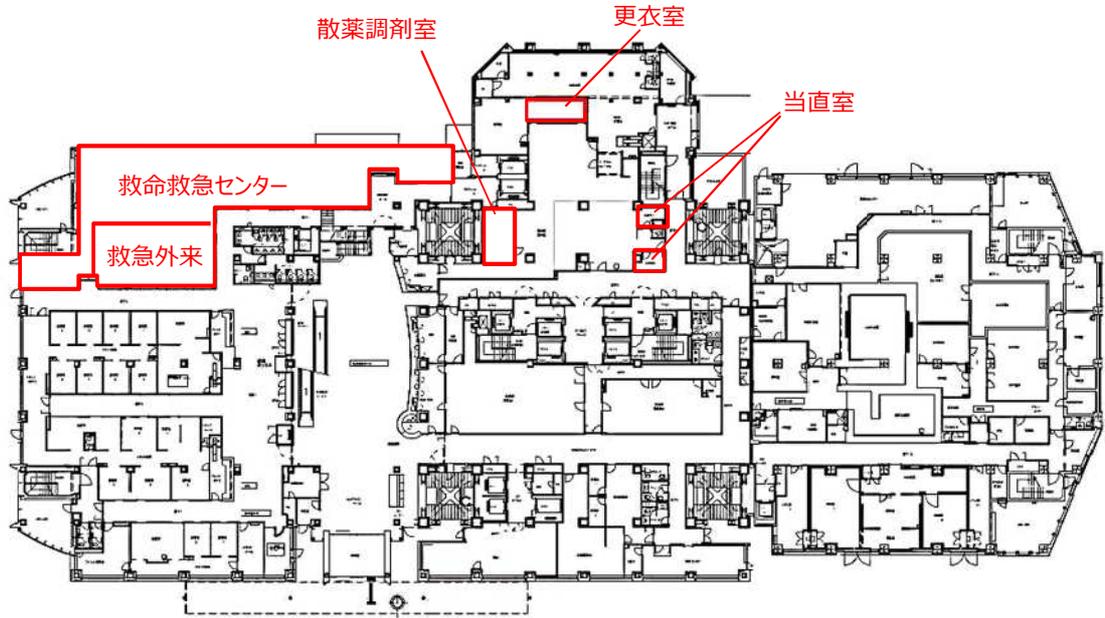


整備後

■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

救急外来等の改修

・ストレッチャーまち、動線、感染診察室等


・散薬調剤室を（右に）移動し、
中央エレベーターまでの通路を設置

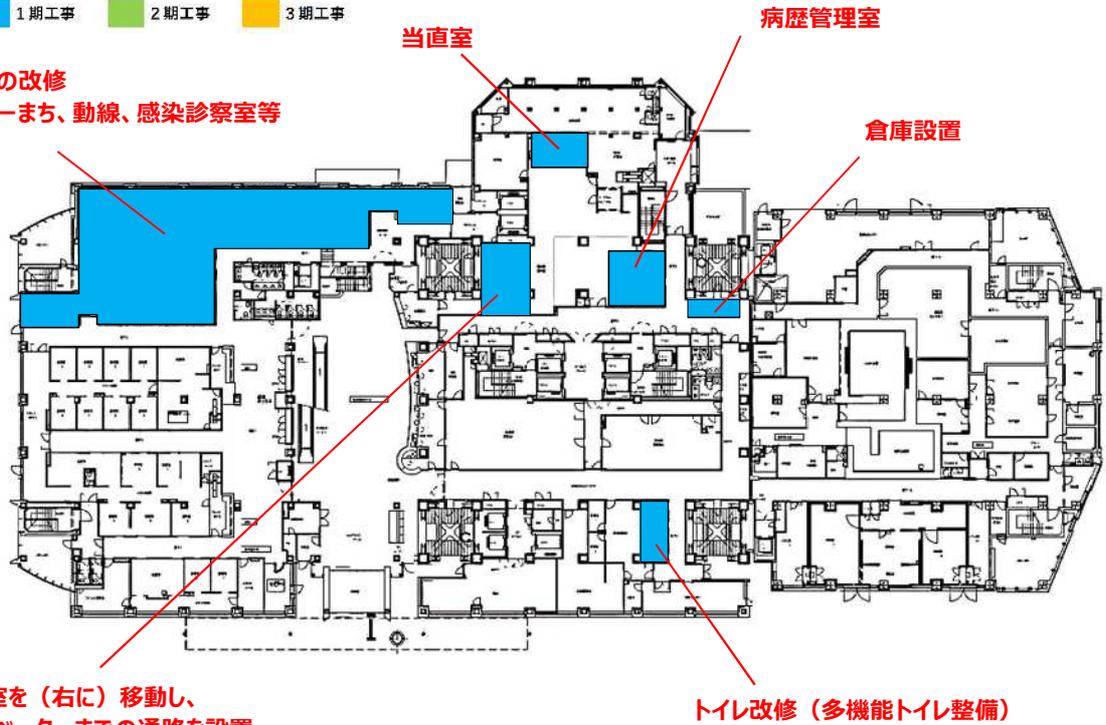

※改修工事を伴う箇所について記載


2階

整備前

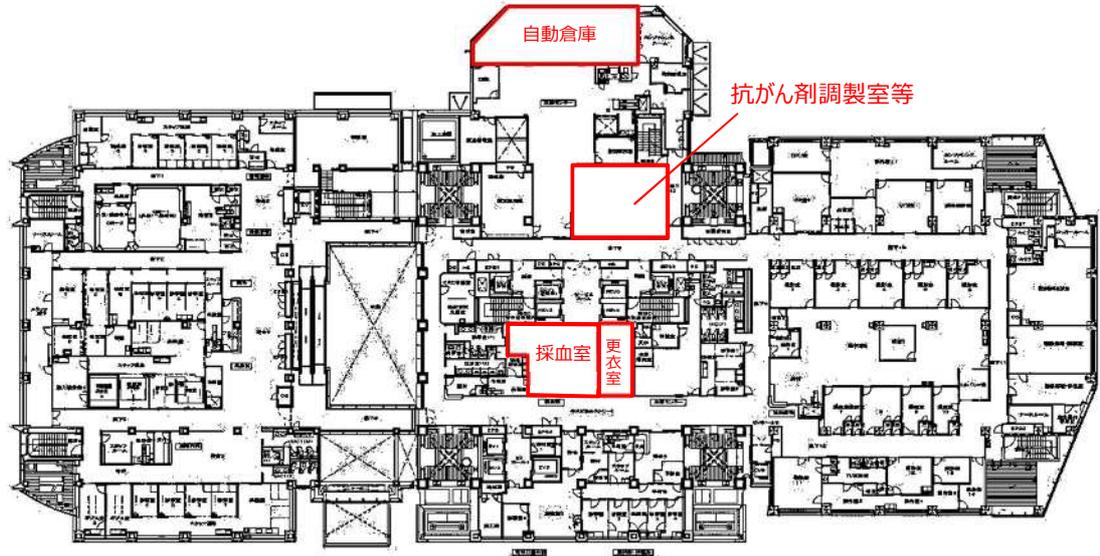

整備後


■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

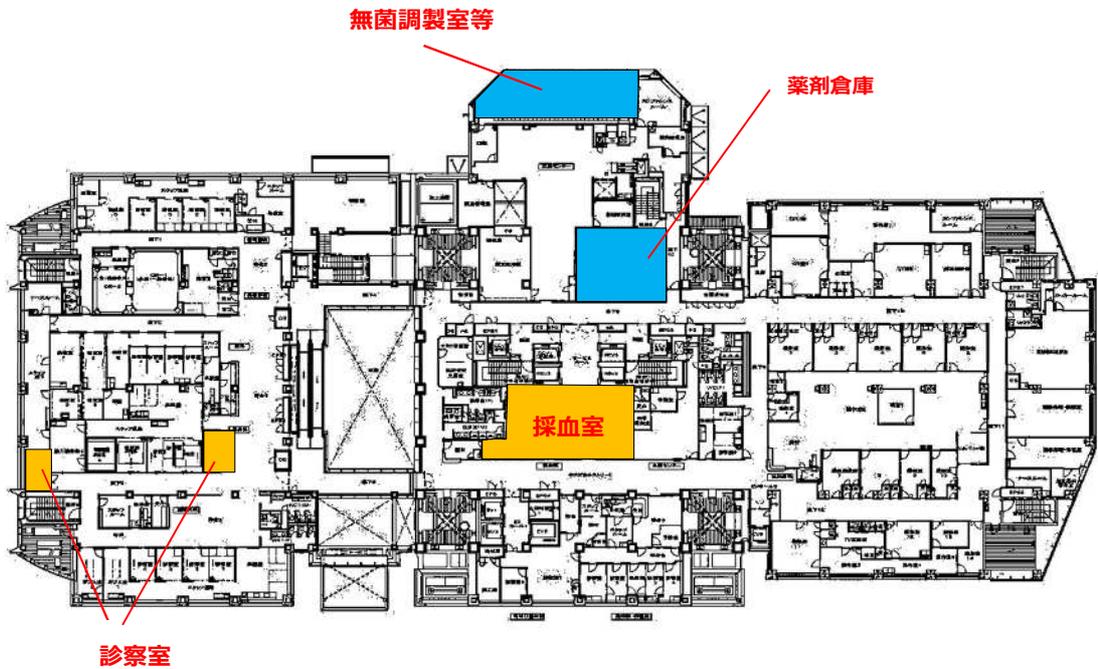

※改修工事を伴う箇所について記載


3階

整備前

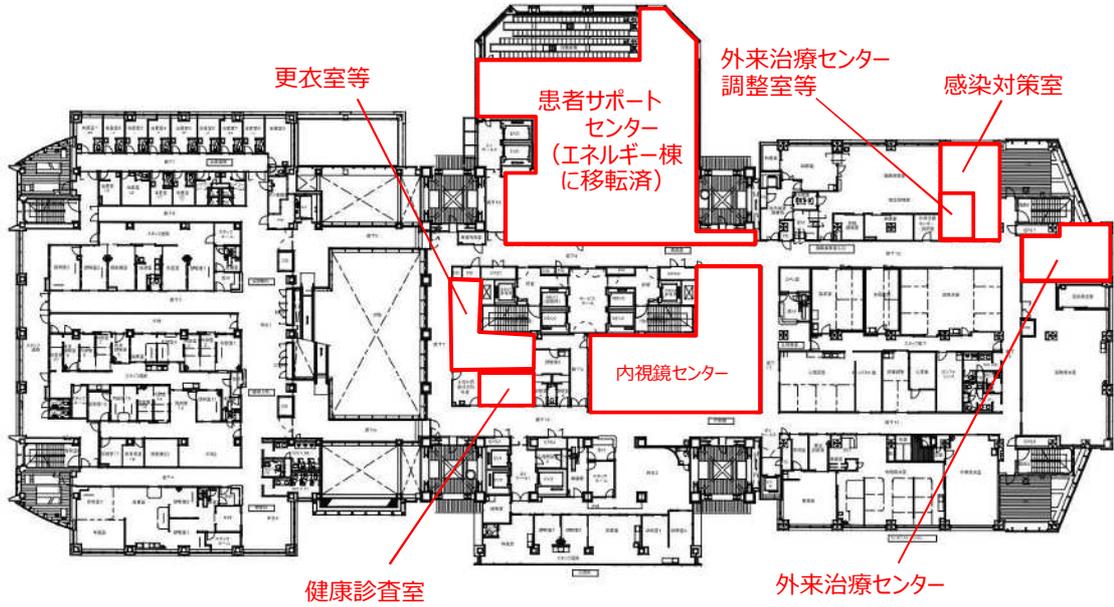

整備後


1期工事 2期工事 3期工事

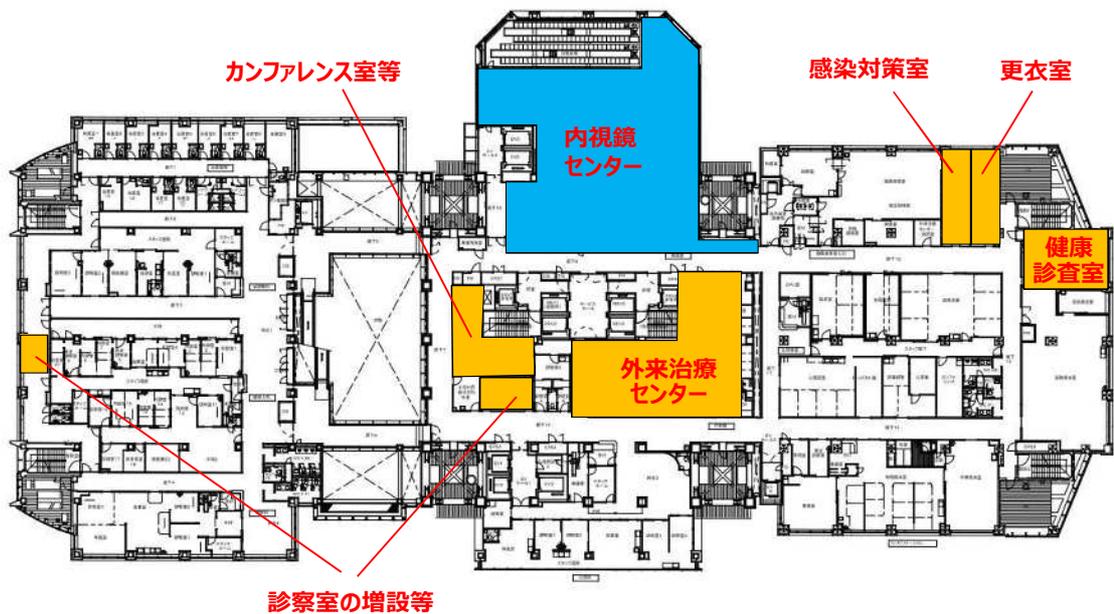

※改修工事を伴う箇所について記載


6階

整備前

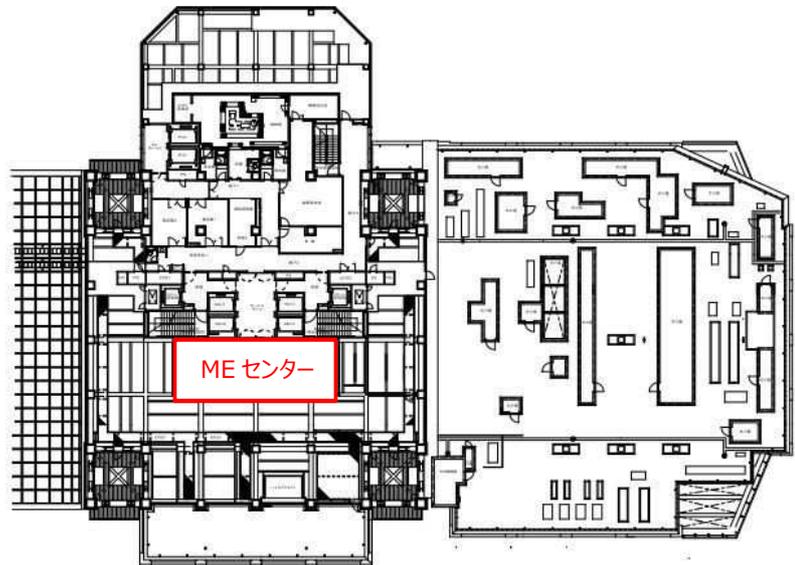

整備後


■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

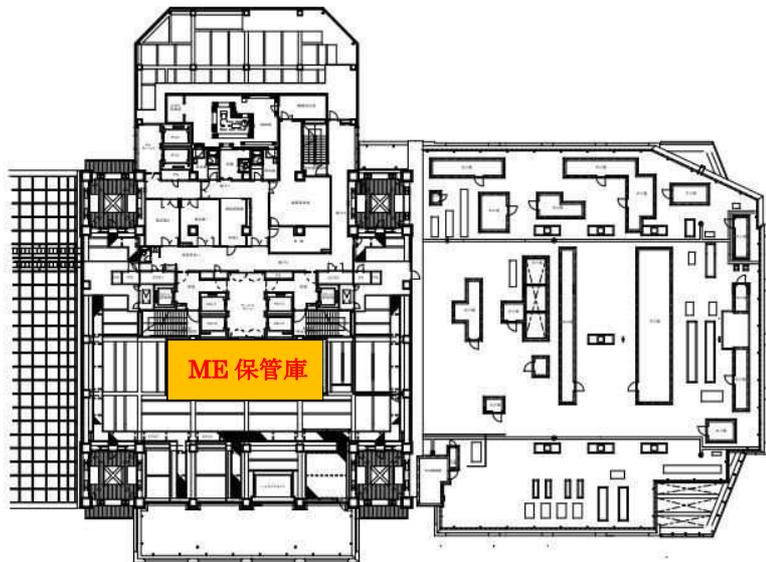

※改修工事を伴う箇所について記載


7階

整備前

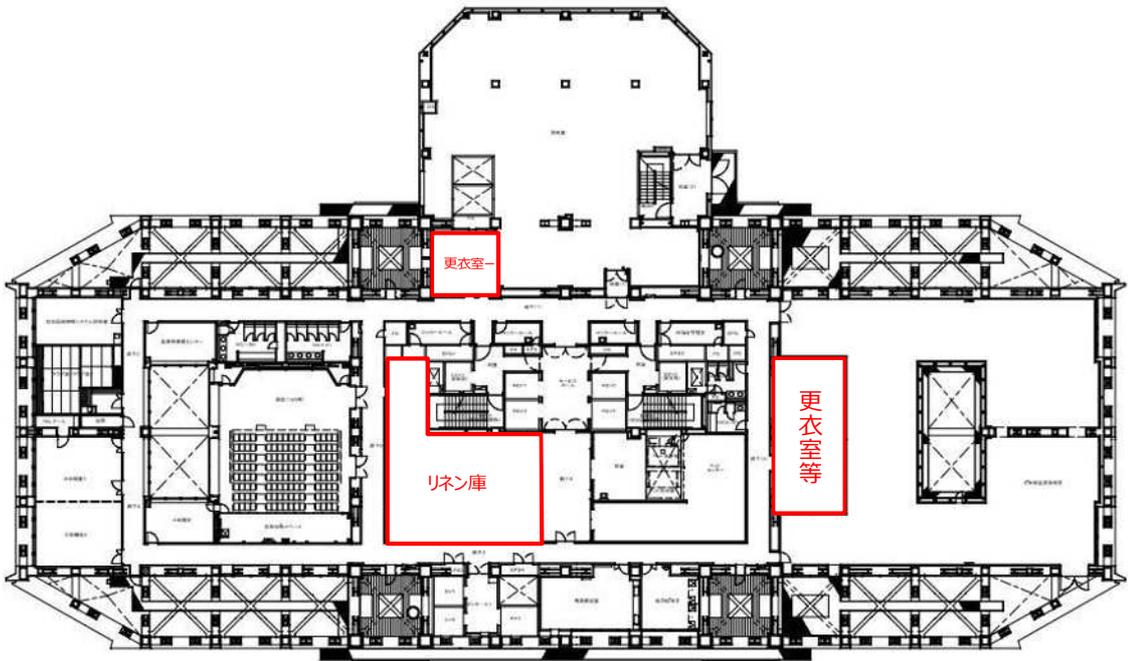

整備後


■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

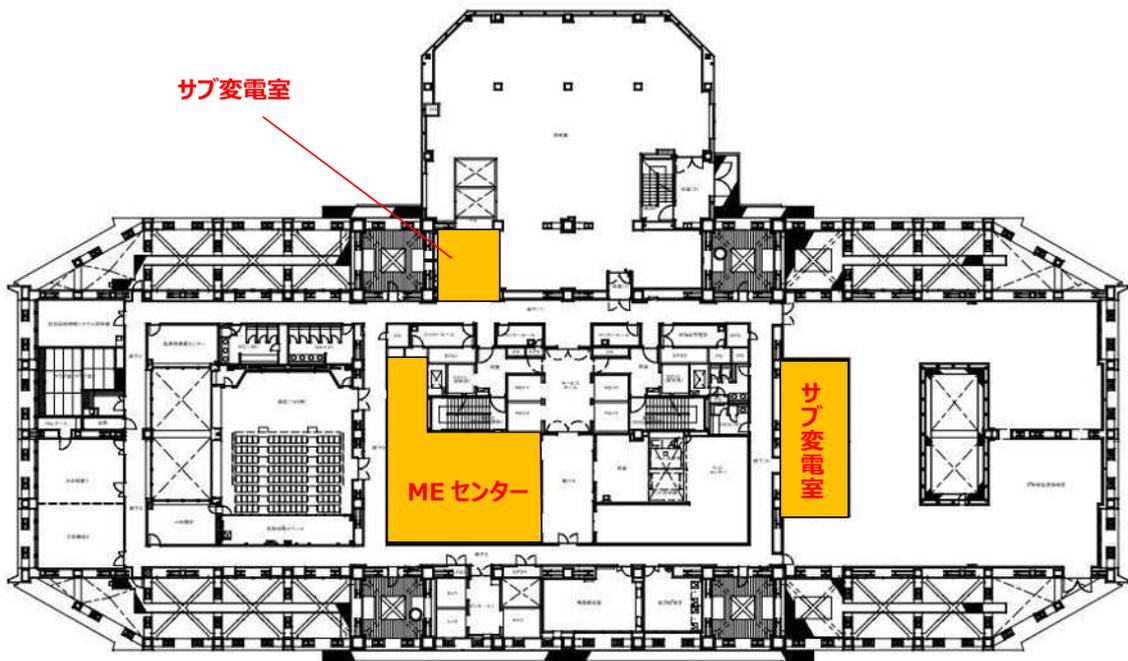

※改修工事を伴う箇所について記載


8階

整備前

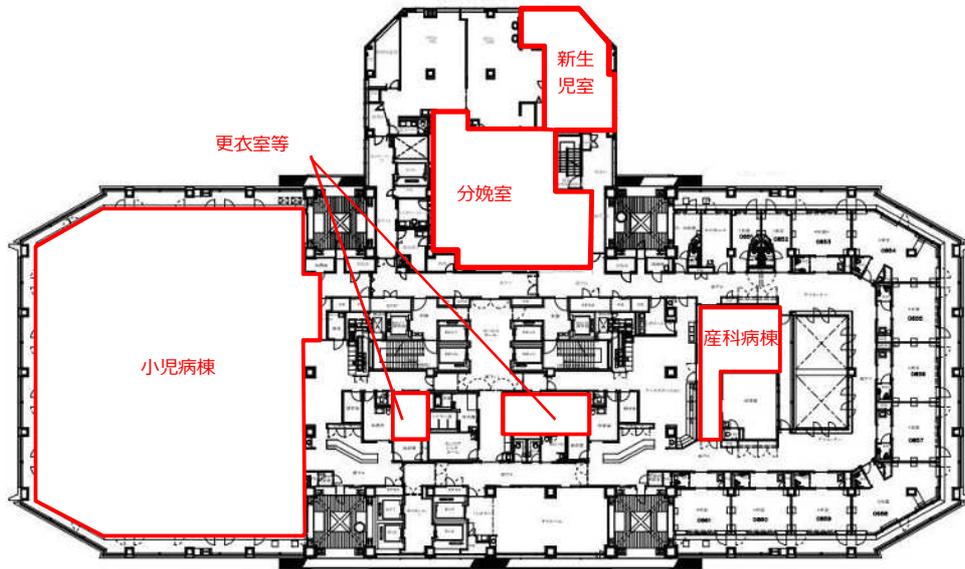

整備後


■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

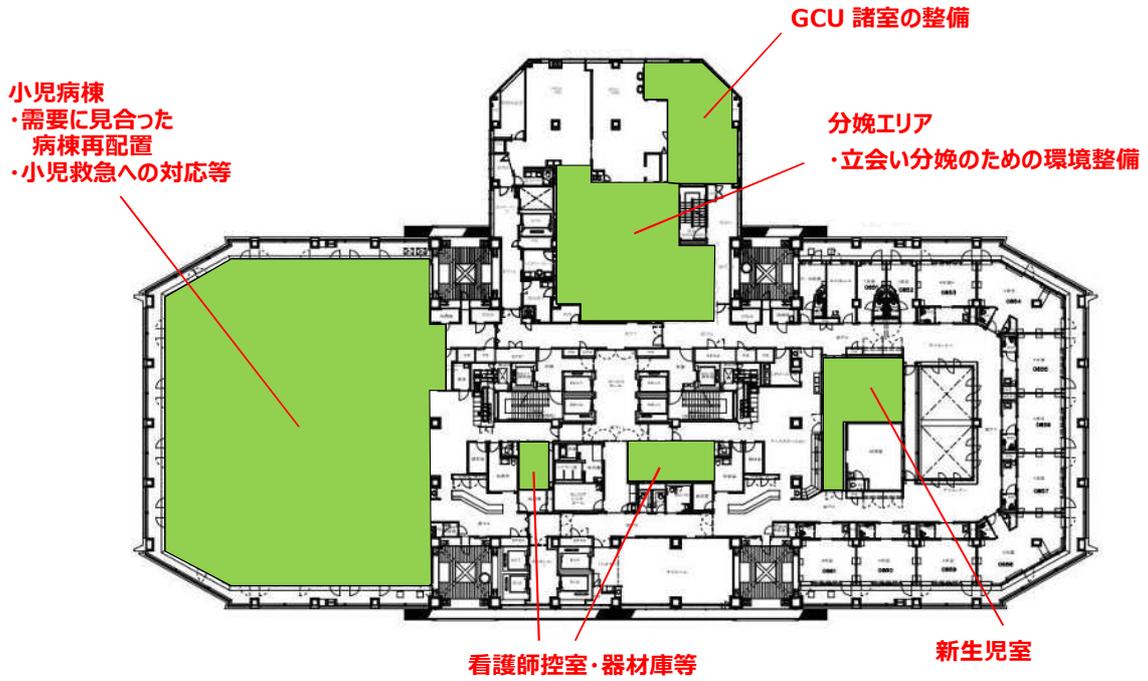

※改修工事を伴う箇所について記載


9階

整備前

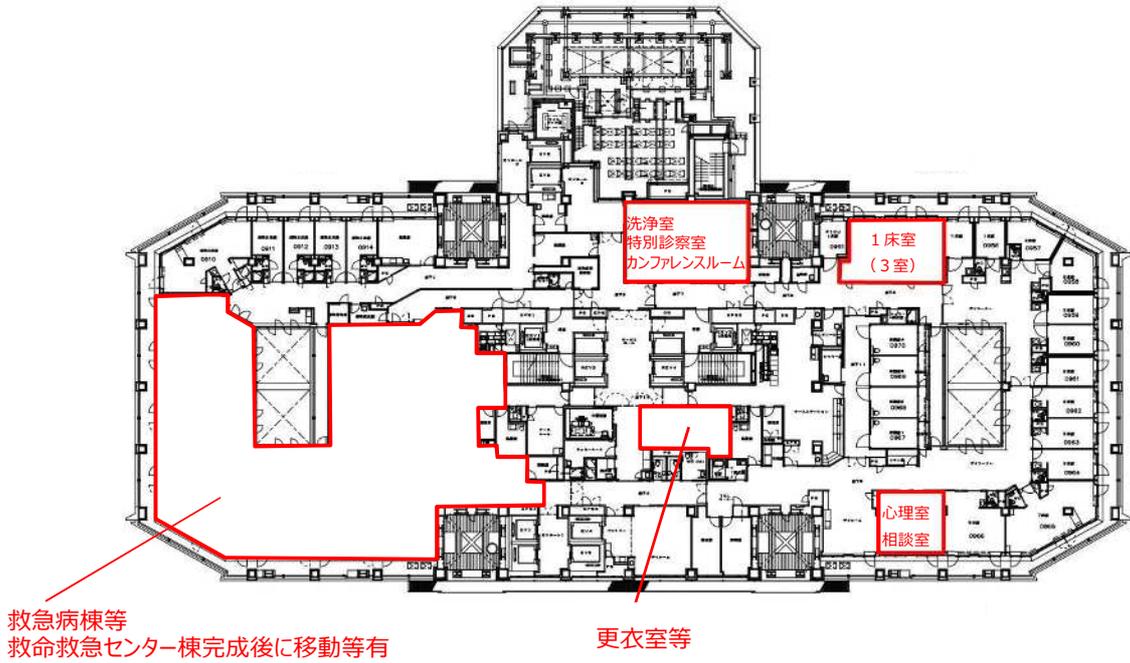

整備後


1期工事 2期工事 3期工事

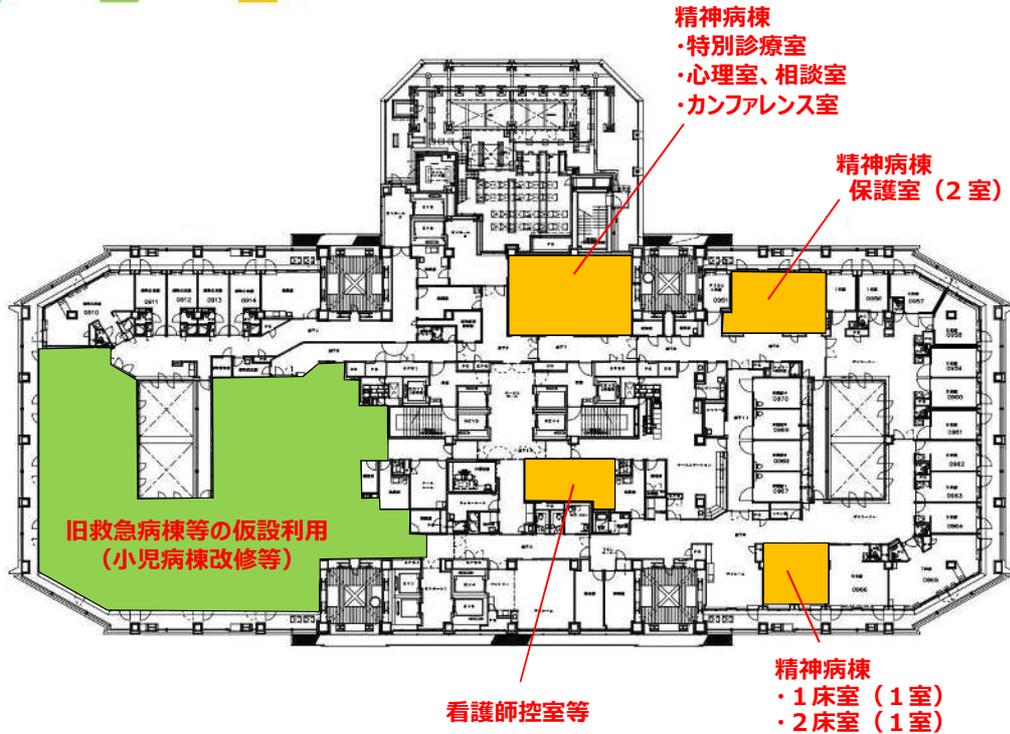

※改修工事を伴う箇所について記載


10階～14階

整備前

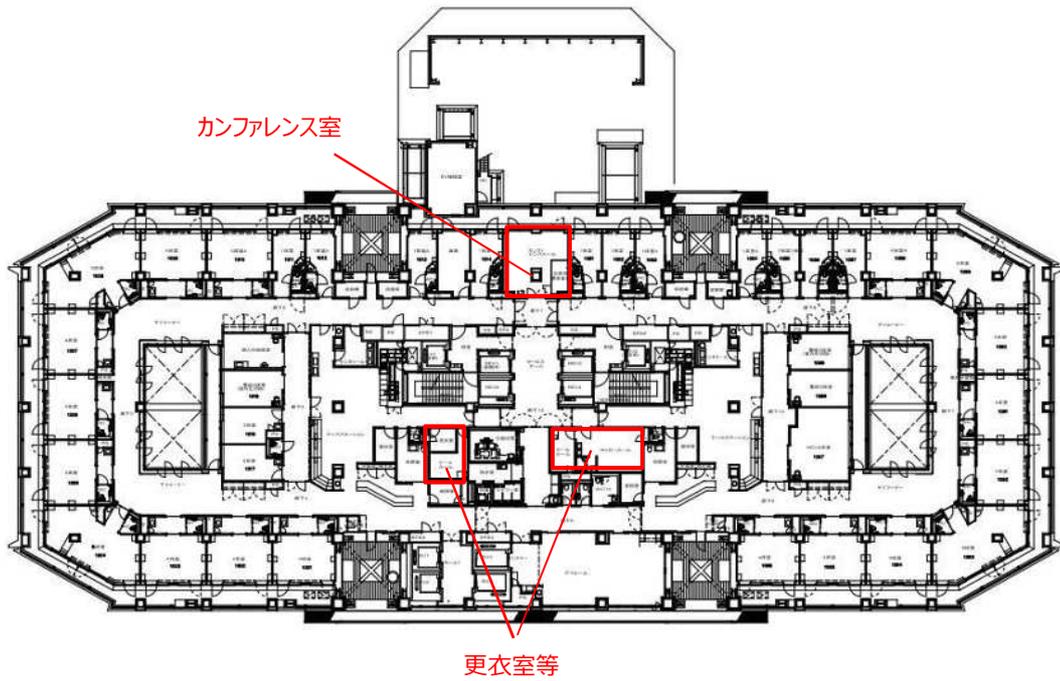

整備後


■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

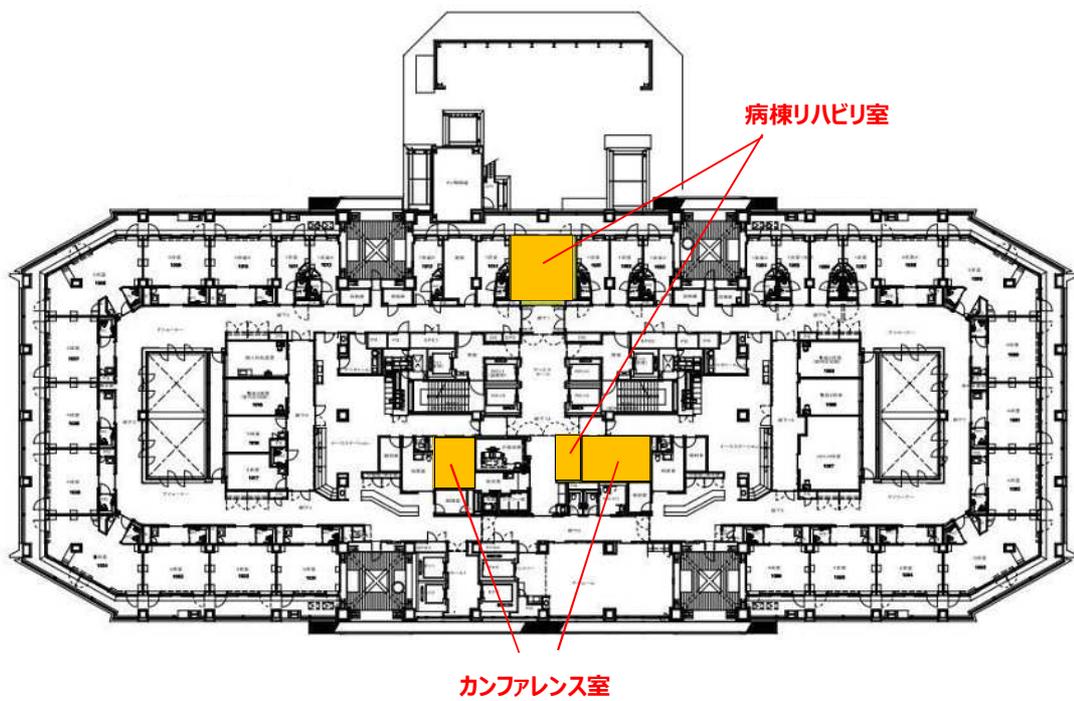

※改修工事を伴う箇所について記載


地下1階

整備前

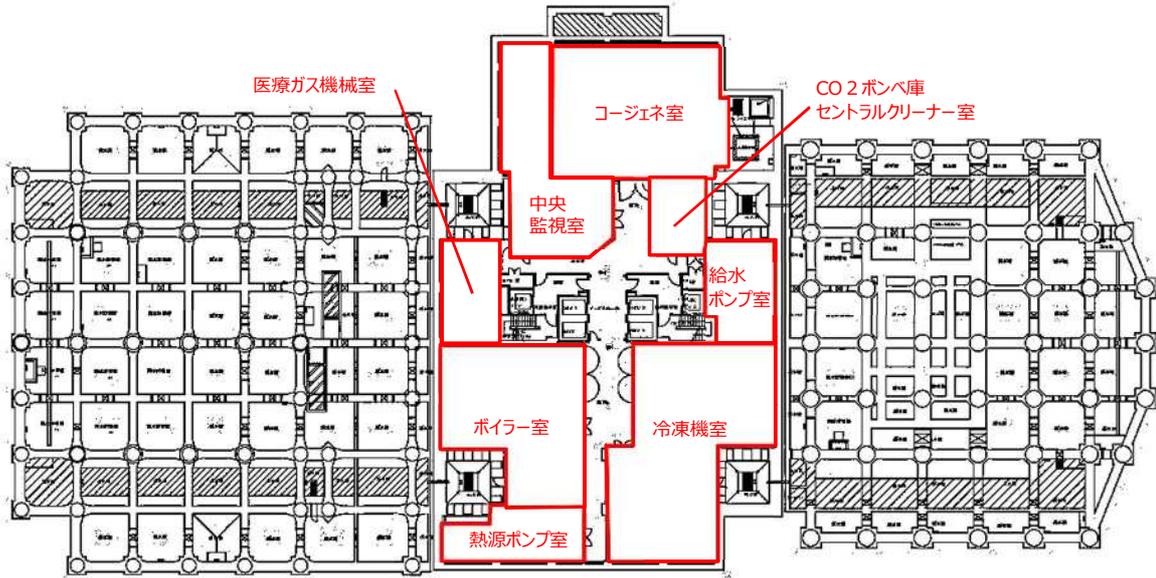

整備後

■ 1期工事 ■ 2期工事 ■ 3期工事

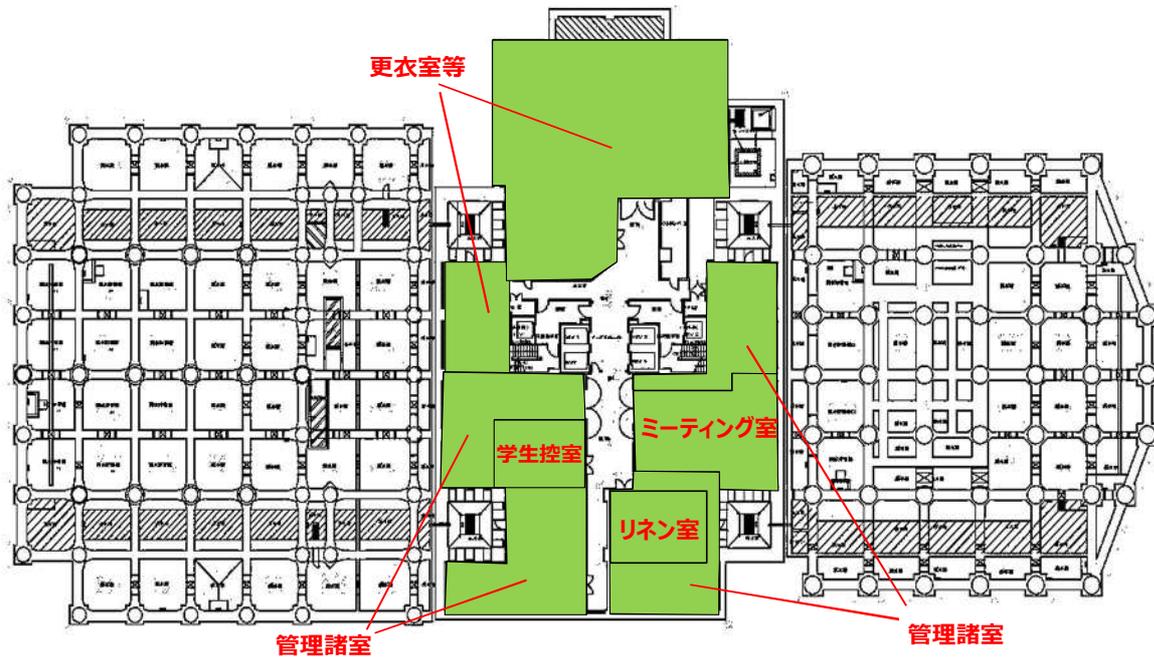

※改修工事を伴う箇所について記載
