

橋処理センター解体撤去その2工事

工事前 環境測定結果

§ アスベスト測定（単位：本/L）

測定日	測定地点				管理値
	A1	A2	A3	A4	
12月 1日	<0.056	0.11	0.11	<0.056	1

※ <0.056は、検出下限値未満を示しています。

【管理値について】

特定粉じん排出等作業（アスベスト工事）における基準値はありませんが、環境省水・大気環境局大気環境課発行の「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」により、漏洩監視の観点から目安として、石綿繊維数濃度1本/Lを管理値としています。

【測定地点について】

工事場所と敷地境界が離れているので、漏洩監視を確実にこなう為、工事場所付近の4カ所を測定地点に設定しました。

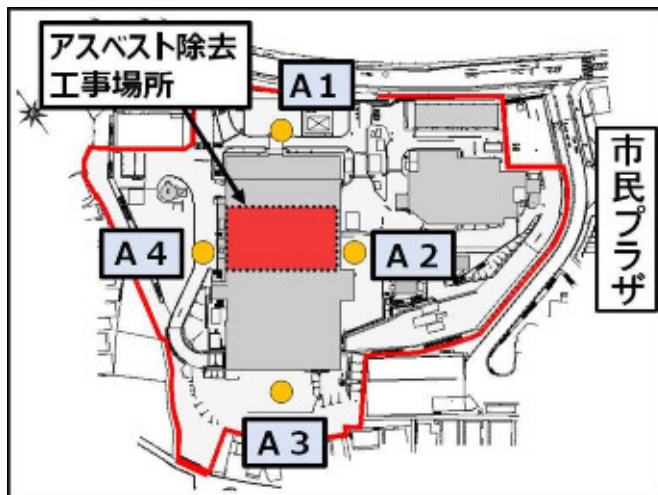


図. 測定地点
