

橋処理センター解体撤去その2工事

工事中 環境測定結果

§ アスベスト測定（単位：本/L）

| 測定日 | 測定地点 | | | | 管理値 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | |
| 9月22日 | <0.056 | <0.056 | <0.056 | <0.056 | 1 |
| 9月28日 | <0.056 | <0.056 | <0.056 | <0.056 | |

※ <0.056は、検出下限値未満を示しています。

【管理値について】

特定粉じん排出等作業（アスベスト工事）における基準値はありませんが、環境省水・大気環境局大気環境課発行の「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」により、漏洩監視の観点から目安として、石綿繊維数濃度1本/Lを管理値としています。

【測定地点について】

工事場所と敷地境界が離れているので、漏洩監視を確実にこなう為、工事場所付近の4カ所を測定地点に設定しました。

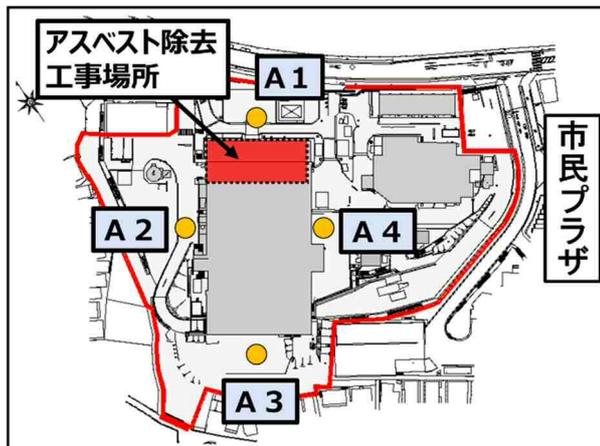


図. 測定地点
