様式２－２

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況		
				事業費（百万円）	事業内容（延長・面積・箇所数等）	執行額（百万円） 事業費（百万円）	進捗率	事業内容（延長・面積・箇所数等）			完成	完成見込み	次期計画へ移行
A01-001	（主）横浜生田（東三田）	川崎市	H31	449	歩道設置 L=1.7km	25 449	5.5%	歩道設置 L=1.7km		別添			○
A01-002	（主）川崎府中（生田）	川崎市	H31 R3	70	歩道設置 L=0.6km	45 70	64.0%	歩道設置 L=0.6km		別添	○		
A01-003	（主）横浜上麻生（柿生陸橋）	川崎市	H31 R2 R3	1,511	歩道設置 L=0.4km	232 1,511	15.4%	歩道設置 L=0.4km		別添			○
A01-004	（市）多摩7号線	川崎市	―	237	歩道設置 L=0.1km	0 237	0.0%	―		別添			○
A01-005	（市）堀川町1号線	川崎市	H31	130	受変電設備更新 N=1式	130 130	100.0%	受変電設備更新 N=1式		別添	○		
A01-006	（主）上麻生連光寺ほか	川崎市	H31	28	施設整備 N=3基	28 28	100.0%	施設整備 N=3基		別添	○		

A01-007	(県)川崎町田ほか	川崎市	H31 R2 R2補正	282	道路冠水表示板設置 N=10箇所	134 --- 282	47.5%	道路冠水表示板設置 N=10箇所		別添	○		
A01-008	(市)尻手黒川線	川崎市	H31 R2 R2補正 R4	886	舗装修繕 L=13.4km	526 --- 886	59.4%	舗装修繕 L=13.4km		別添	○		
A01-009	(主)東京大師横浜	川崎市	R4	500	舗装修繕 L=5.5km	175 --- 500	35.0%	舗装修繕 L=5.5km		別添	○		
A01-010	(県)扇町川崎 停車場線	川崎市	H31 R2	84	自転車通行環境整備 L=0.4km	84 --- 84	100.0%	自転車通行環境整備 L=0.4km		別添	○		
A01-011	(県)扇町川崎 停車場線	川崎市	H31 R2	62	駐輪場施設整備 L=0.4km	37 --- 62	59.7%	駐輪場施設整備 L=0.4km		別添	○		
A01-012	(市)小川町線	川崎市	H31 R2	150	自転車通行環境整備 L=0.2km	93 --- 150	61.7%	自転車通行環境整備 L=0.2km		別添	○		
A01-013	(市)殿町39号線ほか	川崎市	H31	250	自転車通行環境整備 L=25km	28 --- 250	11.2%	自転車通行環境整備 L=4.3km	別計画へ移行 (R2移行)	別添			

A01-014	(県)川崎町田ほか	川崎市	―	50	自転車通行環境整備 L=5km	0 --- 50	0.0%	―	別計画へ移行 (R2移行)	別添			
A01-015	(主)川崎府中ほか	川崎市	―	50	自転車通行環境整備 L=5km	0 --- 50	0.0%	―	別計画へ移行 (R2移行)	別添			
A01-016	(国)国道409号ほか	川崎市	―	100	自転車通行環境整備 L=10km	0 --- 100	0.0%	―	別計画へ移行 (R2移行)	別添			
A01-017	(市)子母口宿河原線	川崎市	H31補正	140	擁壁修繕 N=1式	140 --- 140	100.0%	擁壁修繕 N=1式		別添	○		
A01-018	(市)古市場矢上線ほか	川崎市	R2	56	施設整備 N=4基	56 --- 56	100.0%	エレベーター更新 N=2基		別添	○		
A01-019	(市)二子千年線 (末長トンネル)	川崎市	R2	45	トンネル照明更新 N=1トンネル	45 --- 45	100.0%	照明更新 N=67台		別添	○		
A01-020	(主)川崎府中	川崎市	R3	44	道路冠水表示板設置 N=1箇所	30 --- 44	68.2%	道路冠水表示板設置 N=1箇所	事業追加 (H31)	別添	○		

A01-021	（主）川崎府中（桝形2丁目ポンプ場）	川崎市	R3	50	施設整備 N=2基	37 ---------- 50	74.0%	施設整備 N=2基	事業追加（H31）	別添	○		
A01-022	（国）国道15号	川崎市	R4	40	施設整備 N=4基	23 ---------- 40	56.8%	施設整備 N=4基	事業追加（R2）	別添	○		
A01-023	（市）上小田中49号線	川崎市	R4	15	施設整備 N=2基	11 ---------- 15	75.3%	施設整備 N=2基	事業追加（R2）	別添	○		
A01-024	（市）多摩3号線	川崎市	R4	10	施設整備 N=1基	6 ---------- 10	57.0%	施設整備 N=1基	事業追加（R2）	別添	○		
A01-025	（市）登戸新町42号線	川崎市	R5	120	歩道設置 L=0.02km	102 ---------- 120	85.0%	歩道設置 L=0.02km	事業追加（R3）	別添	○		
A01-026	（国）国道409号	川崎市	R5	23	施設整備 N=2基	24 ---------- 23	104.3%	施設整備 N=2基	事業追加（R3）	別添	○		
A01-027	（県）川崎扇町停車場	川崎市	R5	23	施設整備 N=2基	16 ---------- 23	69.6%	施設整備 N=2基	事業追加（R4）	別添	○		

A01-028	(市)幸多摩線ほか	川崎市	R5	50	道路照明点検	50 50	100.0%	道路照明点検	事業追加 (R4)	別添			○
事業費 計				5,455		2,076 5,455	38.1%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要(事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費(百万円)	事業内容(延長・面積・箇所数等)	執行額(百万円) 事業費(百万円)	進捗率	事業内容(延長・面積・箇所数等)			完成	完成見込み	次期計画へ移行
							–						
							–						
							–						
事業費 計				0		0 0	–						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要(事業の削除・追加を含む)	資料(図面)	評価時の完成状況		
				事業費(百万円)	事業内容(延長・面積・箇所数等)	執行額(百万円) 事業費(百万円)	進捗率	事業内容(延長・面積・箇所数等)			完成	完成見込み	次期計画へ移行
							–						
							–						
							–						
事業費 計				0		0 0	–						

２ 計画の概要　～社会資本総合整備計画 防災･安全交付金①（防災安全）～

事業箇所・事業内容

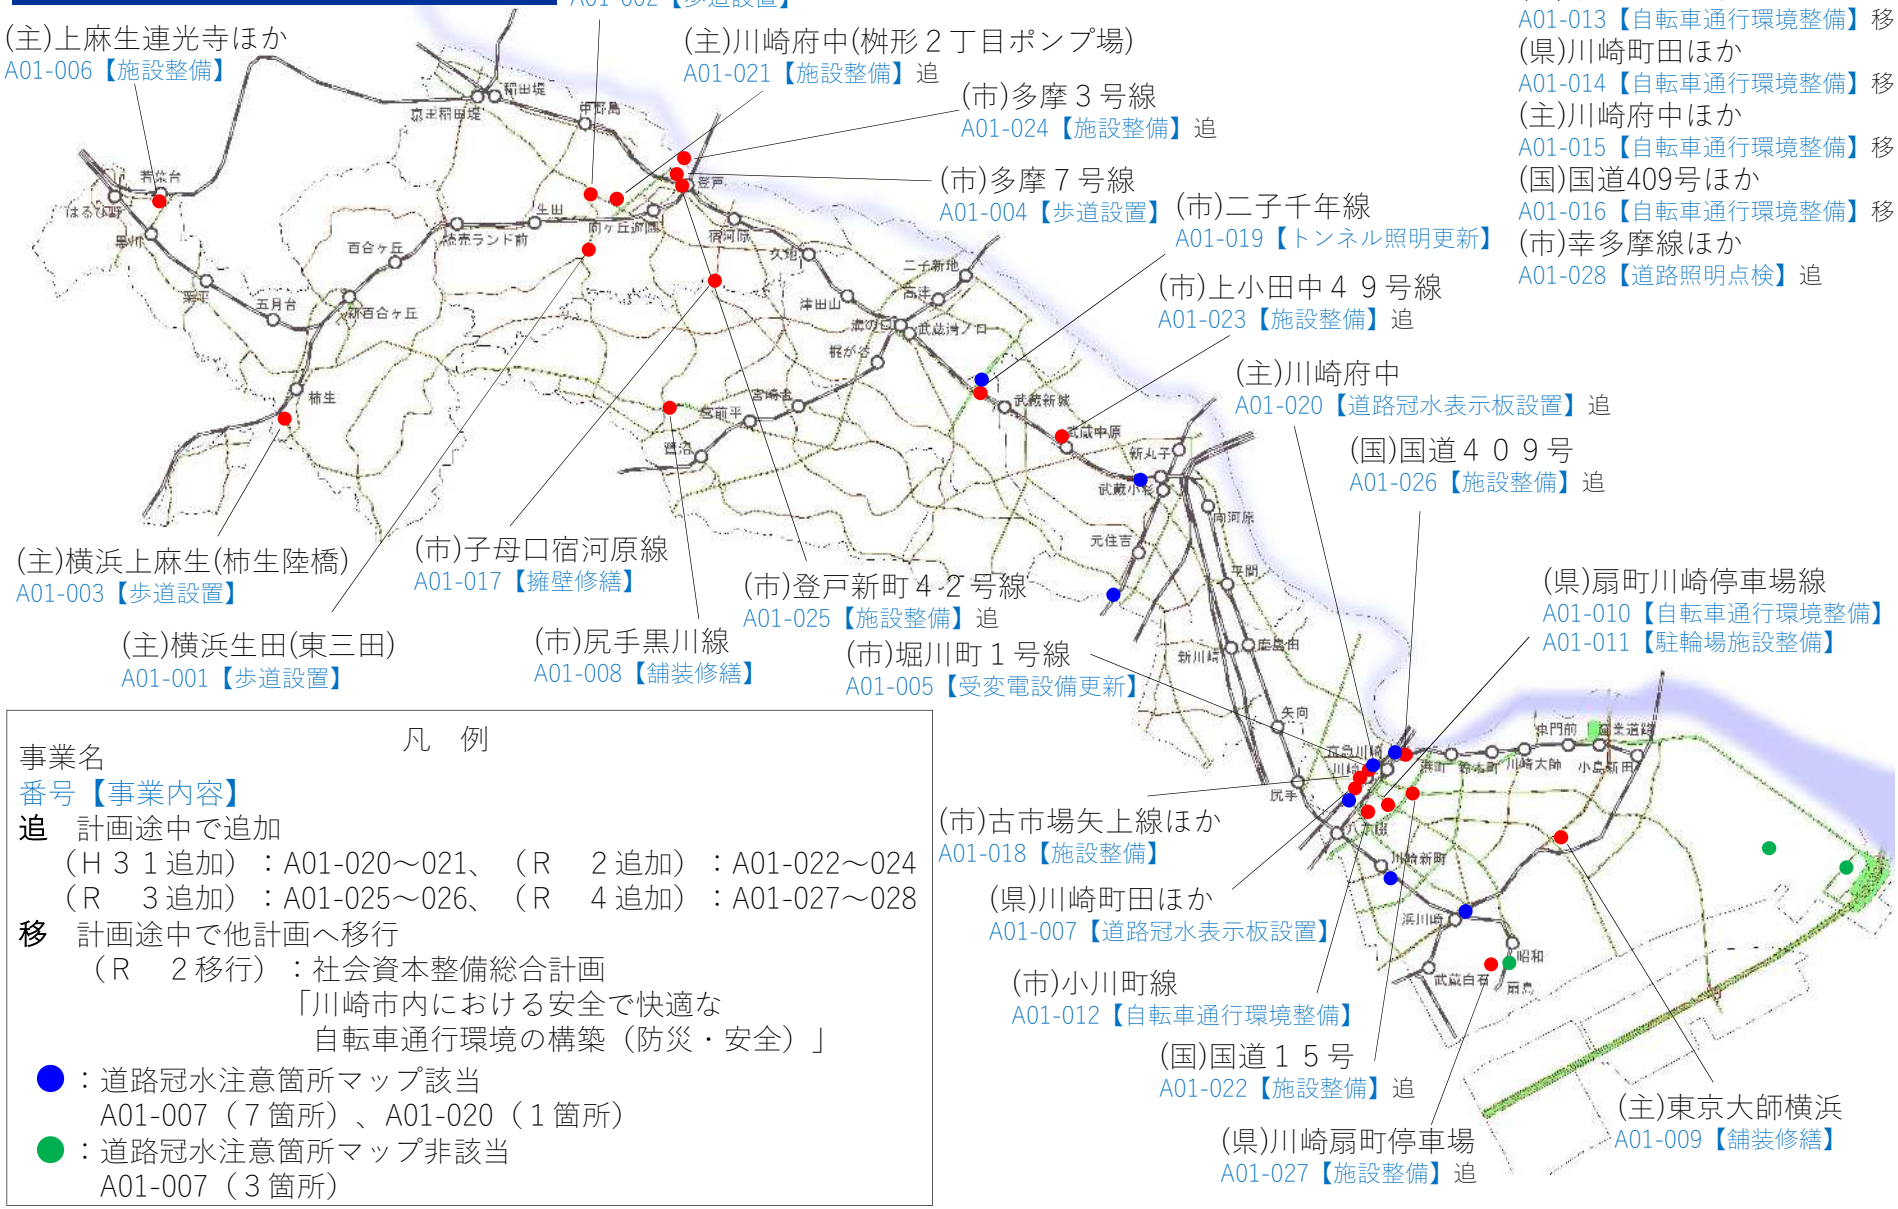

【市内一円】
(市)殿町３９号線ほか
A01-013【自転車通行環境整備】移
(県)川崎町田ほか
A01-014【自転車通行環境整備】移
(主)川崎府中ほか
A01-015【自転車通行環境整備】移
(国)国道409号ほか
A01-016【自転車通行環境整備】移
(市)幸多摩線ほか
A01-028【道路照明点検】追

凡　例

事業名
番号【事業内容】
追　計画途中で追加
（Ｈ３１追加）：A01-020～021、（Ｒ　２追加）：A01-022～024
（Ｒ　３追加）：A01-025～026、（Ｒ　４追加）：A01-027～028
移　計画途中で他計画へ移行
（Ｒ　２移行）：社会資本整備総合計画
「川崎市内における安全で快適な
自転車通行環境の構築（防災・安全）」

● ：道路冠水注意箇所マップ該当
A01-007（７箇所）、A01-020（１箇所）

● ：道路冠水注意箇所マップ非該当
A01-007（３箇所）
