様式２－２

社会資本整備総合交付金を充てた全要素事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況		
				事業費（百万円）	事業内容（延長・面積・箇所数等）	執行額（百万円）／事業費（百万円）	進捗率	事業内容（延長・面積・箇所数等）			完成	完成見込み	次期計画へ移行
A01-001	丸子中山茅ヶ崎線（小杉御殿）	川崎市	H31	777	無電柱化 L=1.4km	46 / 777	6.0%	側溝工事 N=1式 建物調査 N=1件	別事業へ移行（R2移行）	別添			
A01-002	野川柿生線（久本）	川崎市	H31	2,133	無電柱化 L=1.8km	2 / 2,133	0.1%	建物調査 N=1件	別事業へ移行（R2移行）	別添			
A01-003	世田谷町田線（片平）	川崎市	H31 H31補正	998	無電柱化 L=2.6km	139 / 998	13.9%	舗装工事 N=1式	別事業へ移行（R2移行）	別添			
A01-004	世田谷町田線（上麻生）	川崎市	―	1,219	無電柱化 L=0.8km	0 / 1,219	0.0%	―	別事業へ移行（R2移行）	別添			
A01-005	柿生町田線	川崎市	H31	1,351	無電柱化 L=0.6km	5 / 1,351	0.4%	建物調査 N=2件	別事業へ移行（R2移行）	別添			
A01-006	（国）国道409号（市ノ坪）	川崎市	H31	250	無電柱化 L=1.2km	4 / 250	1.8%	建物調査 N=1件	別事業へ移行（R2移行） R4事後評価実施	別添			

A01-007	(国)国道409号 (小杉御殿町)	川崎市	H31	1,920	無電柱化 L=2.2km	501 --- 1,920	26.1%	用地取得 N=11件 物件等補償 N=16件 建物調査 N=4件	別事業へ移行 (R2移行) R4事後評価実施	別添			
A01-008	(国)国道409号 (北見方)	川崎市	H31	1,142	無電柱化 L=1.6km	121 --- 1,142	10.6%	用地取得 N=1件 物件等補償 N=3件	別事業へ移行 (R2移行) R4事後評価実施	別添			
A01-009	(主)世田谷町田	川崎市	H31	540	無電柱化 L=0.6km	182 --- 540	33.7%	電線共同溝工事 N=1式	別事業へ移行 (R2移行)	別添			
A01-010	宮内新横浜線 (宮内)	川崎市	H31	1,145	無電柱化 L=1.4km	482 --- 1,145	42.1%	用地取得 N=5件 物件等補償 N=3件 建物調査 N=2件	別事業へ移行 (R2移行)	別添			
A01-011	菅早野線 (下麻生)	川崎市	H31	510	無電柱化 L=1.1km	6 --- 510	1.2%	用地取得 N=1件 物件等補償 N=1件 建物調査 N=1件	別事業へ移行 (R2移行)	別添			
A01-012	菅早野線 (白山)	川崎市	H31	178	無電柱化 L=0.2km	134 --- 178	75.1%	用地取得 N=2件 物件等補償 N=4件	別事業へ移行 (R2移行)	別添			
事業費 計				12,163		1,622 --- 12,163	13.3%						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況		
				事業費（百万円）	事業内容（延長・面積・箇所数等）	執行額（百万円） 事業費（百万円）	進捗率	事業内容（延長・面積・箇所数等）			完成	完成見込み	次期計画へ移行
							－						
							－						
							－						
事業費 計				0		0 0	－						

C 効果促進事業

番号	事業名	事業箇所名	事業年度	当初計画		評価時計画			当初計画からの変更概要（事業の削除・追加を含む）	資料（図面）	評価時の完成状況		
				事業費（百万円）	事業内容（延長・面積・箇所数等）	執行額（百万円） 事業費（百万円）	進捗率	事業内容（延長・面積・箇所数等）			完成	完成見込み	次期計画へ移行
							－						
							－						
							－						
事業費 計				0		0 0	－						

２ 計画の概要　～社会資本総合整備計画 防災･安全交付金②（無電柱化）～

事業箇所・事業内容

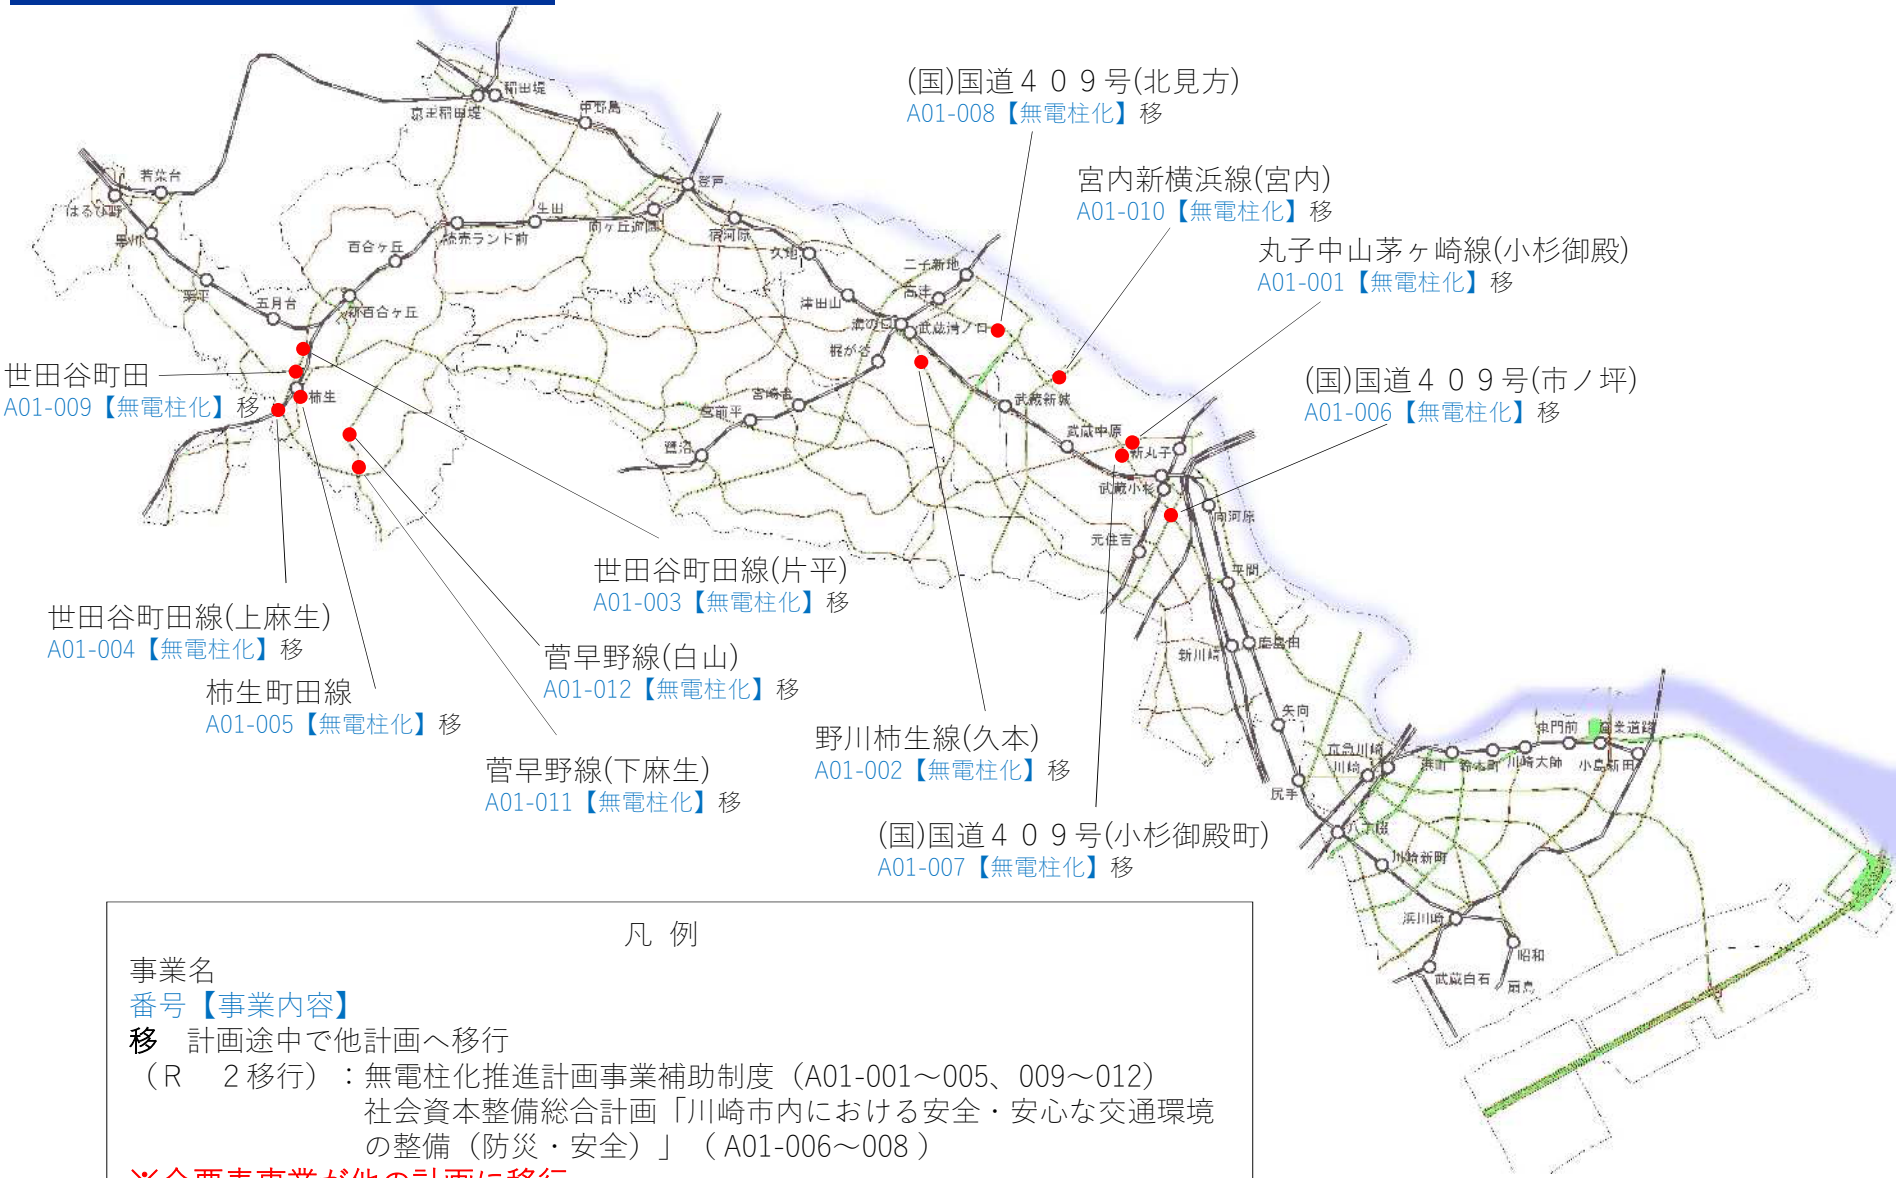

凡　例

事業名
番号【事業内容】
移　計画途中で他計画へ移行
（R　２移行）：無電柱化推進計画事業補助制度（A01-001～005、009～012）
社会資本整備総合計画「川崎市内における安全・安心な交通環境の整備（防災・安全）」（A01-006～008）

※全要素事業が他の計画に移行
