

令和2年2月13日

# 建設緑政局関係議案資料 (その2)

議案第28号

都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約

の変更について

建設緑政局


# 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更について

## 1 工事の概要

### (1) 概要


- 工事名：都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事
- 受注者：五洋・日立造船・不動テトラ・横河・本間・高田共同企業体
- 工期：平成29(2017)年6月23日～令和3(2021)年3月31日

### (2) 平面図・横断面

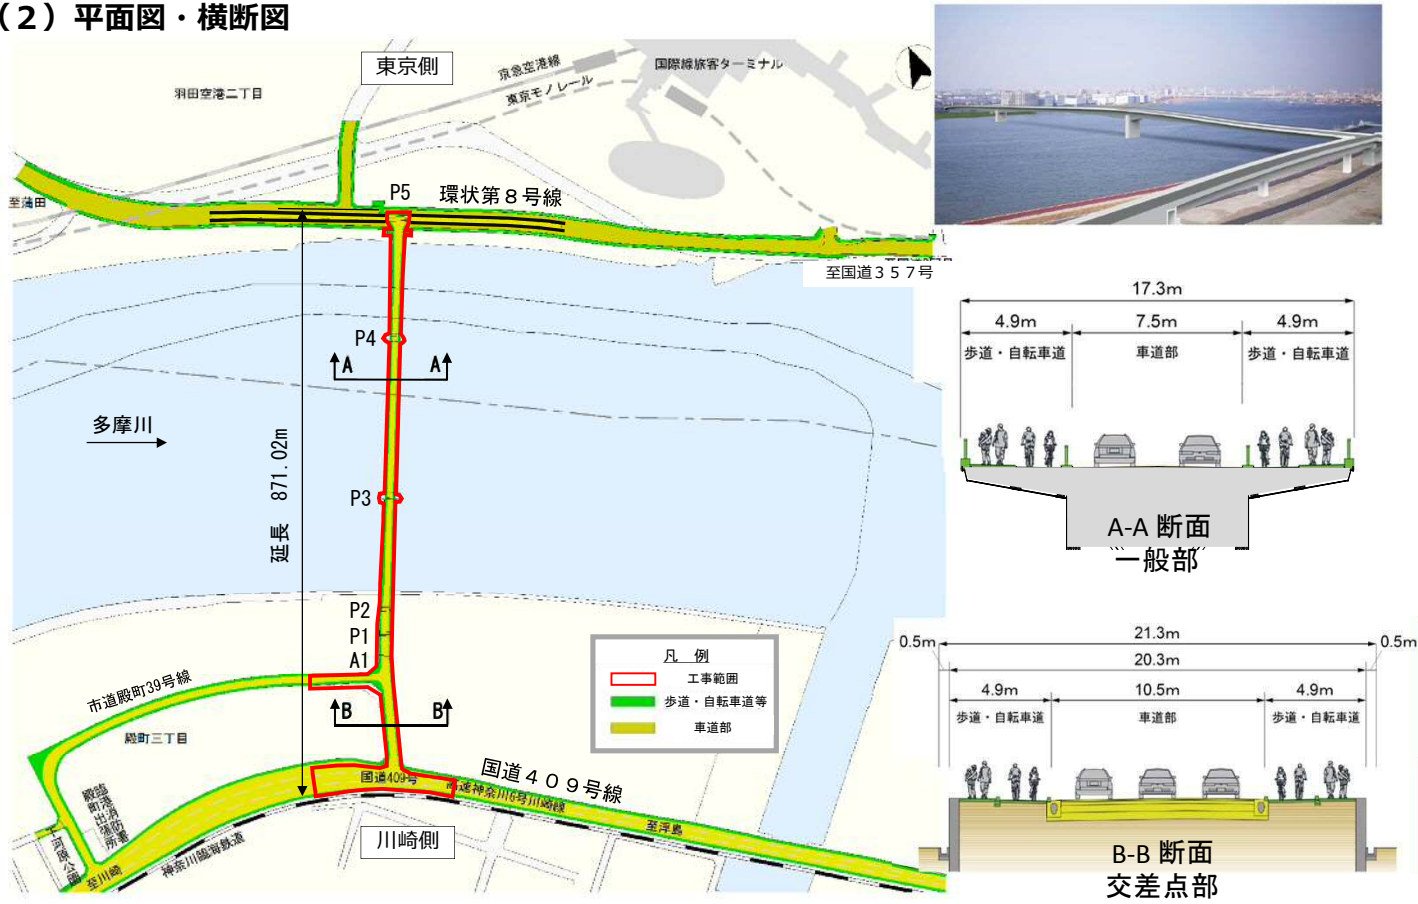

## 3 変更契約の概要

令和元年台風第19号の影響により河川内に堆積した土砂の浚渫が必要となったため、契約金額の変更を行うものである。

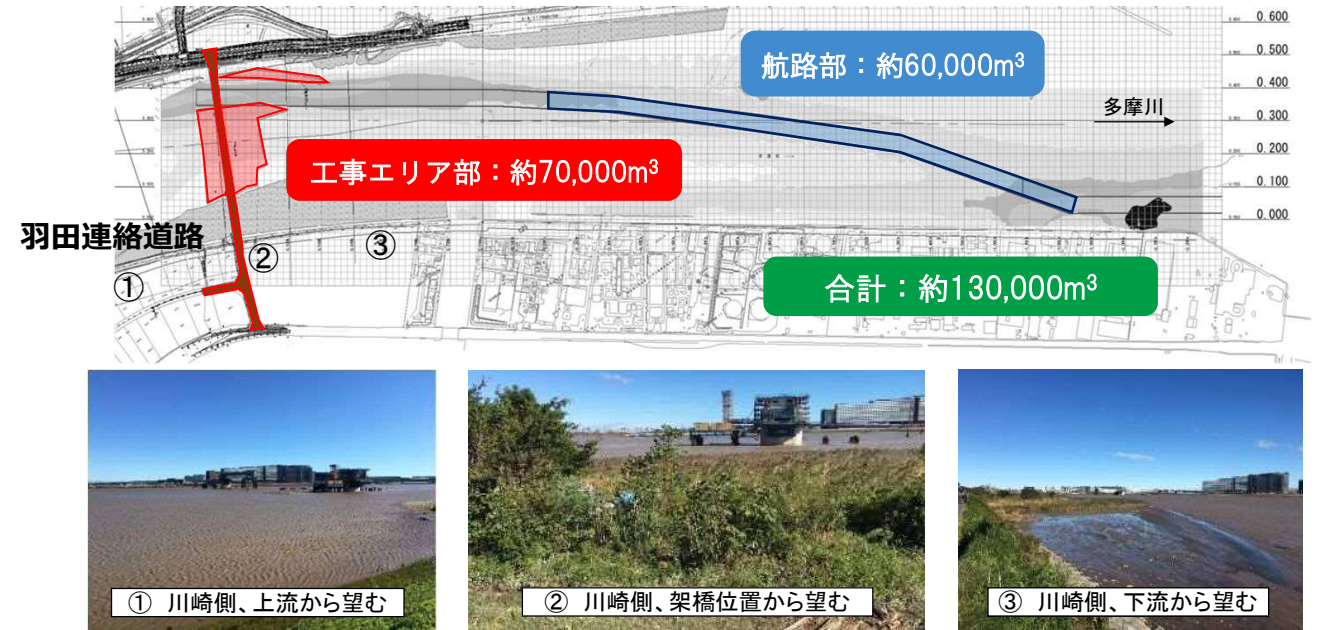

## 2 経緯

項目	日付	上段：増減額 [税込] 下段：契約額 [税込]	変更理由
当初契約	平成29年6月23日	21,718,800,000円	
第1回変更契約	平成30年3月27日	+534,114,000円 22,252,914,000円	・設計労務単価に係る特例措置によるもの ・河川内の地形測量の結果により、浚渫工の数量が増加したこと等によるもの
第2回変更契約	平成31年3月25日	±0円 22,252,914,000円	・工事内容の精査に伴う内容変更
第3回変更契約	令和元年12月13日	+2,800,798,000円 25,053,712,000円	・構造検討や詳細設計の深度化に伴うもの ・関係機関協議等の結果に伴うもの ・工事実績に伴うもの(維持浚渫工など)
第4回変更契約	—	+2,108,876,000円 (うち市負担額 約387百万円) 27,162,588,000円 (うち市負担額 約6,026百万円)	・台風の影響により堆積した土砂の浚渫等によるもの

項目	概要
土砂堆積に伴う工事費の増額	<p>○台風の影響により堆積した土砂の浚渫等の増額 [2,108百万円(うち市負担額 約387百万円)] (補正予算額：2,200百万円)</p> <p>[約2,908百万円] (うち市負担額 約534百万円) (補正予算額：3,000百万円)</p> <p>赤枠：第4回変更契約</p>
概要	<p>○浚渫作業期間中の仮設設備の維持管理費用の増額 [約800百万円(うち市負担額 約147百万円)] (補正予算額：800百万円)</p>
