


# JR川崎駅北口自由通路等整備事業（整備概要）

## ■平面図（新設3階（コンコース階））

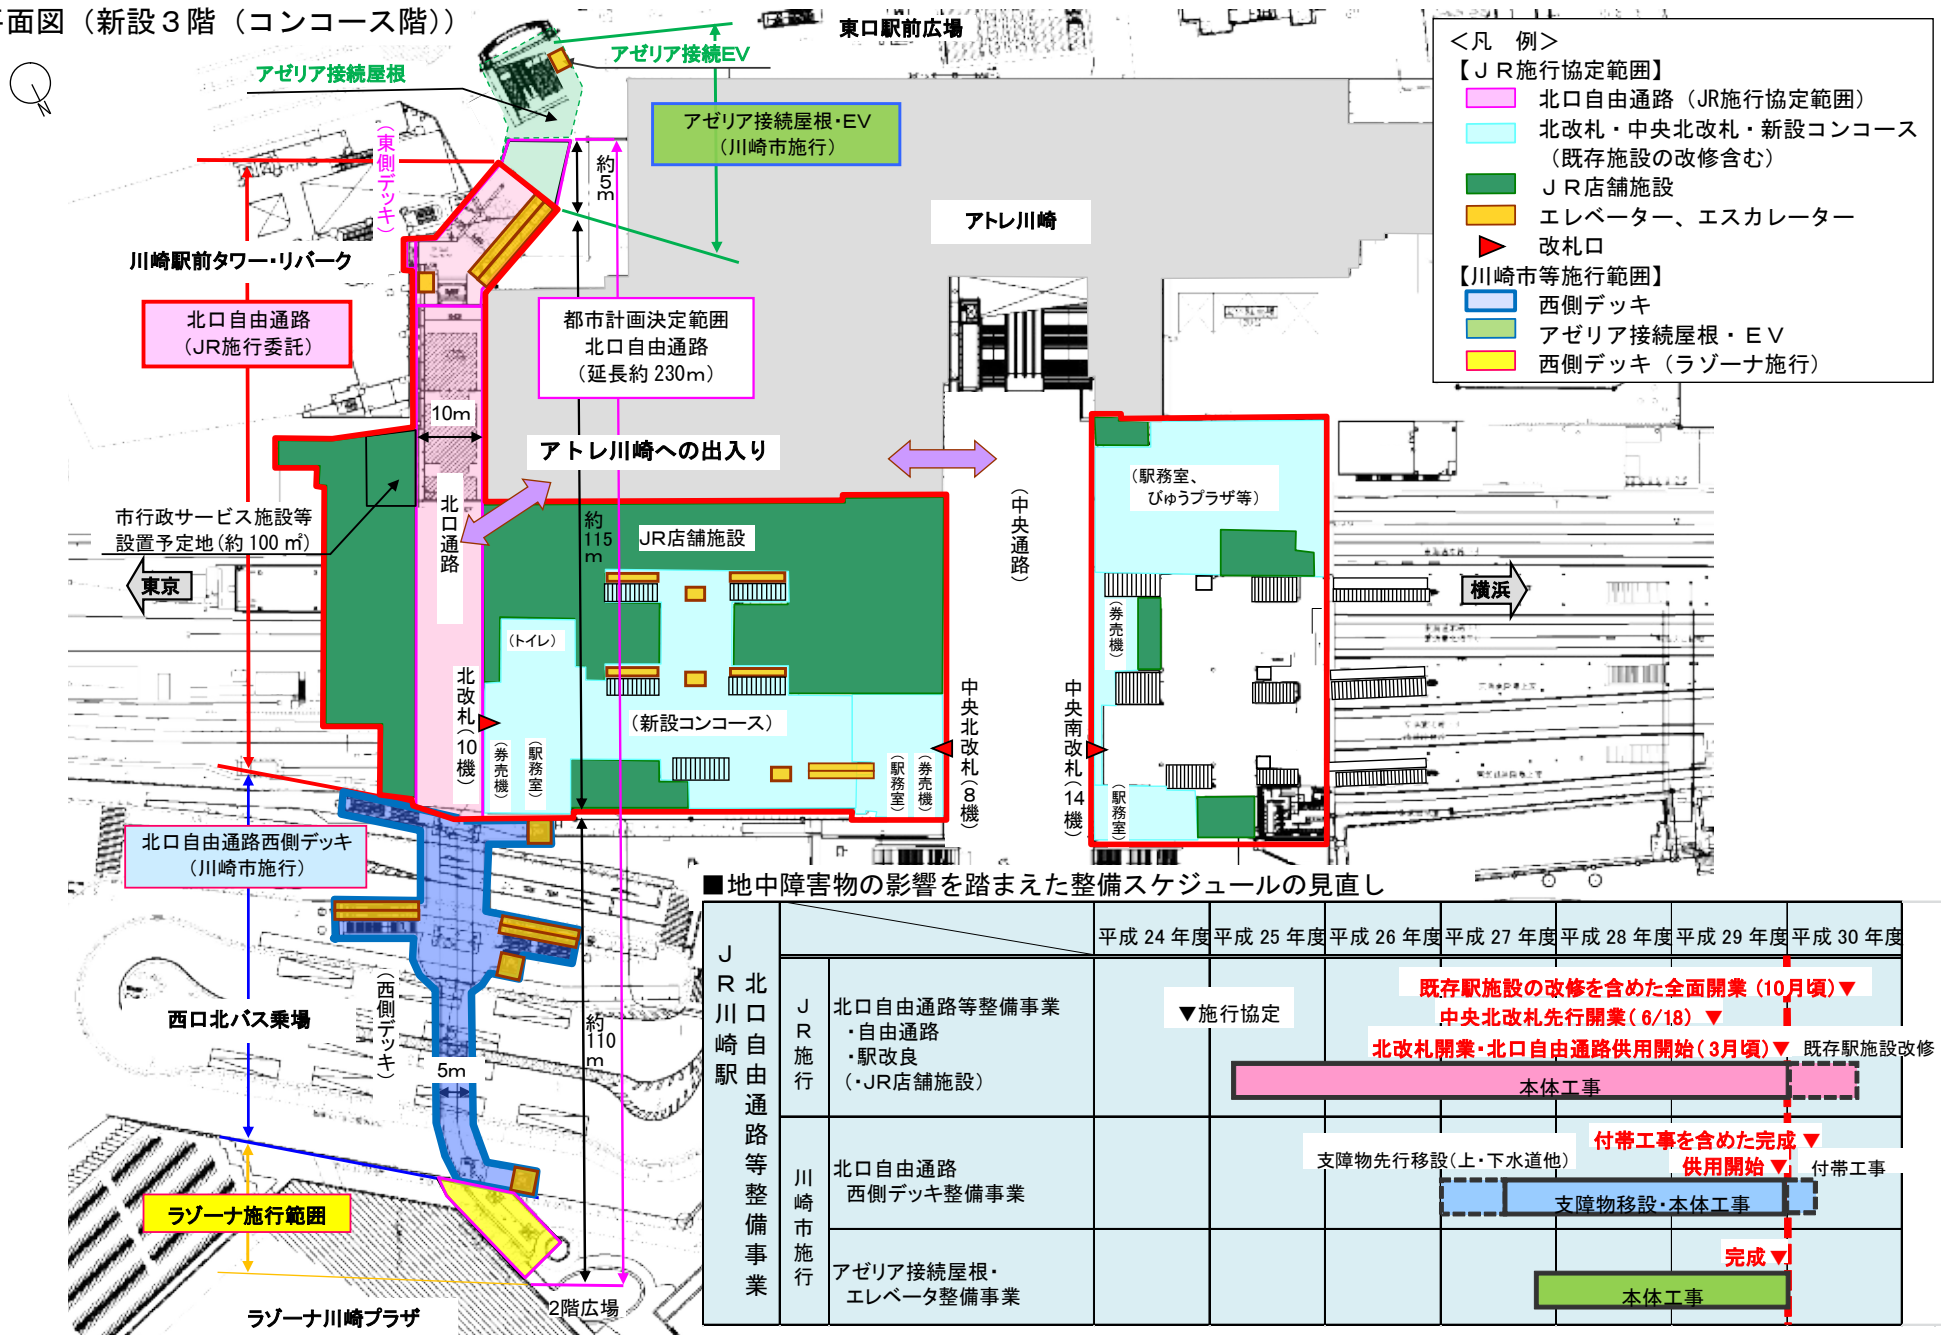

## ■地中障害物の影響を踏まえた整備スケジュールの見直し

		平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
JR川崎駅	JR施行	▼施行協定		既存駅施設の改修を含めた全面開業 (10月頃) ▼ 中央北改札先行開業 (6/18) ▼ 北改札開業・北口自由通路供用開始 (3月頃) ▼			既存駅施設改修	
	川崎市施行	北口自由通路等整備事業 ・自由通路 ・駅改良 (・JR店舗施設)		本体工事				
	川崎市施行	北口自由通路 西側デッキ整備事業		支障物先行移設 (上・下水道他)			付帯工事を含めた完成 ▼ 供用開始 ▼	付帯工事
川崎市施行	アゼリア接続屋根・エレベーター整備事業		支障物移設・本体工事			完成 ▼	完成 ▼	本体工事



【北改札イメージ】



【中央北改札イメージ】




【東側デッキのイメージ】



【アゼリア接続屋根のイメージ】



【アゼリア接続屋根のイメージ】

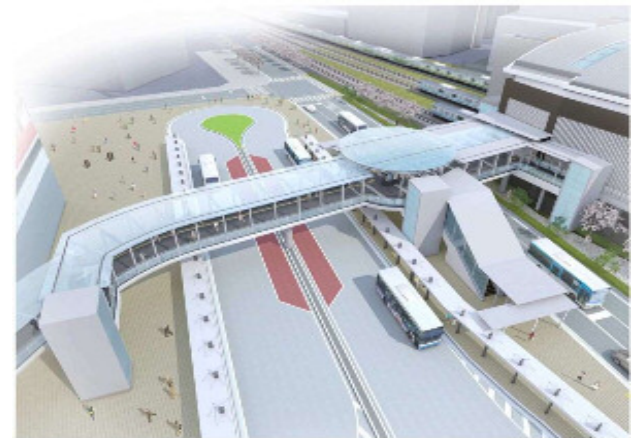

【西側デッキイメージ】
