

令和2年8月28日

# 建設緑政局関係議案資料 (その2)

議案第117号

都市計画道路殿町羽田空港線ほか  
道路築造工事請負契約の変更について

建設緑政局

# 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更について

## 1 工事の概要

### (1) 概要 (現在の契約)

- 工事名：都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事
- 受注者：五洋・日立造船・不動テトラ・横河・本間・高田共同企業体
- 工期：平成29(2017)年6月23日～平成33(2021)年3月31日

### (2) 平面図・横断面図




## 2 契約の経過

項目	契約年月日	上段：増減額【税込】 下段：契約額【税込】	変更理由
当初契約	平成29年6月23日	21,718,800,000円	
第1回変更契約	平成30年3月27日	+534,114,000円 22,252,914,000円	・設計労務単価に係る特定措置によるもの ・河川内の地形測量の結果により、浚渫工の数量が増加したこと等によるもの
第2回変更契約	平成31年3月25日	±0円 22,252,914,000円	・工事内容の精査に伴う内容変更
第3回変更契約	令和元年2月13日	+2,800,798,000円 25,053,712,000円	・構造検討や詳細設計の深度化に伴うもの ・関係機関協議等の結果に伴うもの ・工事実績に伴うもの(維持浚渫工など)
第4回変更契約	令和2年3月23日	+2,108,876,000円 27,162,588,000円	・令和元年東日本台風の影響により河川内に堆積した土砂の浚渫等の増額
第5回変更契約	令和2年3月26日	±0円 27,162,588,000円	・各会計年度における請負金額の支払限度額及び出来高予定額の変更
第6回変更契約	—	+617,650,000円 (うち市負担額 約120百万円) 27,780,238,000円 (うち市負担額 約6,150百万円)	・令和元年東日本台風の影響により河川内に堆積した土砂の浚渫作業期間中の仮設設備の維持管理等の増工などによるもの ・完成期限の変更(1年間の延伸)

## 3 変更契約の概要


### (1) 契約金額の変更 (A+B)

令和元年東日本台風の影響により河川内に堆積した土砂の浚渫が必要となった。



土砂堆積に伴う 工事費の増額		補正予算額 令和元年第5回定例会 にて議決	第4回変更契約額 令和2年3月23日 締結	第6回変更契約額 (今回)	変更契約額 合計
A	土砂の浚渫等 	2,200百万円	2,108百万円	▲122百万円	1,986百万円
B	浚渫作業期間中 の仮設設備の 維持管理費用等 	800百万円	浚渫作業期間確定後 に契約するため 変更契約せず	740百万円	740百万円
A+B		3,000百万円 うち市負担額 約550百万円	2,108百万円 うち市負担額 約390百万円	618百万円 うち市負担額 約120百万円	2,726百万円 うち市負担額 約510百万円

### (2) 完成期限の変更

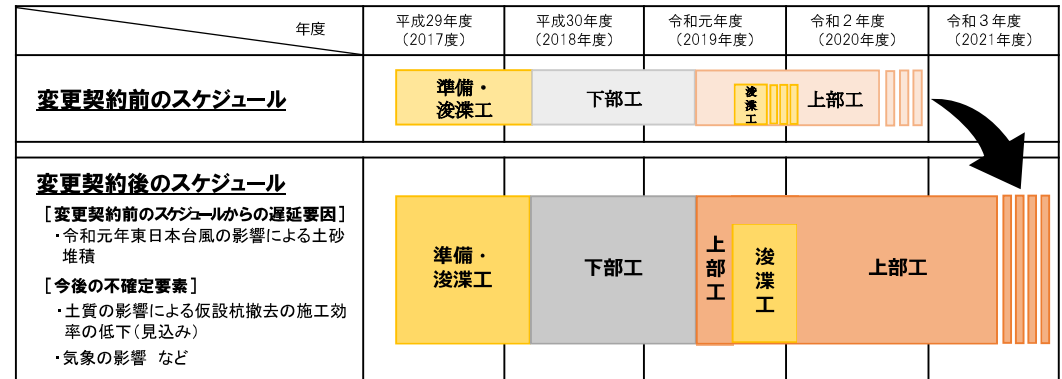

「完成期限の変更」 平成33(2021)年3月31日

⇒ 令和4(2022)年3月31日(1年間の延伸)
