

環境委員会資料

1 令和5年第3回定例会提出予定議案の説明

(1) 議案第107号

東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の変更
について

資料 東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の変更について

港 湾 局

(令和5年6月7日)

東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の変更について

1. 工事概要

工事名：東扇島コンテナ関連施設整備工事

履行場所：川崎市川崎区東扇島93番地内

受注者：重田造園・重田・大恵共同企業体

工期：令和3年12月20日～令和5年9月29日

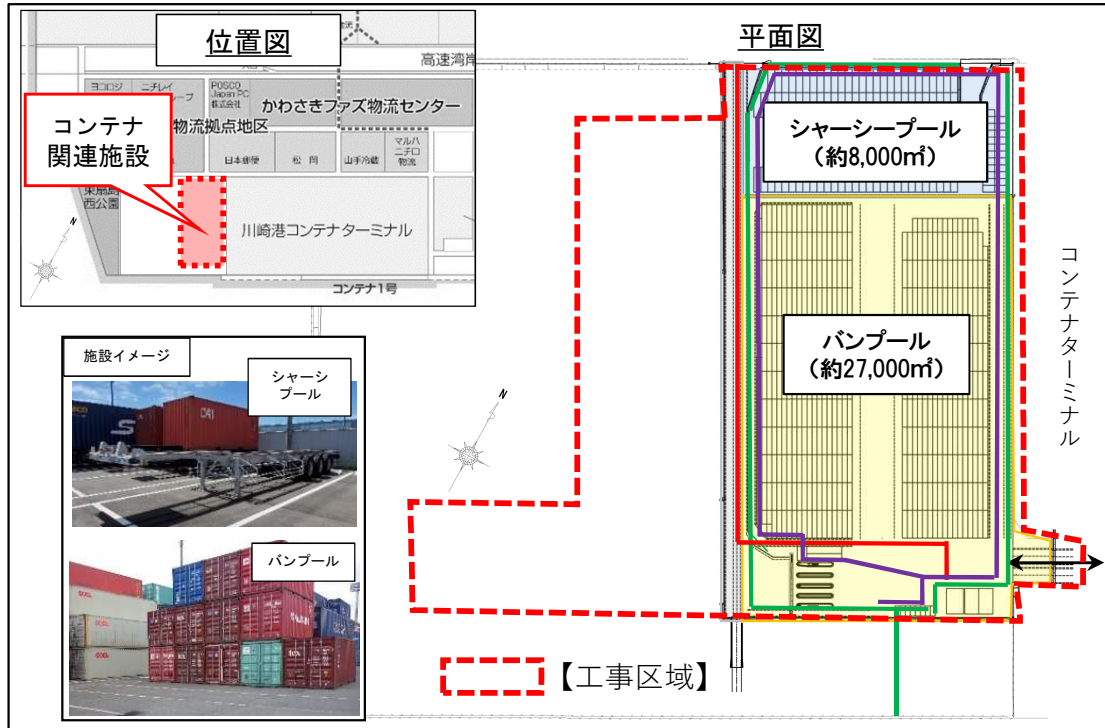


図1 位置図・平面図

2. 契約の経過

項目	日付	上段：増減額【税込】 下段：契約額【税込】	変更理由
当初契約	令和3年12月20日	894,773,000円	
第1回変更契約	令和5年3月3日	+49,546,200円 944,319,200円	施工計画の検討、調整の結果、土工等の数量が増加したため、契約金額の変更を行うもの
第2回変更契約		+50,860,700円 995,179,900円	コンテナ車両の動線等について、コンテナターミナル利用者と協議した結果、舗装構成等を見直す必要が生じたことから、数量等の変更を行うもの

3. 変更契約の概要

(1) 第1回変更契約【報告第13号】

- ・当初、工事区域内の利用者の協力を得て、移転しながら工事を進めることを想定していた。
- ・しかし、本工事契約後、利用者・請負業者と施工計画について検討・調整した結果、利用場所の移転が想定以上に困難であったため、段階的に工事を進める必要が生じたことから、土工等が増工となった。

(2) 第2回変更契約

- ・バンプールおよびコンテナターミナルを往来するコンテナ車両の動線等について、コンテナターミナル利用者と協議を深めた結果、施設内の舗装構成を一部、変更する必要が生じたため、舗装工等が増工となる。



図2 施設動線図

4. 今後のスケジュール

		令和3年度	令和4年度							令和5年度							備考	
		12月	...	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月
土木工事	シャシープール			完成														供用中
	バンプール																	施工中
