

施工場所




施工方法①

①止水柵設置（掘削・H鋼打設）

前橋下流側右岸施工

R 7 年 5 月下旬～7 月上旬

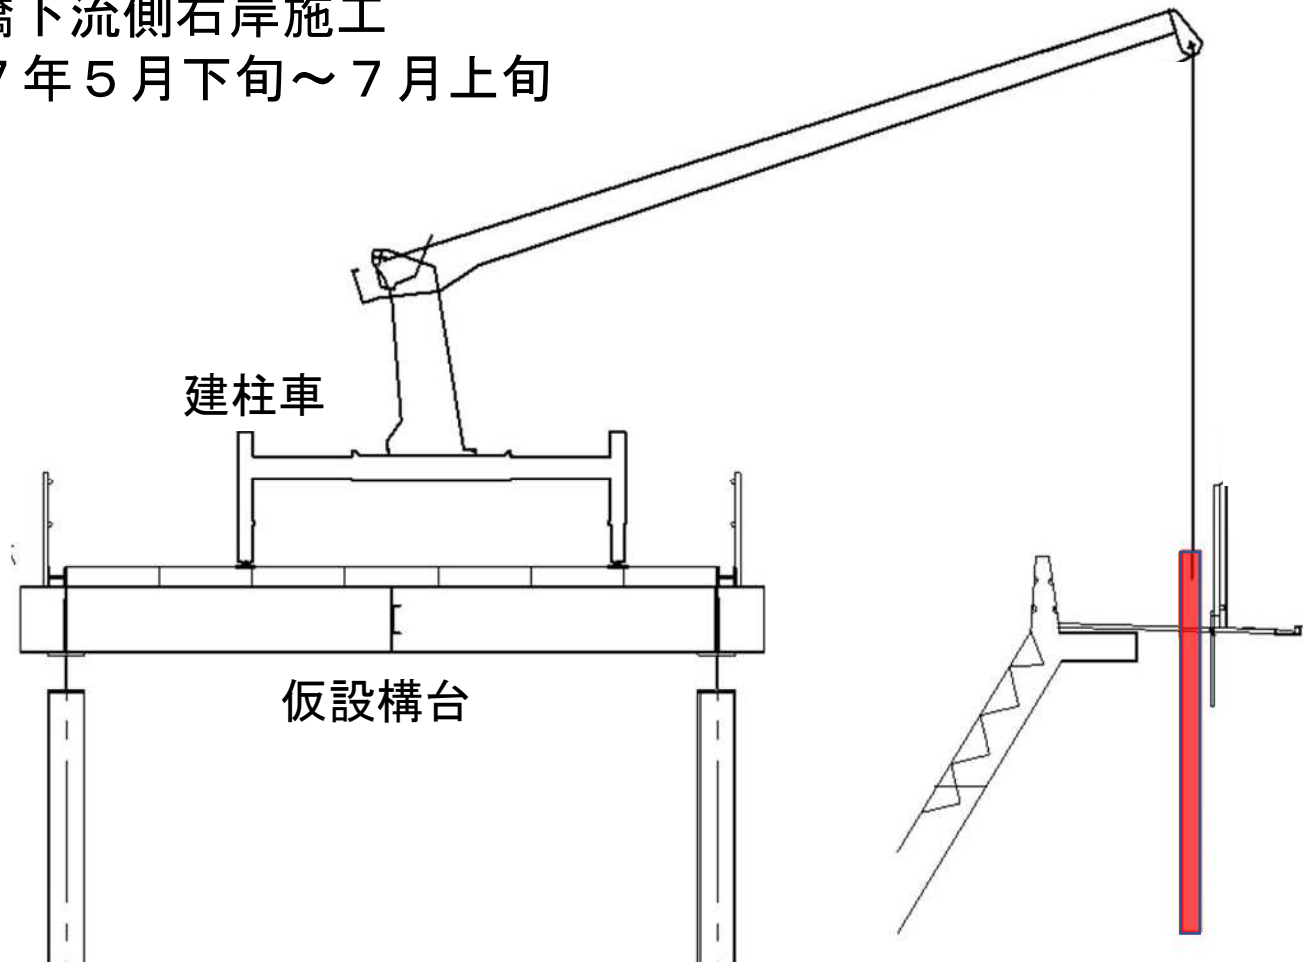


右岸に止水柵の設置をするために、掘削・H鋼打設をします。

施工方法②

②構造物取壊し工

前橋下流側右岸施工

R7年7月上旬～8月上旬

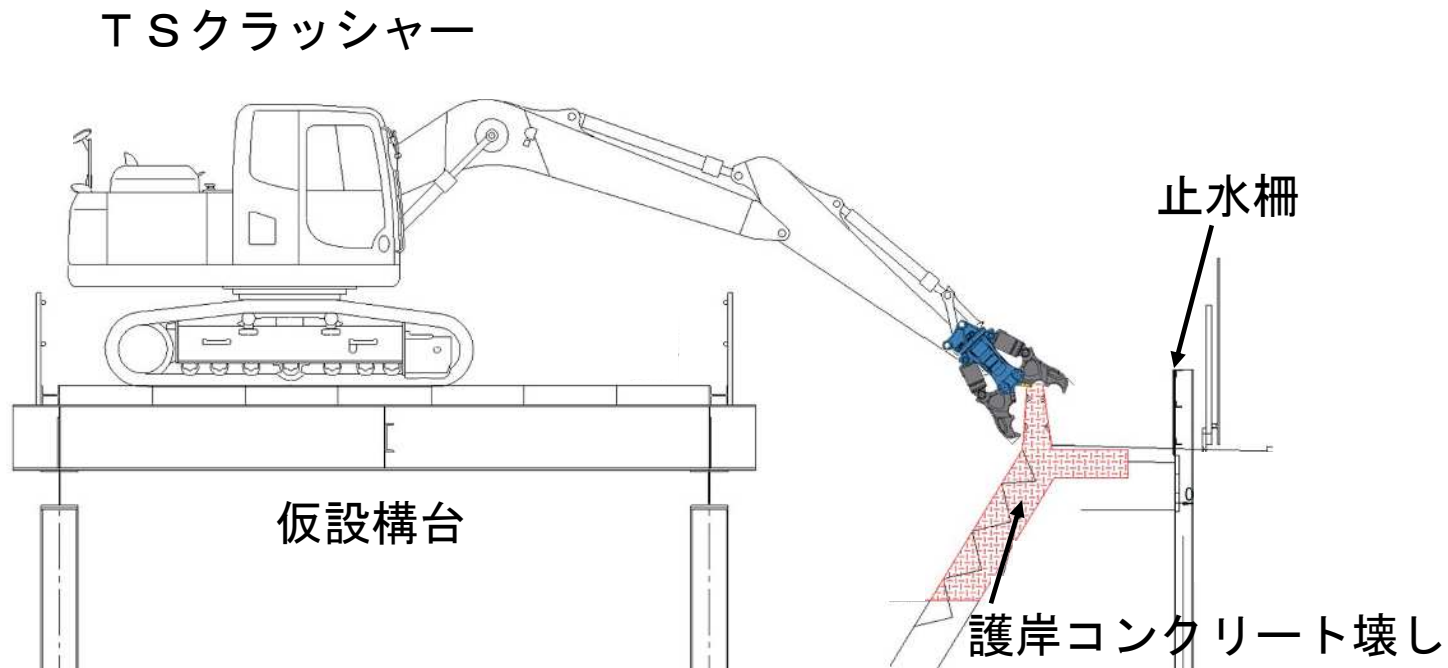


右岸の護岸の一部を解体・撤去します。

施工方法③

③鋼管杭護岸工

前橋下流側右岸施工

R 7 年 8 月中旬～ 1 2 月下旬

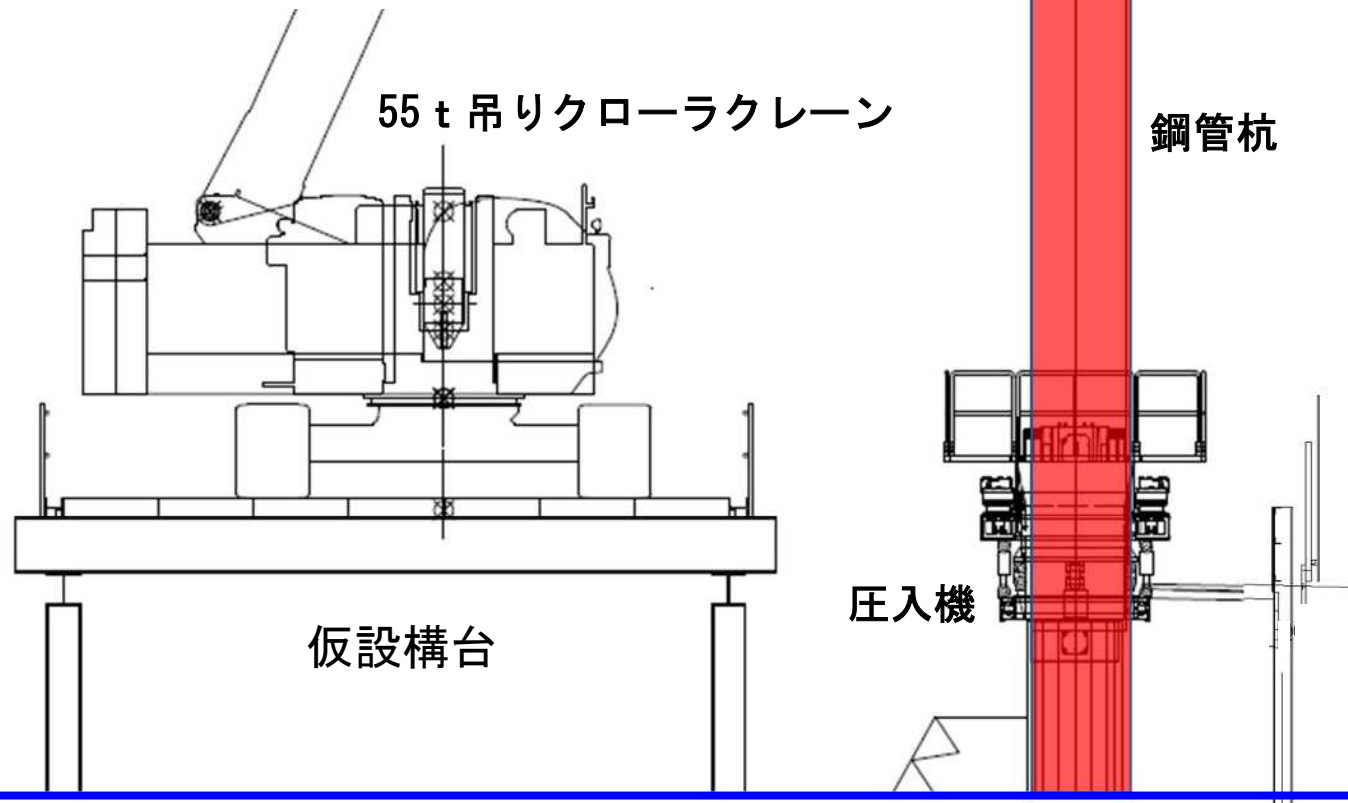

右岸に鋼管杭を回転圧入します。

工事スケジュール

工 種	令和 7 年										令和 8 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工	施工計画												
・ 掘削工			掘削										
・ 止水柵設置			止水柵設置										
・ 構造物取壊し工				既設護岸天端取壊し									
・ 鋼管杭護岸工					鋼管杭回転圧入								
・ 埋戻し										埋戻し			
・ 止水柵盛替										止水柵盛替			
・ 道路付帯工										アスファルト舗装工			
片付工												片付け	
規制帯			長期休暇中（夏期休暇・年末年始休暇）は前橋を通行できるように対応いたします										
			前橋通行止め										
			前橋一時通行止め										
			前橋通行止め										
			前橋下流側右岸 車両通行止め（歩行者・自転車を除く）										
			左岸車両通行止め（歩行者・自転車を除く） 左岸側 釈迦堂橋～上作延第二市営住宅出入口ゲート前まで										

越水対策

護岸撤去前



止水柵・土留設置時



鋼管杭圧入時



止水柵盛替時




通行止め区間 作業日 8:00~17:00 交通誘導員配置



迂回路

- ① 釈迦堂橋～仮設構台ヤード出入口間左岸 車両通行止め(歩行者・自転車を除く)
- ② 前橋下流側右岸 車両通行止め(歩行者・自転車を除く)
- ③ 前橋部 通行止め(歩行者・自転車を除く)
- ④ 前橋部 一時通行止め(前橋部でのクレーンの資機材揚重時は通行止め)

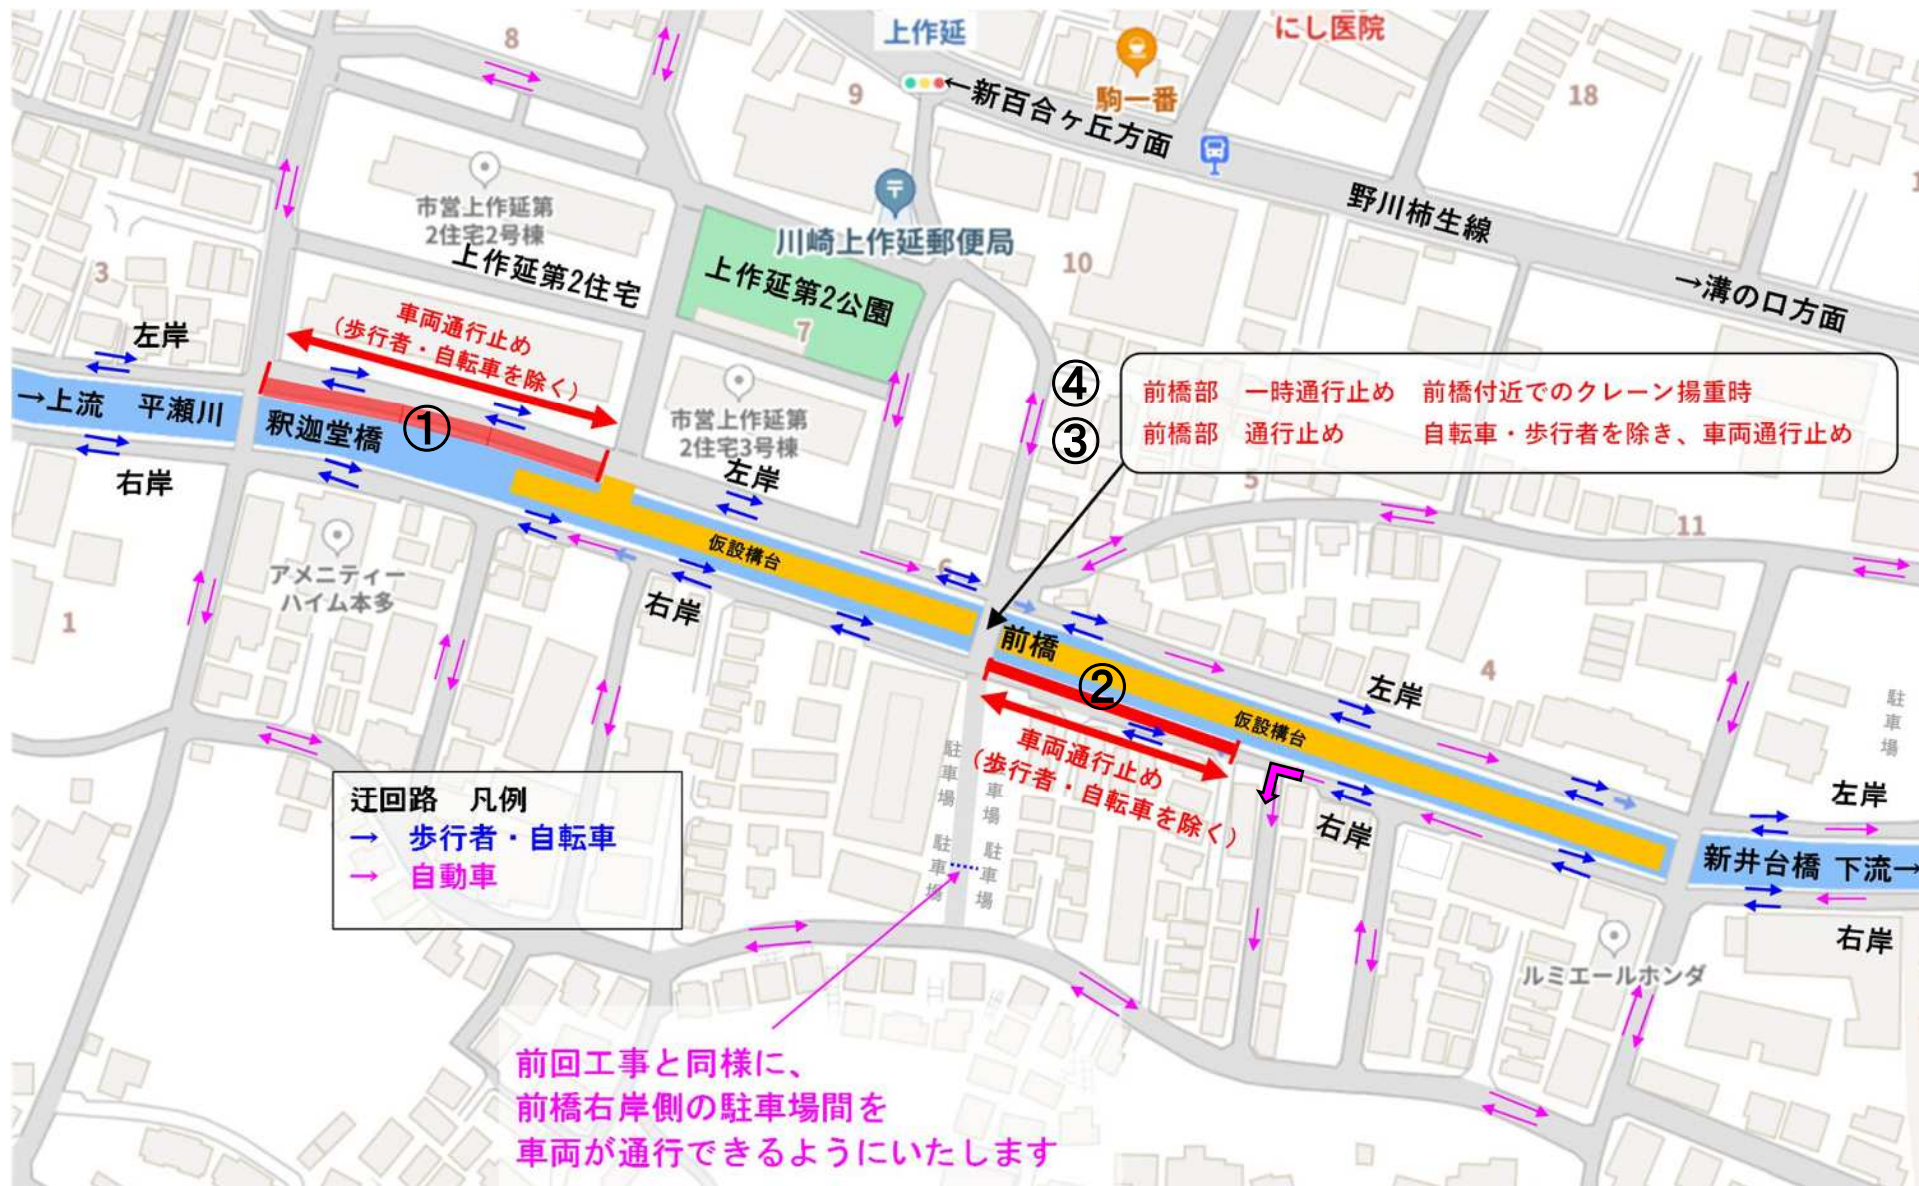

駐車場移動対象と仮駐車場

