

令和元年11月20日

建設緑政局関係議案資料 (その8)

議案第187号

令和元年度川崎市一般会計補正予算

建設緑政局

令和元年台風第19号による補正予算対応について

1 台風第19号による建設緑政局関係の概算被害額

(令和元年1月20日現在)

- 道路 約11億円
・道路・側溝の清掃、堆積土砂の撤去・処分費用など
- 河川 約46億円
・羽田連絡道路における多摩川の河川内の土砂浚渫費用
・多摩川緑地における堆積土砂の撤去・処分費用、
グラウンド復旧費用、河川施設の復旧費用など
- 公園 約5,000万円
・倒木した樹木等の処分費用など

合計 約57億5,000万円

2 復旧に向けた財政措置の考え方

建設緑政局関係の被害については、復旧に多額の費用を要することや、財源措置について調整を要することから、令和元年度補正予算または令和2年度当初予算で対応する。

- 速やかな復旧に向け、スピード重視で対応するもの
令和元年度補正予算での対応
- 復旧にあたり、事業完了が令和2年度にわたるもの
令和元年度補正予算における債務負担行為の設定で対応
- 復旧にあたり、令和2年度の予算措置が必要なもの
令和2年度当初予算での対応
※現在、関係局と調整中

3 復旧に向けた財源の考え方

- 事業費の全額を起債できる「災害復旧事業債」を財源として活用
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の規定に基づく災害復旧事業については、国に負担又は補助を求める。
※現在、調整中
- 災害復旧事業債や公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の対象とならない事業（工事施行中に被災した場合など）については、別途、充当可能な国庫補助・市債等を財源として活用する
※現在、調整中

4 補正予算（その1）について

(1) 補正予算（その1）の総括（建設緑政局関係）

(単位 千円)

	補正前	補正額	うち台風関係	計
建設緑政費	29,672,809	616,808	612,000	30,289,617
区役所費	14,491,081	1,074,360	1,072,000	15,565,441
合計	44,163,890	1,691,168	1,684,000	45,855,058

(2) 補正予算（その1）の概要（建設緑政局関係）

(単位 千円)

事業名	事業費	特定財源	一般財源	補正内容
道路照明灯整備事業費	6,000	市債 6,000	0	新丸子東地下通路照明設備の補修費用を計上する。
五反田川放水路整備事業費	9,000	市債 9,000	0	五反田川放水路放流部付近にある、稲田多摩川公園暫定広場の復旧費用を計上する。
河川維持補修事業費	46,000	市債 46,000	0	二ヶ領用水取水口や上河原堰堤などの河川施設の復旧費用を計上する。
大小公園整備事業費	5,000	市債 5,000	0	夢見ヶ崎動物公園施設の補修費用を計上する。
多摩川緑地維持管理事業費	546,000	市債 546,000	0	多摩川緑地の復旧費用（堆積土砂の撤去・処分、グラウンド補修など）を計上する。
道路維持補修事業費	1,033,000	市債 1,033,000	0	堆積土砂の撤去・処分費用、業者による緊急対応費用などの復旧費用を計上する。
水路整備事業費	1,000	市債 1,000	0	樹木の処分費用などの復旧費用を計上する。
公園緑地維持管理事業費	38,000	市債 38,000	0	樹木の処分費用などの復旧費用を計上する。
合計	1,684,000	市債 1,684,000	0	

(3) 債務負担行為補正

(単位 千円)

事項	期間	限度額	内容
羽田連絡道路整備事業費	令和元年度～令和2年度	3,000,000	多摩川の河川内に土砂が堆積したため、必要となる浚渫費用等を計上する。
多摩川緑地維持管理事業費（災害復旧工事分）	令和2年度	376,000	多摩川緑地の復旧費用（堆積土砂の撤去・処分、グラウンド補修など）を計上する。
駅前広場等維持補修事業費	令和元年度～令和2年度	60,000	新丸子東地下通路のエレベーター設備の補修費用を計上する。

羽田連絡道路の補正予算対応について

1 羽田連絡道路の進捗状況

架設前（B4ベントーP4橋脚）全景



橋桁架設完了




橋桁架設状況



2 令和元年台風第19号による工事への影響

多摩川河口部へ大量の土砂が流入し、航路や工事エリアに土砂が堆積したため、河川内工事を行うためには、浚渫が必要な状況

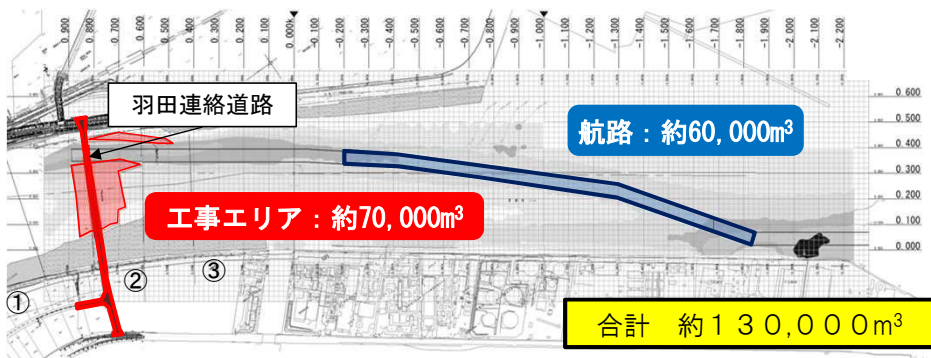

① 川崎側、上流から望む



② 川崎側、架橋位置から望む



③ 川崎側、下流から望む

3 工事の増額予定

土砂堆積に伴う工事費の増額 3,000百万円（うち市負担額 550百万円）

項目	概要
土砂堆積に伴う 工事費の増額 [3,000百万円]	<p>○気象や河川環境の影響に伴う工事実施のための維持浚渫の増工等</p>  <p>浚渫イメージ</p>  <p>浮島土砂投入状況</p>

4 補正予算対応

年度	令和元年度	令和2年度
予算額（第4回定例会 補正予算）	3,060百万円	5,564百万円
土砂堆積に伴う工事費の増額	0	3,000百万円
合計	3,060百万円	8,564百万円

※執行予定額 約28,225百万円（うち市負担額 約6,220百万円）

5 今後の予定

- 令和元年度補正予算における債務負担行為の設定（令和元年 第5回定例会 議案提出）
- 工事請負契約の変更（令和2年 第1回定例会 議案提出予定）

年度	令和元年度				令和2年度				
	6	9	12	3	6	9	12	3	
工程	施工工程（変更前）	下部工		上部工					
	施工工程（変更後）	下部工	上部工	浚渫		上部工			
工事進捗に伴う変更	○補正予算（第4回定例会） ○工事請負契約の変更（第5回定例会）								
台風第19号に伴う変更	○補正予算（第5回定例会） ○工事請負契約の変更（第1回定例会）								

多摩川緑地の補正予算対応について

1 令和元年台風第19号による多摩川緑地の被害状況

- マラソンコース：約10km
土砂堆積約2,600m³ 路面剥離約50,000m²
- サイクリングコース
多摩区布田 ピクニック橋坂路法尻流出（通行止め）
- 多摩川緑地27地区(占用面積：約847,000m²)
土砂堆積約27,000m³ ごみ堆積約670m³
運動施設等施設破損（グラウンド表土・基盤流出、バックネット等施設破損）
パークボール場使用停止、バーベキュー広場使用停止
※運動施設等計39施設
一般野球場（13施設）、少年野球場（10施設）、サッカー場（3施設）、
運動場（8施設）、多目的広場（4施設）、陸上競技場（1施設）

2 被害への対応状況

可及的速やかな復旧に向け、既存の予算枠などを活用し、マラソンコースから順次土砂の撤去等の災害復旧緊急工事を実施中



① 北見方地区 ② 丸子橋地区 ③ 古市場地区

3 補正予算対応

本復旧に向けた土砂堆積処分、グラウンド補修（流出土補充）などを行う災害復旧工事については、復旧に多額の費用を要し、事業完了も令和2年度になることから、令和元年度補正予算で対応する。

事業名	令和元年度	令和2年度	財源
多摩川緑地維持管理事業費 (災害復旧工事分)	546,000千円	376,000千円 債務負担行為	災害復旧事業債 922,000千円

※サッカー場のダスト補修、野球場グラウンド整備、ネットなどの施設復旧などの工事については、令和2年度当初予算での対応で調整中

4 今後の予定

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
緊急補修工事	← 緊急工事 →																	
災害復旧工事 令和元年度予算(補正予算)							← 復旧工事 →											
災害復旧工事(債務負担) 令和2年度予算(10月末まで)				← 設計	← 契約準備													
施設復旧工事 工期 令和2年11月～令和3年3月末まで										← 国と調整	← 設計	← 契約準備						← 施設復旧工事 →



多摩川緑地位置図

■ 多摩川緑地
■ 公園・緑地
