

等々力硬式野球場改築設計業務  
指名型プロポーザル説明書

平成25年10月  
川崎市まちづくり局施設整備部

- 1 件名 等々力硬式野球場改築設計業務指名型プロポーザル
- 2 業務の内容 別紙1 業務説明資料のとおり
- 3 質問書（様式-1）の提出  
本書等の内容について疑義のある場合は、次により質問書を提出してください。なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
  - (1) 提出期限 平成 25 年 10 月 23 日（水） 正午まで 必着
  - (2) 提出先 事務局：川崎市まちづくり局施設整備部施設計画課  
**メールアドレス： 50sisetu@city.kawasaki.jp**
  - (3) 提出方法 様式-1 に記入のうえ電子メールの添付ファイル（Microsoft Word2003 形式及び PDF 形式（社印入））として事務局に送信してください。また、事務局より着信を確認した旨をメールにて返送するので、それにより着信を確認してください。
  - (4) 回答方法 提出された質問及び回答は平成 25 年 10 月 28 日（月）より次のホームページに掲載いたします。  
**<http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-5-1-0-0-0-0-0-0-0.html>**
- 4 技術提案書の内容
  - (1) 技術提案書は、別添の所定の書式（様式-2～6）に基づき作成するものとします。なお、所定の書式以外の使用は認めません。
  - (2) 提案にあたっては、次の項目に関する事項を所定の様式に記載してください。
    - ア 管理技術者の経歴及び業務実績等について（様式-3）
    - イ 担当技術者（意匠、構造、電気設備、機械設備）の経歴及び業務実績等について（様式-4）
    - ウ 業務の実施方針及び業務の実施手法について（様式-5）
    - エ 課題に対する提案について（様式-6）
  - (3) 配置予定技術者の条件は次のとおりとします。
    - ア 予定技術者の要件  
管理技術者：一級建築士で5年以上の業務経験のあるもの。
    - イ 予定技術者に必要とされる業務の実績
      - (ア) 管理技術者は、次に示す業務の実績を2件以上有するものとします。
        - ・収容人員 10,000 人以上の屋外運動施設の新築、改築の設計業務
      - (イ) 担当技術者は、次に示す業務の実績を有するものとします。
        - ・収容人員 10,000 人以上の屋外運動施設の新築、改築の設計又は設計補助業務
    - ウ 手持ち業務量  
委託期間中（平成 25 年 12 月 ～ 平成 27 年 3 月）の手持ち業務量  
管理技術者：20,000 千円以上の業務が5件未満である者  
担当技術者：20,000 千円以上の業務が2件未満である者
  - (4) 様式-3（管理技術者の経歴及び業務実績等）の作成にあたっては、次の事項に留意してください。
    - ア 文字は注記等を除き原則として10ポイント程度以上の大きさとし、記入欄の大きさについては適宜調整してください。また、写真や図版等の記載は不可とします。
    - イ 業務実績の記載件数は、3件までとします。
    - ウ 業務実績として記載できるものは、設計業務完了から10年以内のものとしてください。
    - エ 実績は管理技術者又は担当技術者として関わったプロジェクト等について記入してください。なお、プロジェクト等については、現在の会社での実績のみを記入してください。

- (5) 様式-4（担当技術者の経歴及び業務実績等）の作成にあたっては、次の事項に留意してください。
- ア 担当技術者の役割（意匠、構造、電気設備、機械設備）ごとに作成してください。
  - イ 文字は注記等を除き原則として10ポイント程度以上の大きさとし、記入欄の大きさについては適宜調整してください。また、写真や図版の記載は不可とします。
  - ウ 業務実績の記載件数は、3件までとします。
  - エ 業務実績として記載できるものは、設計業務完了から10年以内のものとしてください。
  - オ 実績は管理技術者又は担当技術者として関わったプロジェクト等について記入してください。なお、プロジェクト等については、現在の会社での実績のみを記入してください。
- (6) 様式-5（業務の実施方針及び業務の実施手法）の作成にあたっては、次の事項に留意してください。
- ア 文字は注記等を除き原則として10ポイント程度以上の大きさとし、所定の様式に収まる範囲で記述してください。枚数は1枚とします。ただし、枠の大きさについては適宜調整してかまいません。
  - イ 記入にあたっては、要点を明確にし、簡潔に記述してください。
  - ウ 多色刷りを可とします。
- (7) 様式-6（課題に対する提案）には、次の課題に関する提案を記載してください。

**課題1：「公園と施設との一体的利用等について」**

硬式野球場周囲には園路、広場、運動施設や児童遊園などがあり、試合観戦・スポーツ練習のほか、散歩・お祭り・子どもの遊びなど、緑地全体は多くの来園者に利用されています。

つきましては、平日及び休日（試合・大会開催時を含む）の緑地の利用特性を踏まえ、外野スタンド・デッキ下やバックスクリーン裏側の空間を活用するなど、公園と施設の一体利用が図られるような施設計画を、具体的に提案してください。

※「等々力硬式野球場整備計画」の「3 硬式野球場整備の平面計画イメージ」や「参考資料 ②野球場平面計画イメージ」を参考にして提案してください。

**課題2：「環境に配慮した施設計画について」**

本施設は緑地内の施設であることと併せ市内唯一の硬式野球場であり、年間を通して昼夜共に高い利用状況となっています。また、公共建築物においては、エネルギー消費量の低減を図るなど、環境保全性能の高い建築物の実現が強く求められています。

つきましては、環境負荷低減に配慮すると共に、公園利用者に対して環境への取組の普及啓発となる施設計画について、費用対効果や実効性を考慮の上、具体的に提案してください。

作成にあたっては、次の事項に留意してください。

- ア 提案は、考え方を文書で簡潔に記述してください。
- イ 文書を補完するため最小限のイメージ図・イラスト等の使用を可とします。
- ウ 文字は注記等を除き原則として10ポイント程度以上の大きさとし、所定の様式（A4サイズ、タテ）に収まる範囲で記述してください。ただし、枠の大きさについては適宜調整してかまいません。
- エ 多色刷りを可とします。
- オ 課題1、課題2に対する提案を1枚（A3サイズ、ヨコ）にまとめてください。

## 5 技術提案書の提出

### (1) 技術提案書の提出

- ア 提出部数 (様式-2) 1部、(様式-3~6) 12部 (クリップ留め)、PDFデータ 1部
- イ 提出先 3(2)と同じ
- ウ 提出期限 平成25年11月15日(金)正午まで 必着 (開庁日及び時間外を除く)
- エ 提出方法 持参又は郵送 (郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。  
PDFデータは、電子メール又はCD-ROMにて提出ください。

### (2) その他

所定の様式以外の書類については受理しません。

提出期限までに提出されない場合は辞退したものとみなします。また、貴社が辞退した場合でも、貴社が不利益な扱いを受けることはありません。

## 6 プロポーザル選定委員会

技術提案書に関する審議及び当該業務に最も適した提案者の特定は、次に示す委員会で行います。

名 称	等々力硬式野球場改築設計業務指名型プロポーザル選定委員会	
所掌事務	技術提案書の評価及び特定に関すること	
委 員	委員長	毛塚 尚男 (まちづくり局施設整備部長)
	副委員長	降屋 力 (まちづくり局施設整備部調整・支援担当課長)
	委員	稲本 一朗 (まちづくり局施設整備部大規模施設建設担当課長)
	委員	濱見 健 (建設緑政局等々力緑地再編整備室長)
	委員	鈴木 直仁 (建設緑政局緑政部長)

## 7 選定方針

本プロポーザルの審査は、二段階審査方式で行います。

一次審査は、「技術提案書(様式-3~6)」により評価し、原則として上位5者を選定します。

二次審査は、一次審査にて選定された提案者による提案内容の説明及びプロポーザル選定委員からの質疑応答を行い、本設計業務に適した最優秀者を特定します。

## 8 二次審査

次により、二次審査を行います。

- (1) 実施日時 平成25年12月3日(火)午前
- (2) 実施場所 明治安田生命ビル 13階 会議室  
川崎市川崎区宮本町1番地
- (3) 出席者 管理技術者1名(必須)、担当技術者2名までとし計3名以下としてください。
- (4) その他 時間等詳細については11月25日(月)午後にお知らせします。  
使用する説明資料は、提出された技術提案書のみとし、新たな説明資料を追加することはできません。また、パワーポイントや拡大したパネルなどの使用はできません。

## 9 評価項目

別紙2 「指名型プロポーザル技術提案書評価基準」に掲げる評価項目について、評価を行います。

## 10 その他

- (1) 技術提案書の作成及び提出等に係る費用は貴社の負担とします。
- (2) 無効となる技術提案書、失格となる提案者
  - ア 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
  - イ 本書に指定する技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。

- ウ 技術提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
- エ 技術提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
- オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
- カ 虚偽の内容が記載されているもの。
- キ 本プロポーザル方式による設計者選定に関して選定委員会との接触があった者。
- ク 二次審査に出席しなかった者。

(3) 特定結果の通知

技術提案書を提出した者のうち、当該業務に最も適した提案者として特定された者及び特定されなかった者に対して、書面により結果を通知します。なお、特定された場合であっても、提案内容の履行を保証するものではありません。

(4) 手続において使用する言語及び通貨

- ア 言語 日本語
- イ 通貨 日本国通貨

(5) 契約書作成の要否

要する。

(6) 技術提案書の取扱い

- ア 本プロポーザルにおいて提出された書類は返却しません。また、川崎市は、この書類を保存、記録及び公表する権利を有するものとし、使用料等は無償とします。
- イ 技術提案書の提出後、川崎市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。

(7) その他

- ア 技術提案書に記載した管理技術者及び担当技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできません。
- イ 技術提案書の作成のために川崎市において作成された資料は、川崎市の了解なく公表、使用することはできません。
- ウ 本プロポーザル方式による設計者選定は、受託者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。
- エ 技術提案書の提出は、1者につき1案のみとします。
- オ 現地説明会は開催しません。なお、独自に現地調査を行う場合は、近隣住民及び施設利用者等に迷惑がかからないよう十分配慮してください。
- カ メールにて送信する添付ファイルの容量は2MBまでとし、2MBを超える場合は、複数に分割して送信するか、LZH形式にて2MB以下に圧縮してから添付し送信してください。
- キ 川崎市は、特定された提案者と、後日、当該業務委託を締結します。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがあります。
- ク 参加意向申出書の提出後契約締結までの手続期間中に指名停止となった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとします。なお、特定された提案者が、参加資格を失った場合には、次順位の者と手続を行います。
- ケ 本業務の概算価格（上限）は約84,000千円（税抜）を予定しています。
- コ 硬式野球場改築工事の概算価格（上限）は約4,000,000千円（税抜）を予定しています。

(別紙1)

## 業務説明資料

本説明書に記載した内容には、本プロポーザル方式による設計者選定のみの設定条件とし、将来の業務（設計）実施の条件となるものではありません。

- 1 件名 等々力硬式野球場改築設計業務
- 2 趣旨・目的 昭和42年に供用を開始し、施設の老朽化、収容人員の拡大、防球対策、施設の機能向上と諸室の整備の課題が指摘されております。  
本業務においては、これらの課題や「等々力硬式野球場整備計画」を踏まえ、緑地の利用特性に応じて公園と施設の一体利用や環境配慮の取組を実現するために、基本・実施設計の中で本施設に必要な機能を適切に配置した建築的な空間構成が重要となります。  
このため、設計者の選定方法を技術提案書に基づいたプロポーザル方式とすることにより、創造性や技術力・問題解決能力に優れた設計者を選定することとします。
- 3 履行期限 契約の日から平成27年3月31日まで
- 4 履行場所 川崎市中原区等々力1番
- 5 業務概要
  - ・等々力硬式野球場改築基本・実施設計及び関係法令・条例手続き等 一式  
(フィールド、スコアボード・照明塔・防球ネットなど屋外付帯施設、設備含む)
  - ・既存建築物の解体撤去工事設計 一式  
(硬式野球場、児童プール、便所、屋内練習場、屋外付帯施設など)
  - ・中央広場基本設計(硬式野球場と陸上競技場の間) 一式
- 6 条件・仕様
  - (1) 地域地区の指定等  
第一種中高層住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率:200%)  
※用途が「観覧場」に該当するため建築基準法第48条の許可が必要で  
第2種高度地区(最高の高さ:15m)  
※高さが15mを超える場合には都市計画高度地区の許可が必要で  
一団地認定区域  
※等々力緑地全体で一団地認定を受けているため認定が必要で  
等々力緑地  
多摩川風致地区
  - (2) 周辺の状況  
計画敷地は、JR南武線武蔵中原駅の北側約1Kmにある等々力緑地内に位置しています。川崎市の総合公園として、周辺には、催し物広場、とどろきアリーナ、市民ミュージアム、多目的広場、陸上競技場、釣池、テニスコート、児童遊園など様々な公園施設が立地し、Jリーグの開催時などは1~2万人の来場者が見込まれる状況となっています。  
緑地内の使いながら工事となるため、安全に配慮した建築計画・施工計画が求められます。
  - (3) 敷地面積  
計画敷地 約60,000㎡(基本設計時における中央広場含む)  
約45,000㎡(実施設計時における外構まで)  
※計画敷地の範囲はP7参照

(4) 敷地の状況

計画敷地は、南側外周道路との高低差は3mとなっており、緑地の中央に位置しております。

(5) 延べ面積

等々力硬式野球場 内野・外野スタンド 11,300 m<sup>2</sup>程度  
フィールド 13,500 m<sup>2</sup>程度

(6) 施設機能

「等々力硬式野球場整備計画」に基づく

7 事業工程（予定）

・平成25年12月～平成27年3月	設計業務 平成26年3月 野球場改築基本設計期限 中央広場基本設計期限 平成27年1月 野球場改築実施設計期限 関係法令・条例手続き着手期限 既存建築物の解体撤去工事設計期限
・平成27年9月～平成28年3月	既存建築物解体撤去工事
・平成28年4月～平成30年3月	等々力硬式野球場改築工事
・平成30年4月	施設供用開始

8 参考資料


- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ①等々力硬式野球場整備計画（平成25年3月策定）      | P9-12  |
| ②野球場平面計画イメージ                  | P13-15 |
| ③野球場周辺整備イメージ                  | P16    |
| ④硬式野球場・陸上競技場・催し物広場（周辺施設）の利用実績 | P17    |

※①は、川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室より平成25年3月に公表されたものと同じです。

URL <http://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000046870.html>

(計画敷地の範囲)

### 基本設計

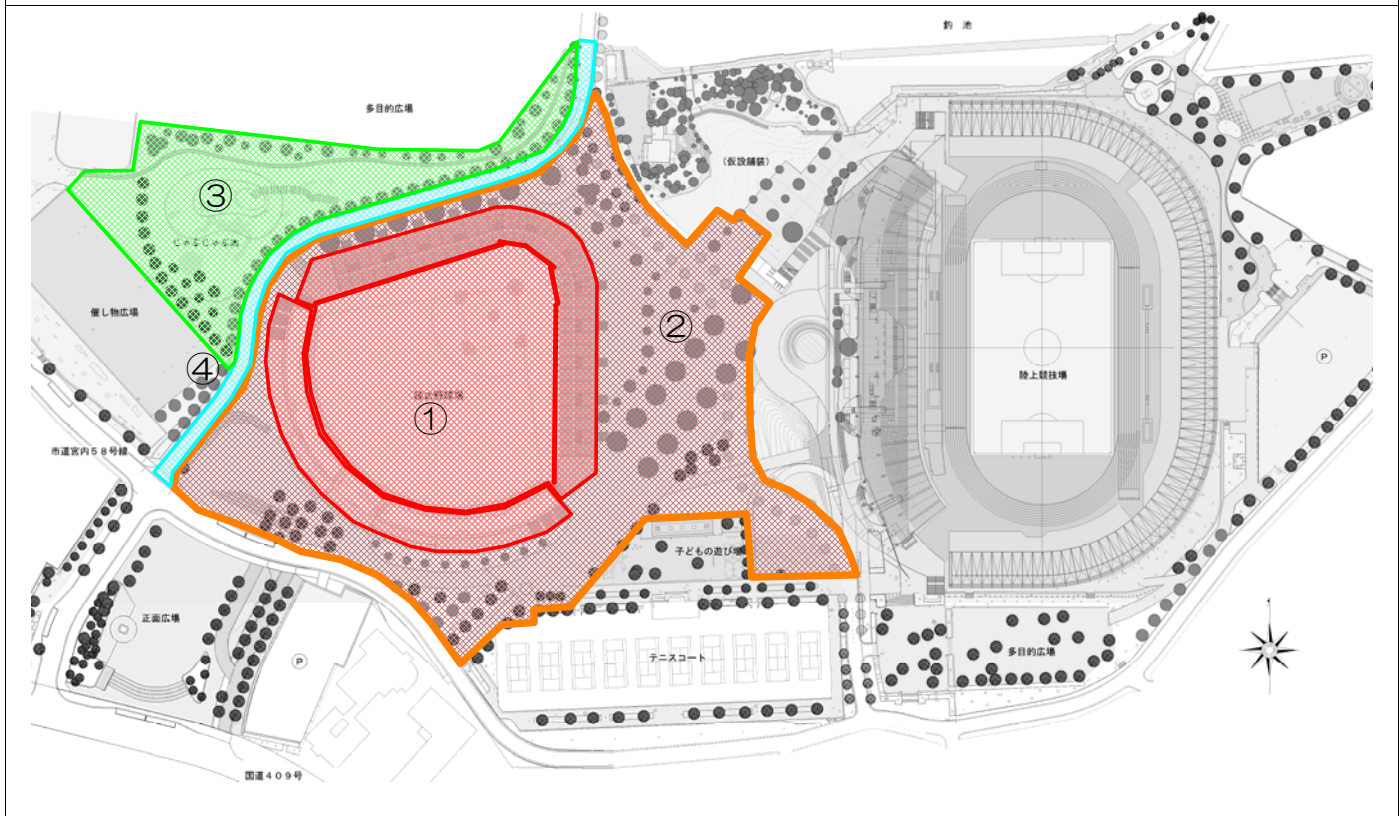


基本設計対象範囲

①野球場内野・外野スタンド ②周辺広場（野球場外構、中央広場）

別途設計

③じゃぶじゃぶ池 ④代替園路

### 実施設計

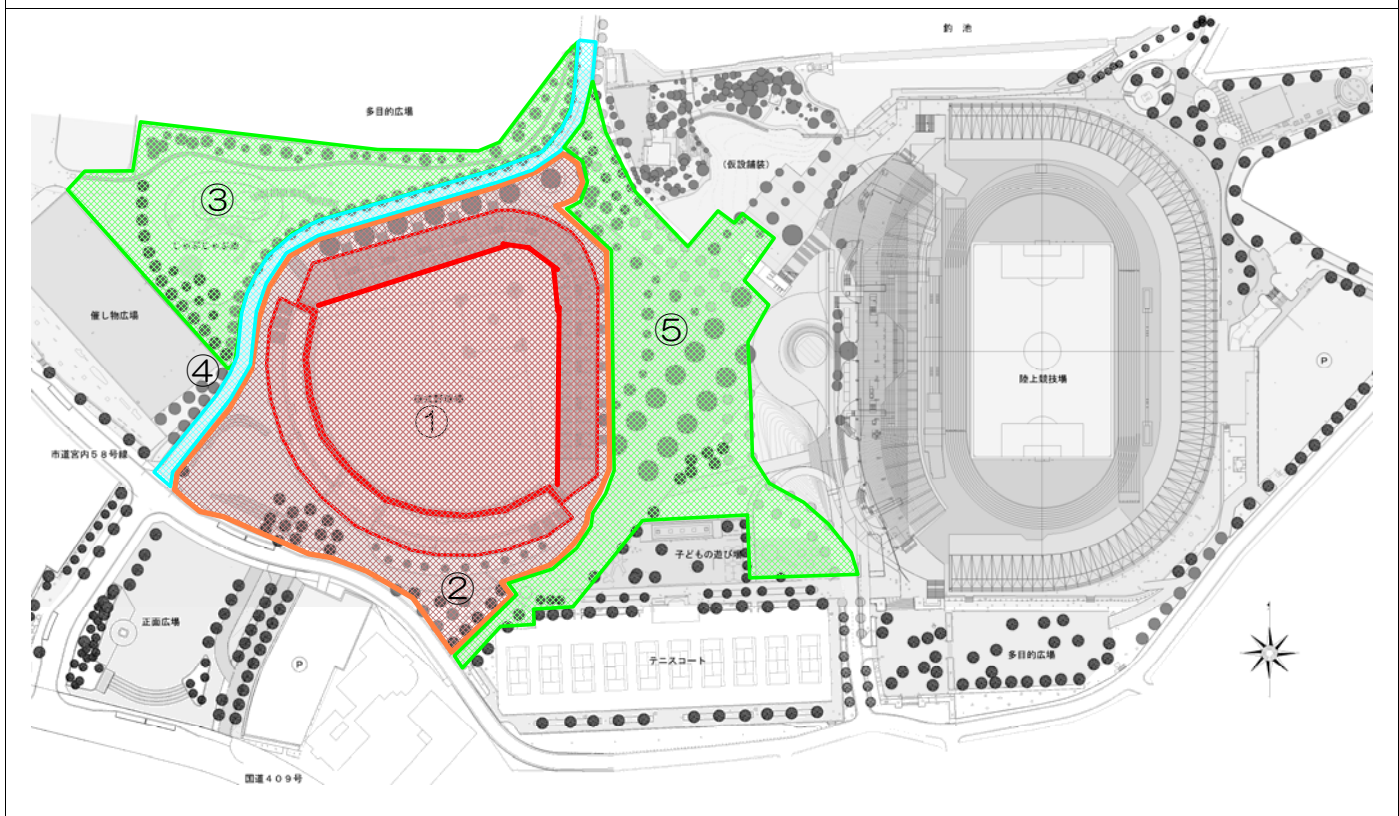

実施設計対象範囲

①野球場内野・外野スタンド ②周辺広場（野球場外構）

別途設計

③じゃぶじゃぶ池 ④代替園路 ⑤中央広場



(別紙2)

## 指名型プロポーザル技術提案書評価基準

### 1 一次審査について（書類審査）

表1における提案内容群について審査し、二次審査を行うもの（二次評価対象者）を5者程度選定する。

### 2 二次審査について（ヒアリング及び総合審査）

二次評価対象者に対するヒアリング及び技術提案書により、表1をもとに総合的に審査し、最優秀者及び優秀者を特定する。

表1 評価項目

評価項目		評価の視点
提案内容群	業務の実施方針・手法	・業務実施方針の妥当性
		・業務実施手法の妥当性
	課題に対する提案	◎提案の的確性・実現性
		・提案の独創性
追加項目群	ヒアリング	◎技術力
		◎理解度
		◎取組意欲

◎は、特に重視する項目を示す。

## 2 評価方法

### (1) 一次審査

- a. 各プロポーザル選定委員による投票にて、二次審査対象者を5者程度選定する。
- b. 各プロポーザル選定委員の持ち分4票を投票する（1提案者につき1票）。

### (2) 二次審査

- a. 各プロポーザル選定委員による評価にて、最優秀者及び優秀者を特定する。
- b. 各プロポーザル選定委員は評価の高い順に1位から3位まで3者を選定する。
- c. 1位（3点）、2位（2点）、3位（1点）とし、各プロポーザル選定委員の評価の合計を、各提案者の評価点とする。

- (3) 評価点が同点となった場合は、出席した選定委員の多数決により過半をもって特定する。

1 等々力硬式野球場整備に関するこれまでの経過



等々力緑地については、平成20年10月に学識者やスポーツ関係者、地域の代表者等で構成する「等々力緑地再編整備検討委員会」を設置し、等々力緑地全体のあり方や施設の再編整備について検討を進め、次の計画をとりまとめた。

- (1) 平成21年5月 等々力緑地再編整備基本方針（整備に向けた基本的な考え方）  
整備に向けた基本的な考え方と、基本的な考え方を表現するための5つの方向性をとりまとめている。
- (2) 平成22年2月 等々力緑地再編整備基本構想（公園の基本的な考え方）  
公園全体としての施設機能の充実に向けた整備のあり方をとりまとめ、硬式野球場の整備については、施設の目標と整備の方向をとりまとめている。
- (3) 平成22年10月 等々力緑地再編整備基本計画（再編整備の方向性）  
「基本方針」及び「基本構想」、検討委員会での検討経過を踏まえ、等々力緑地の再編整備の方向性をとりまとめ、硬式野球場など主な施設の整備の方向性についてとりまとめている。
- (4) 平成23年3月 等々力緑地再編整備実施計画（以下「実施計画」という。）  
「実施計画」では、緑地内の緑と水、安心・安全の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再整備の方向とともに、陸上競技場や硬式野球場をはじめとした主要施設の整備の方向と配置、整備手順・スケジュールについてとりまとめている。

「実施計画」における野球場整備の方向

- 硬式野球場は、収容人員は現在 4,000 人で、高校硬式野球の選手層の拡大や技術の向上を目的に昭和42年に供用開始し、高校生による硬式野球の練習や大会、社会人野球の大会、首都大学リーグ、一般の方々の練習・試合などに利用されています。  
施設の老朽化、収容人員の拡大、防球対策、施設の機能向上と諸室の整備などが指摘されていますので、次の方向で整備を進めます。
- ・高校野球や社会人野球の大会開催が可能な硬式野球場として、競技や観戦が円滑かつ安全に行えるよう、**施設の機能向上**、競技者や大会関係者等の**諸室の整備**、**防球対策**等を進めます。
- ・施設規模は、高校野球や社会人野球の大会開催が可能な施設を前提とし、**収容人員1万人程度**とします。
- ・**施設位置**は、正面広場から多摩川へ続く緑の軸線を整備するため、球場周囲の歩行者の通行や待機スペース確保なども考慮しながら、**南東方向へ移動**します。
- ・施設は、日照による守備への影響を考慮し、**本塁側を北東の向き**とします。
- ・**施設の多目的利用**、集約化・複合化・立体化などをめざします。
- ・**備蓄倉庫**やヘリポートの整備など**災害時の機能導入**を検討します。

(5) 平成23年11月 等々力陸上競技場整備計画  
陸上競技場の整備計画において、施設配置と整備イメージ、整備スケジュールについてとりまとめている。

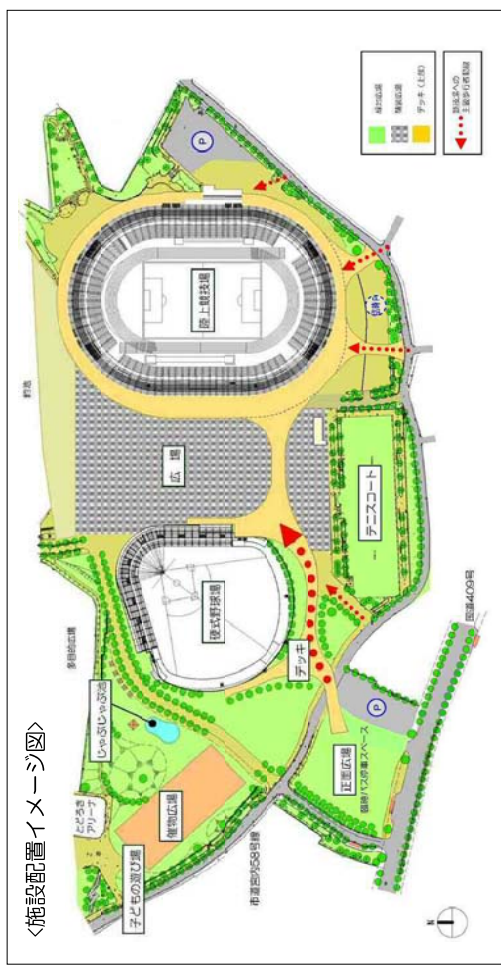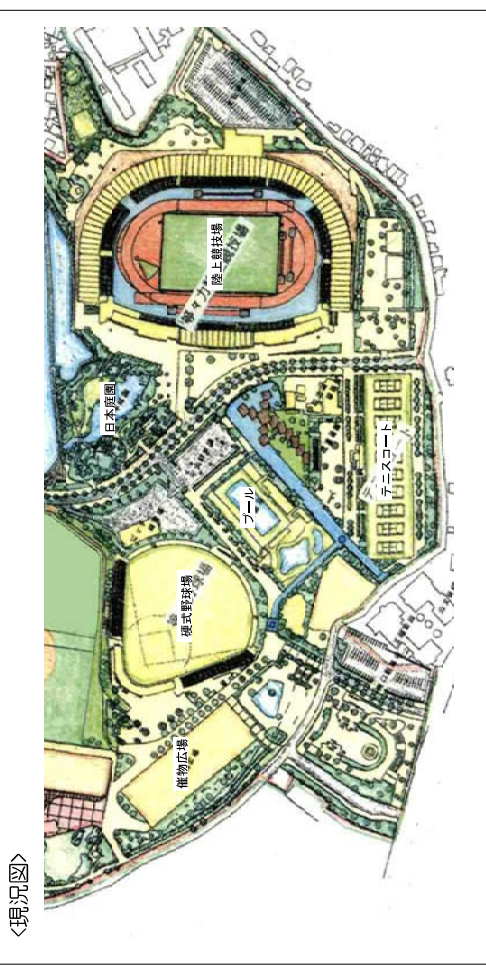

## 2 等々力硬式野球場整備計画

これまでに策定した計画に基づき、野球場の規模や機能などについて、施設を利用する団体や関係者等と調整を図り、野球場整備へ向けた基本的な施設計画についてとりまとめた。

### (1) 整備の基本方針

- ① 川崎市唯一の本格的な硬式野球場として、相應しい機能とグレードを有した施設とする。
- ② 施設位置は南東方向へ移動し、本塁側を北東の向きとする。
- ③ 「等々力緑地」の公園施設として市民に開かれた親しみやすい施設とする。
- ④ 多目的な市民利用ができる施設機能を導入する。
- ⑤ ユニバーサルデザインに配慮した施設とする。
- ⑥ 災害時の救援活動、復旧活動の拠点となりうる施設とする。
- ⑦ 安定的なエネルギー環境に配慮した施設とする。
- ⑧ 民間活力の導入による施設の管理及び運営を考慮した施設とする。

### (2) 施設の基本機能

- #### <フィールド>
- ① フィールド規模は、川崎市唯一の本格的な硬式野球場として、高いレベルの競技が行えるよう両翼 100m、センター122m程度とする。(県内において最大級の広さ)
  - ② フィールド(内外野・ファールグラウンド)は、利用頻度やメンテナンスを考慮し、現在と同様に人工芝とする。

#### <内野スタンド・精室>

- ① 観客の収容人員は1万人程度とし、内野6,000人、外野4,000人程度を収容可能とする。
- ② 快適な試合観戦ができるよう、屋根をバックネット裏観客席の一部に設置する。
- ③ 観客席は、観戦環境向上のため個席とし、一部は応援を考慮しベンチシートとする。
- ④ 大会関係諸室(本部室、役員室、記録放送室等)はバックネット裏1階部分に設置する。
- ⑤ 利用者諸室(更衣室、シャワー、トイレ等)は、大会利用を考慮し1塁側、3塁側にそれぞれ設置する。
- ⑥ 各種大会利用を考慮し、**屋内ブルペン**を1塁側、**3塁側にそれぞれ設置**する。
- ⑦ 現在の室内練習場の機能を確保するため、**打撃練習**も可能な**屋内練習場**を設置する。
- ⑧ 災害時における緊急物資の一時保管場所として、**屋内練習場**を使用可能とする。

### <外野スタンド>

- ① 広く市民利用を図るため、**外野スタンド部分は、芝生席とし、通常時は公園利用者が公園の一部として利用できる**ようにする。
- ② 野球場に隣接して設置を計画しているデッキについては、公園としての景観に配慮するため、**外野スタンドと一体的に整備**する。
- ③ 民間活力の導入による施設の管理及び運営を考慮し、**デッキ下の一部には、インフォメーションセンターやカフェなどの設置**を検討する。
- ④ 硬式野球場の前には、まとまりのある広場を整備することから、**老朽化が進んだ「等々力いこいの家」について外野スタンド公園側への複合化**を図る。

### <設備>


- ① ナイター照明については、硬式野球の公式競技に必要な照度を確保する。
- ② コンコースには、各種大会の開催に対応するため、売店スペースやトイレ、応援者の着替えスペースを設置する。
- ③ 防球ネットは、打球曲線を考慮して設置し、公園利用者の安全を確保する。
- ④ 安定的なエネルギー環境に配慮するため、エネルギーコスト削減に向けた設備を導入する。

### <その他>

- ① 競技者の乗降や荷物の積み下ろしに配慮し、大型バスが寄り付けろーターリ等を設ける。
- ② 多目的な市民利用ができるよう、一般貸し出し用の**会議室や多目的スペース**を設置する。
- ③ 誰もが利用しやすい施設となるよう、多機能トイレの設置やサイン計画など、ユニバーサルデザインに配慮した施設とする。
- ④ 災害復旧活動に必要な資機材等の保管スペースとして**備蓄倉庫**を設置する。
- ⑤ フィールド及び諸室を、災害時の復旧活動等の活動拠点として使用可能とする。
- ⑥ 隣接する広場との一体的利用など、周辺施設と連携を図る施設等を導入する。

### (3) 整備スケジュール

- ・ 既存野球場(プールなど周辺施設含む)は、平成27年のシーズンオフより解体に着手する。
- ・ 改築整備は2カ年で行い、平成30年4月の供用開始をめざす。

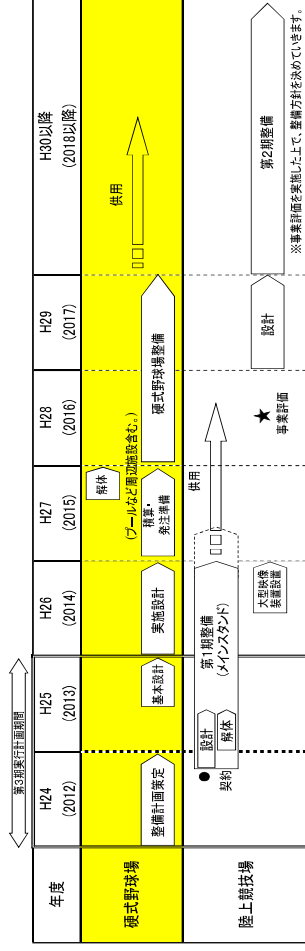

◆スケジュールは、次期実行計画と調整を図っていきます。



### 3 硬式野球場整備の平面計画イメージ

既存施設概要	
フィールド	面積：11,546㎡ (人工芝) センター：120m 両翼：93m
スタンド	コンクリート造 スタンド 土壁スタンド 内野スタンド 外野スタンド 観客収容人数 夜間照明 屋内練習場
	2,038㎡ 492㎡ 3,000人 1,000人 4,000人 内野：400㎡ 外野：200㎡ 球場外

計画施設概要	
面積	約13,500㎡ (人工芝)
センター	約122m 両翼：100m
スタンド	約9,000㎡ 約2,300㎡
観客収容人数	約6,000人 約4,000人
内野	約1,500㎡ 外野：800㎡ スタンド内

等々力こいの家・  
備蓄倉庫等

インフォメーションセンター・  
カフェ・多目的スペース等

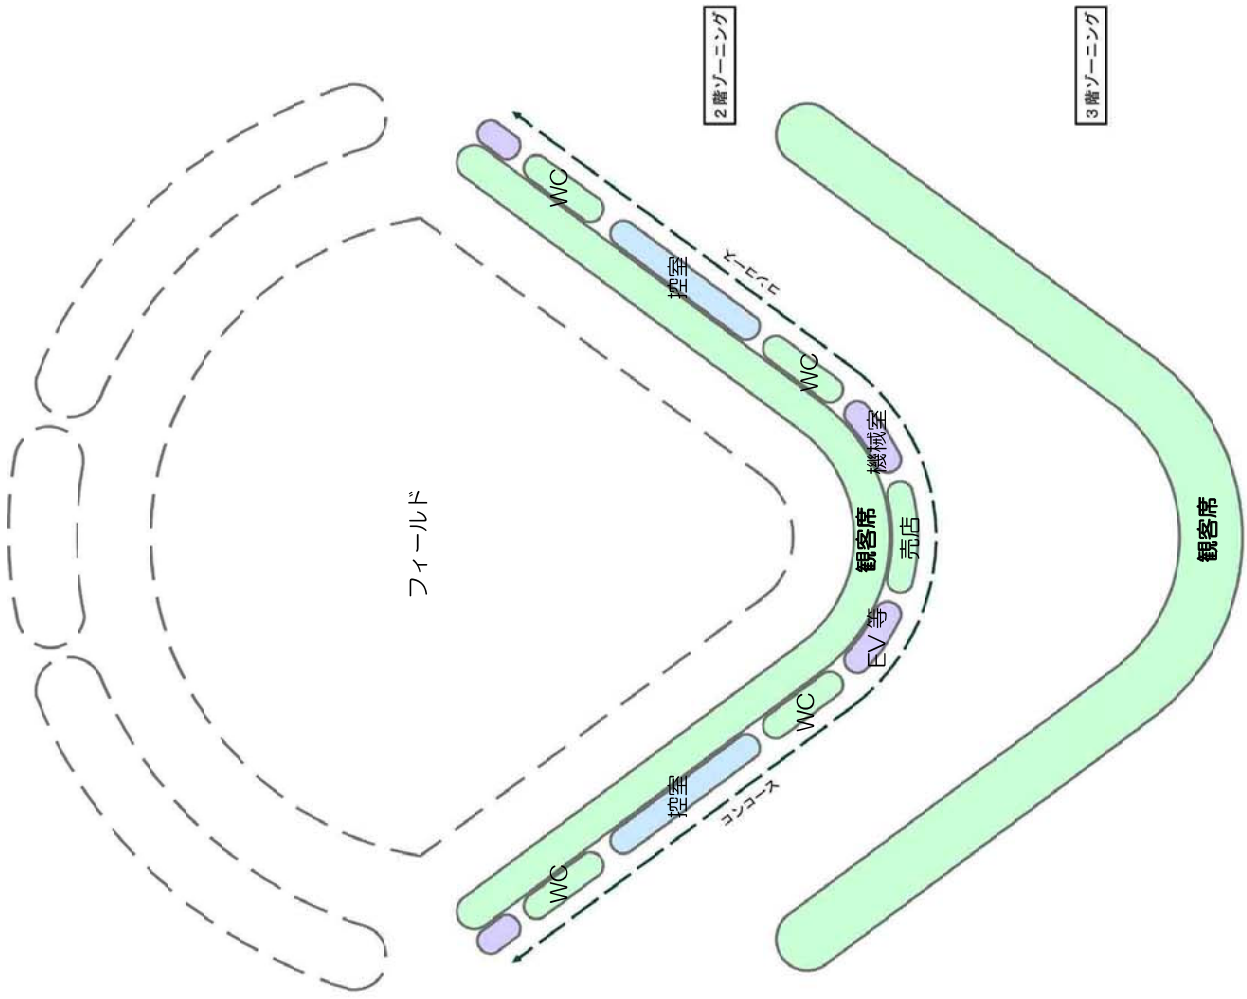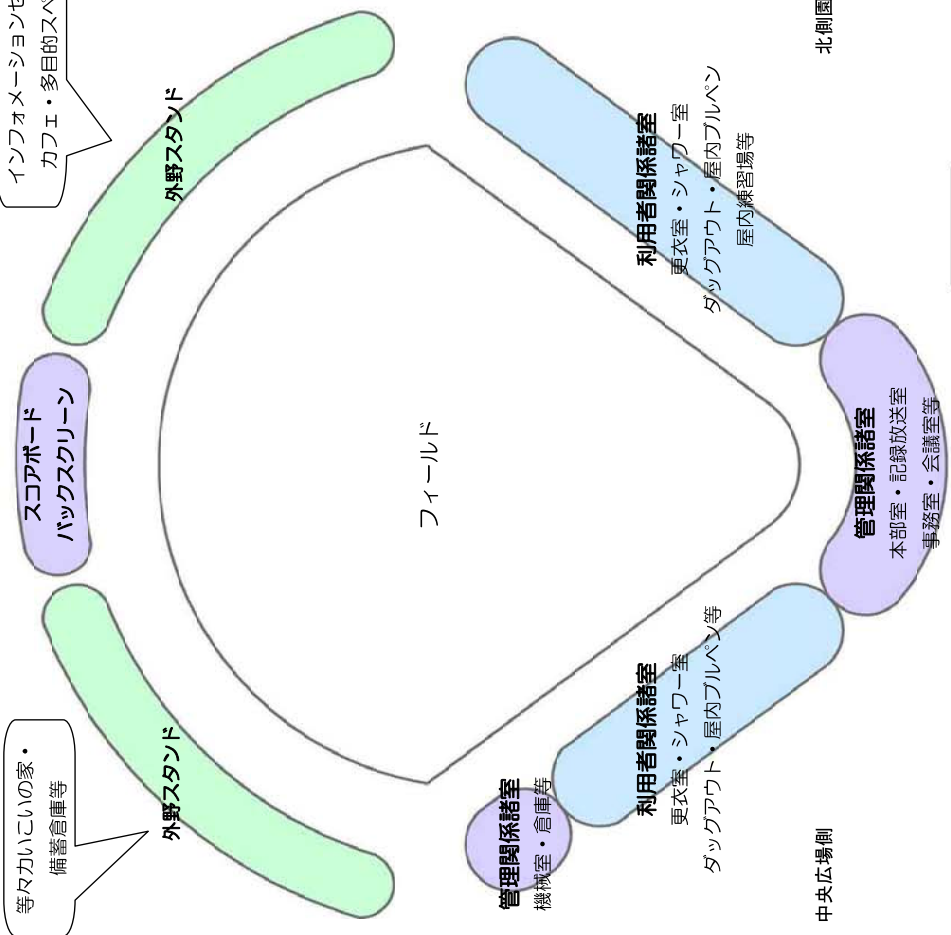

#### 4 硬式野球場整備イメージ



<中央広場側から見た整備イメージ>

※本図は、計画に基づく参考イメージです。  
今後の設計において詳細な検討を進めます。



<正面広場側から見た整備イメージ>


**【問い合わせ先】**


川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室

TEL 044-200-2408


FAX 044-200-3979

E-mail 53todose@city.kawasaki.jp

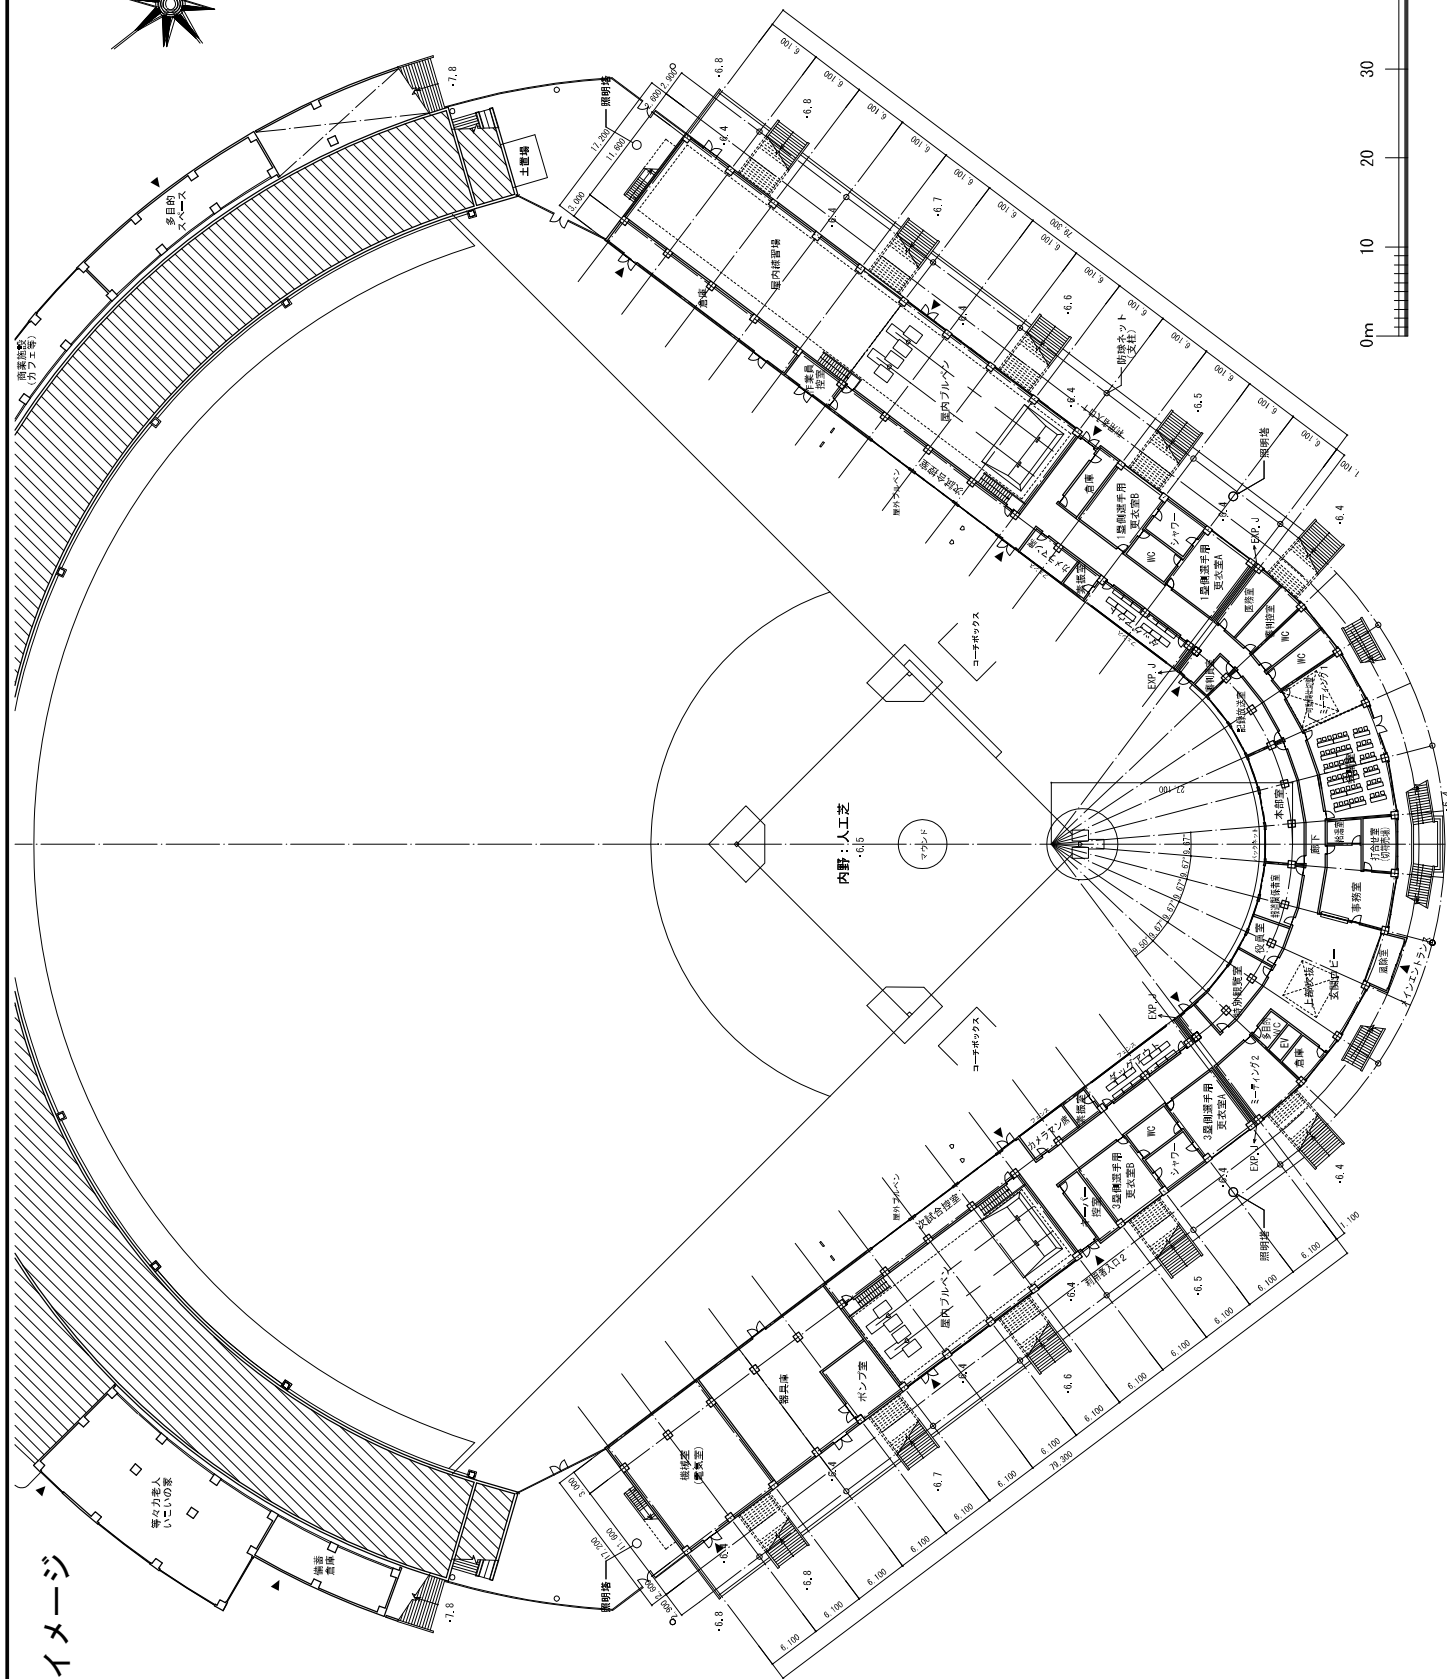

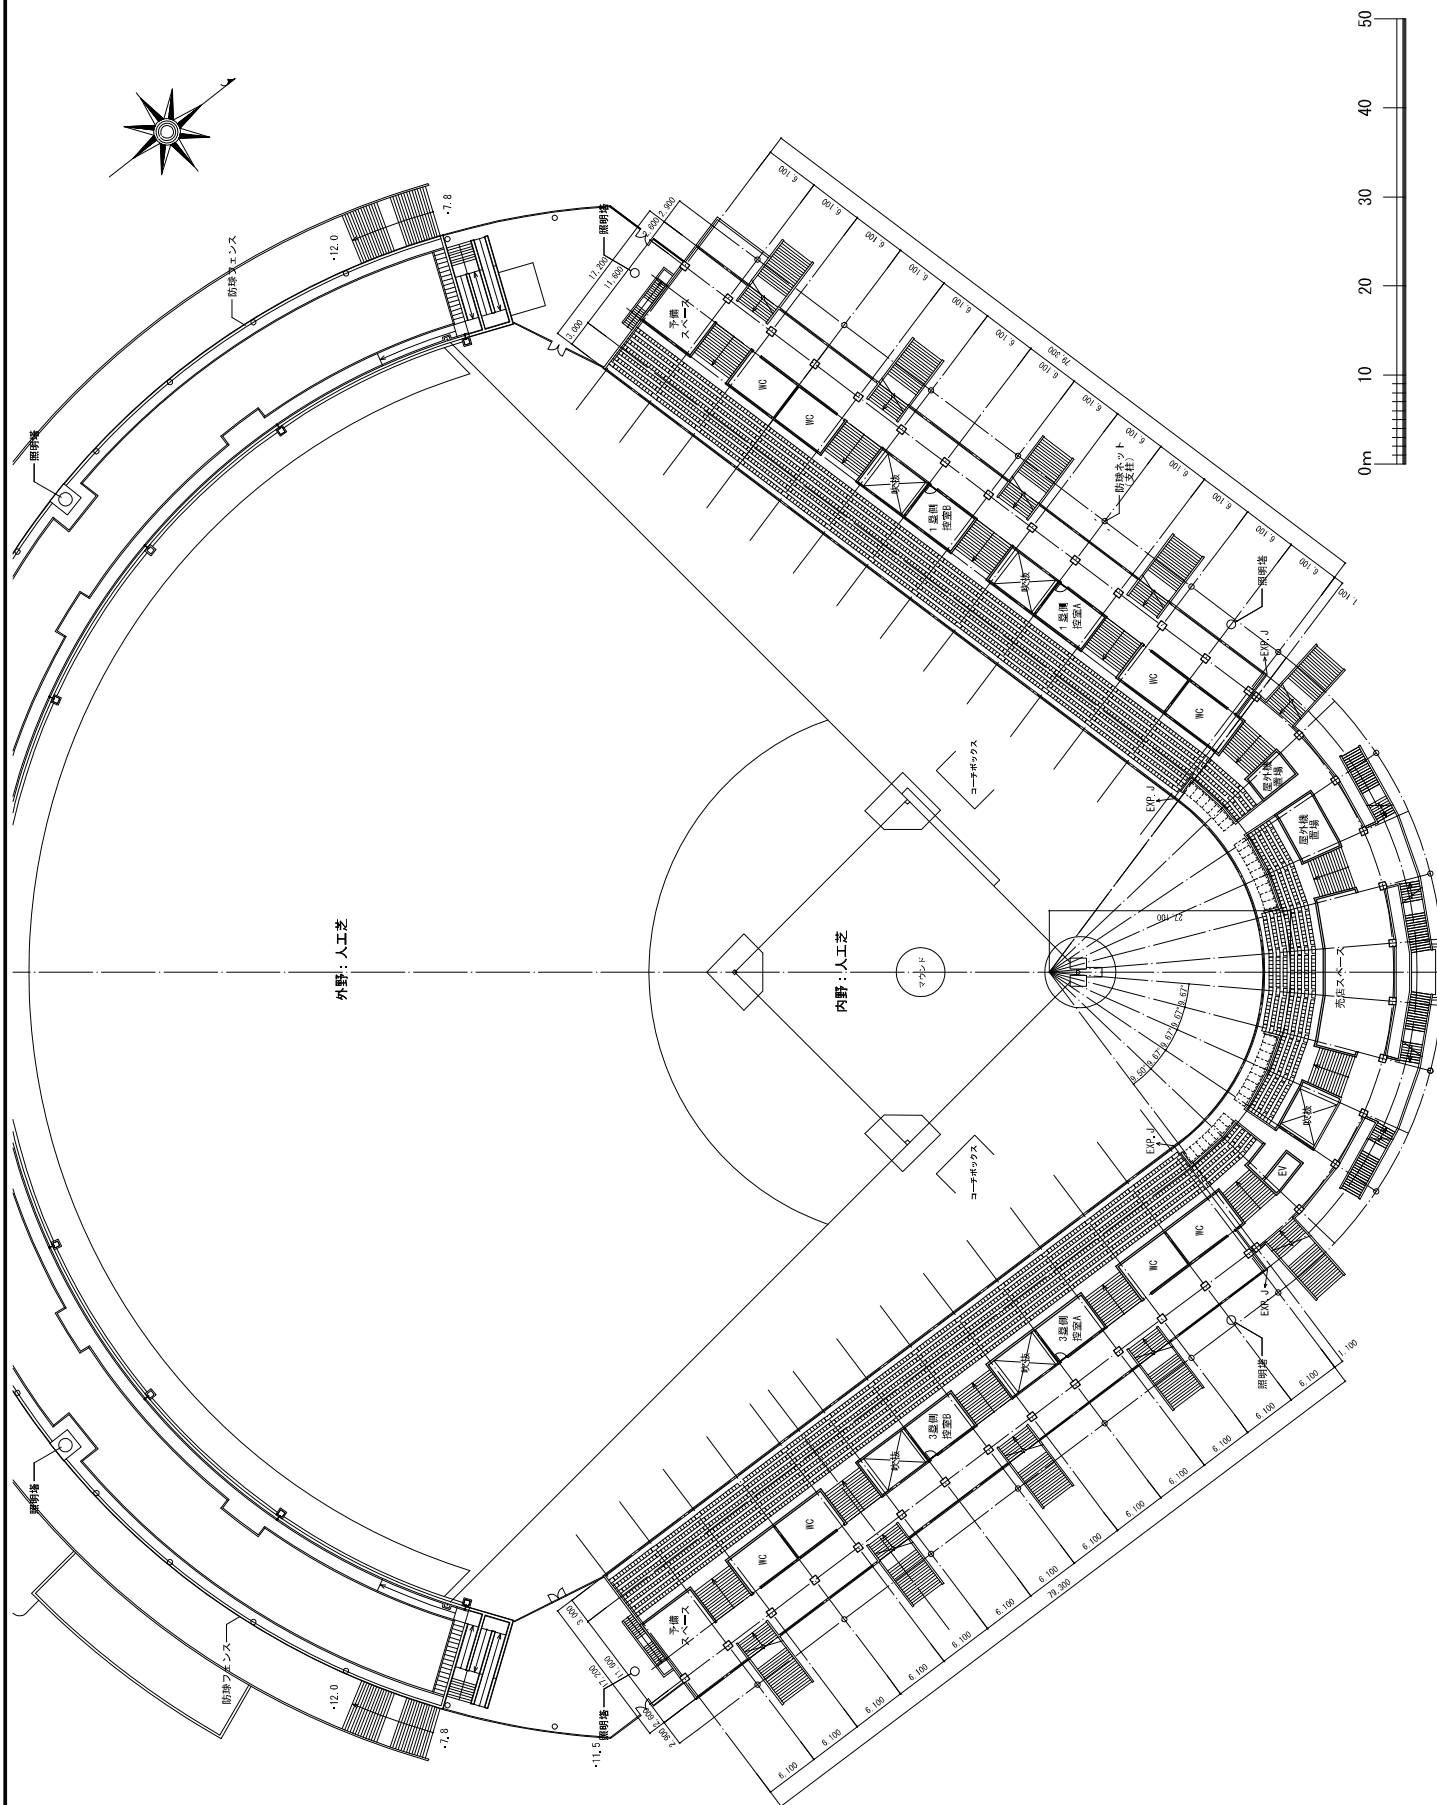

内野スタンド 2階平面図

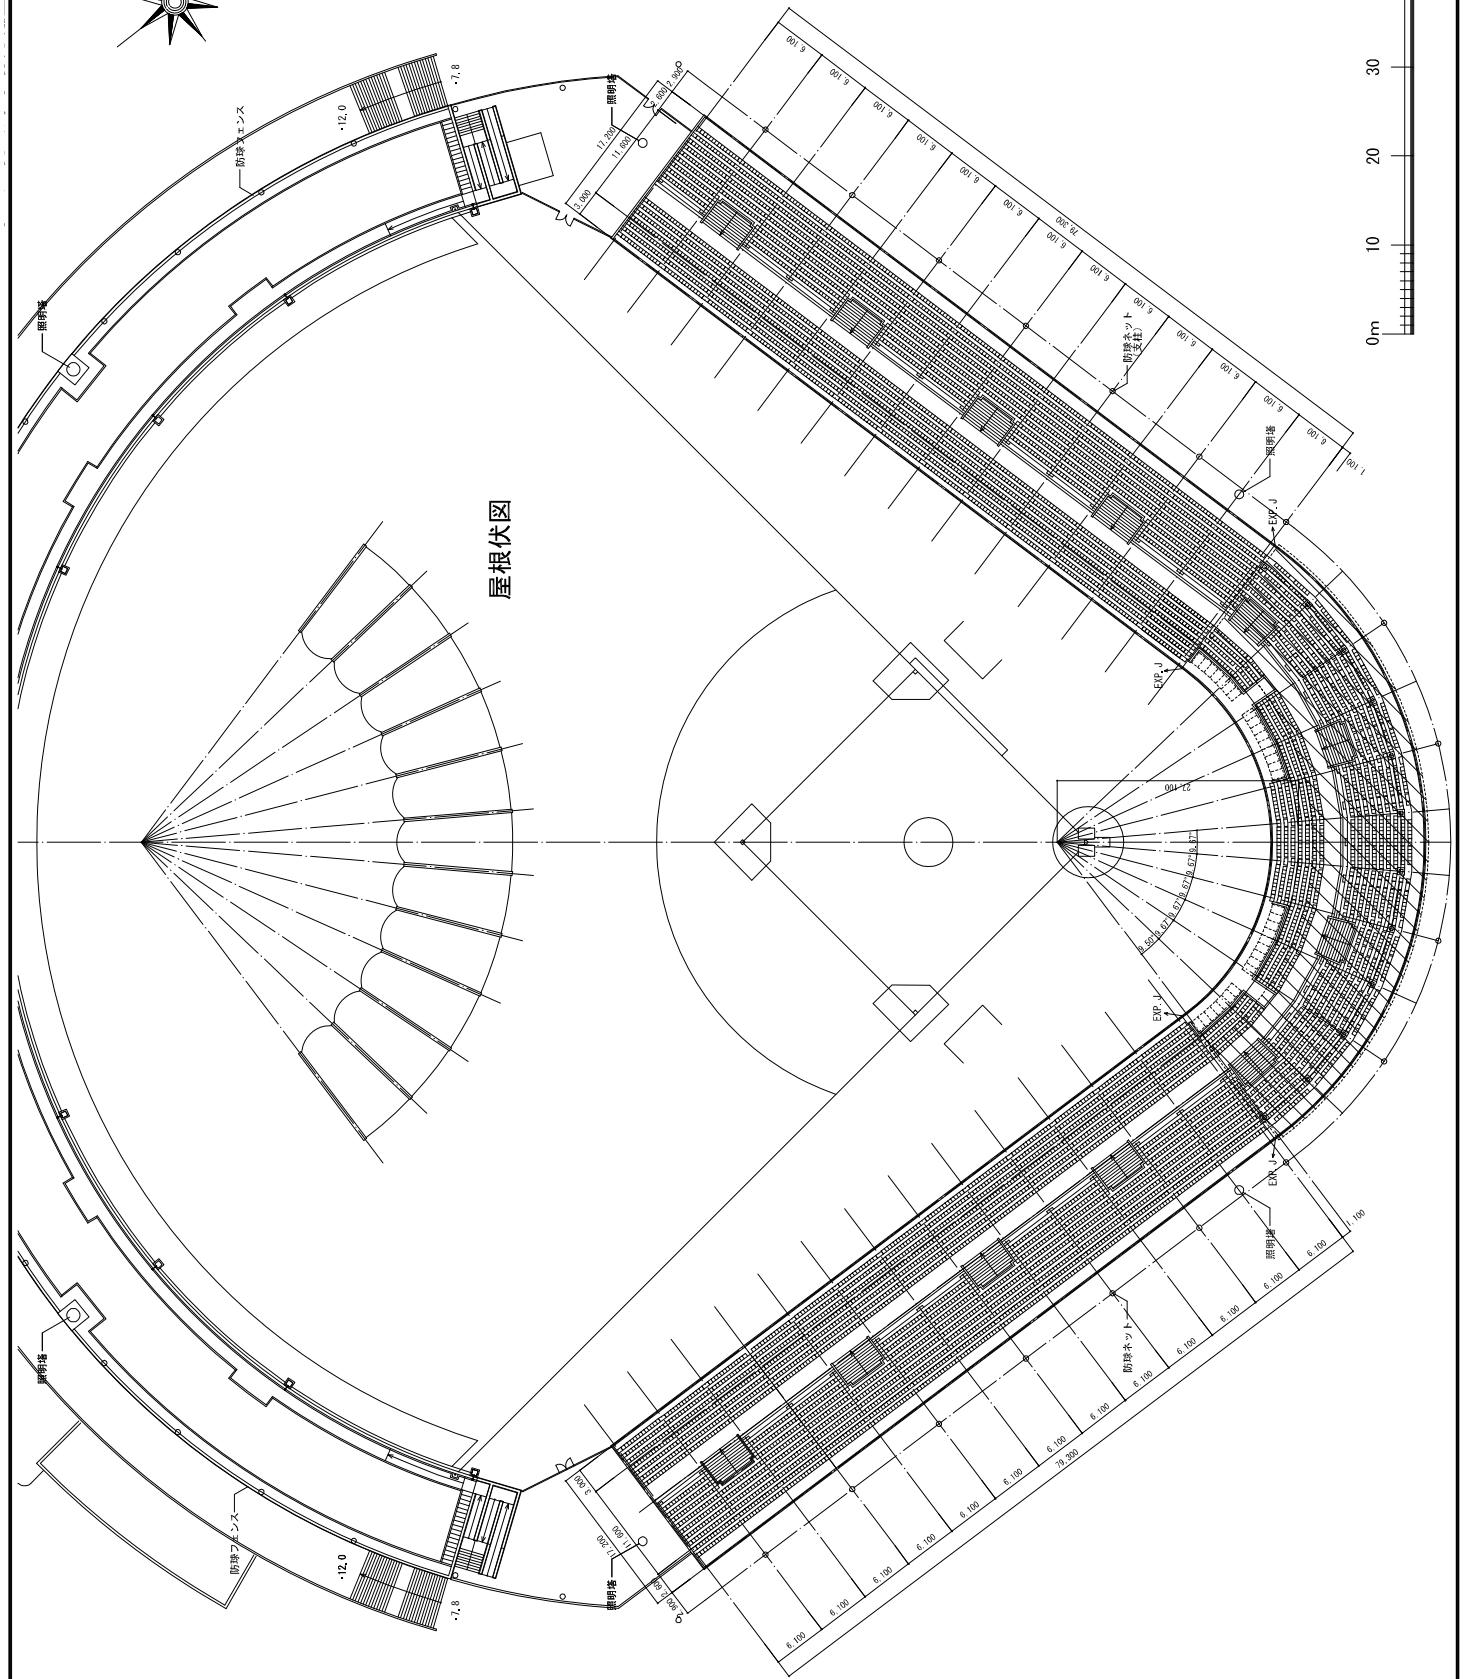

内野スタンド 観客席図




## 野球場周辺整備イメージ

### ● 野球場外野側広場(旧噴水広場)

- ・国道409号に接した正面広場から連続した広場空間とする。
- ・野球場外野デッキ下に想定しているインフォメーションスペースやカフェ等と一体的な利用ができる広場とし、日常の公園利用においても魅力的な空間として整備する。

### ● 中央広場

- ・日常利用として、休憩、憩い、軽い運動などの目的で利用でき、陸上競技場メインスタンドのカフェや売店、トイレなどと一体的に利用できる緑豊かでオープンな広場とする。
- ・Jリーグの試合や、区民まつりなど多目的なイベントに対応できる賑わいの場、たまりの場として利用が可能な広場とする。
- ・災害時には、警察・消防等の活動拠点としての利用が想定される陸上競技場および硬式野球場と一体的な利用が可能であり、大型車両等の転回なども可能な広場とする。

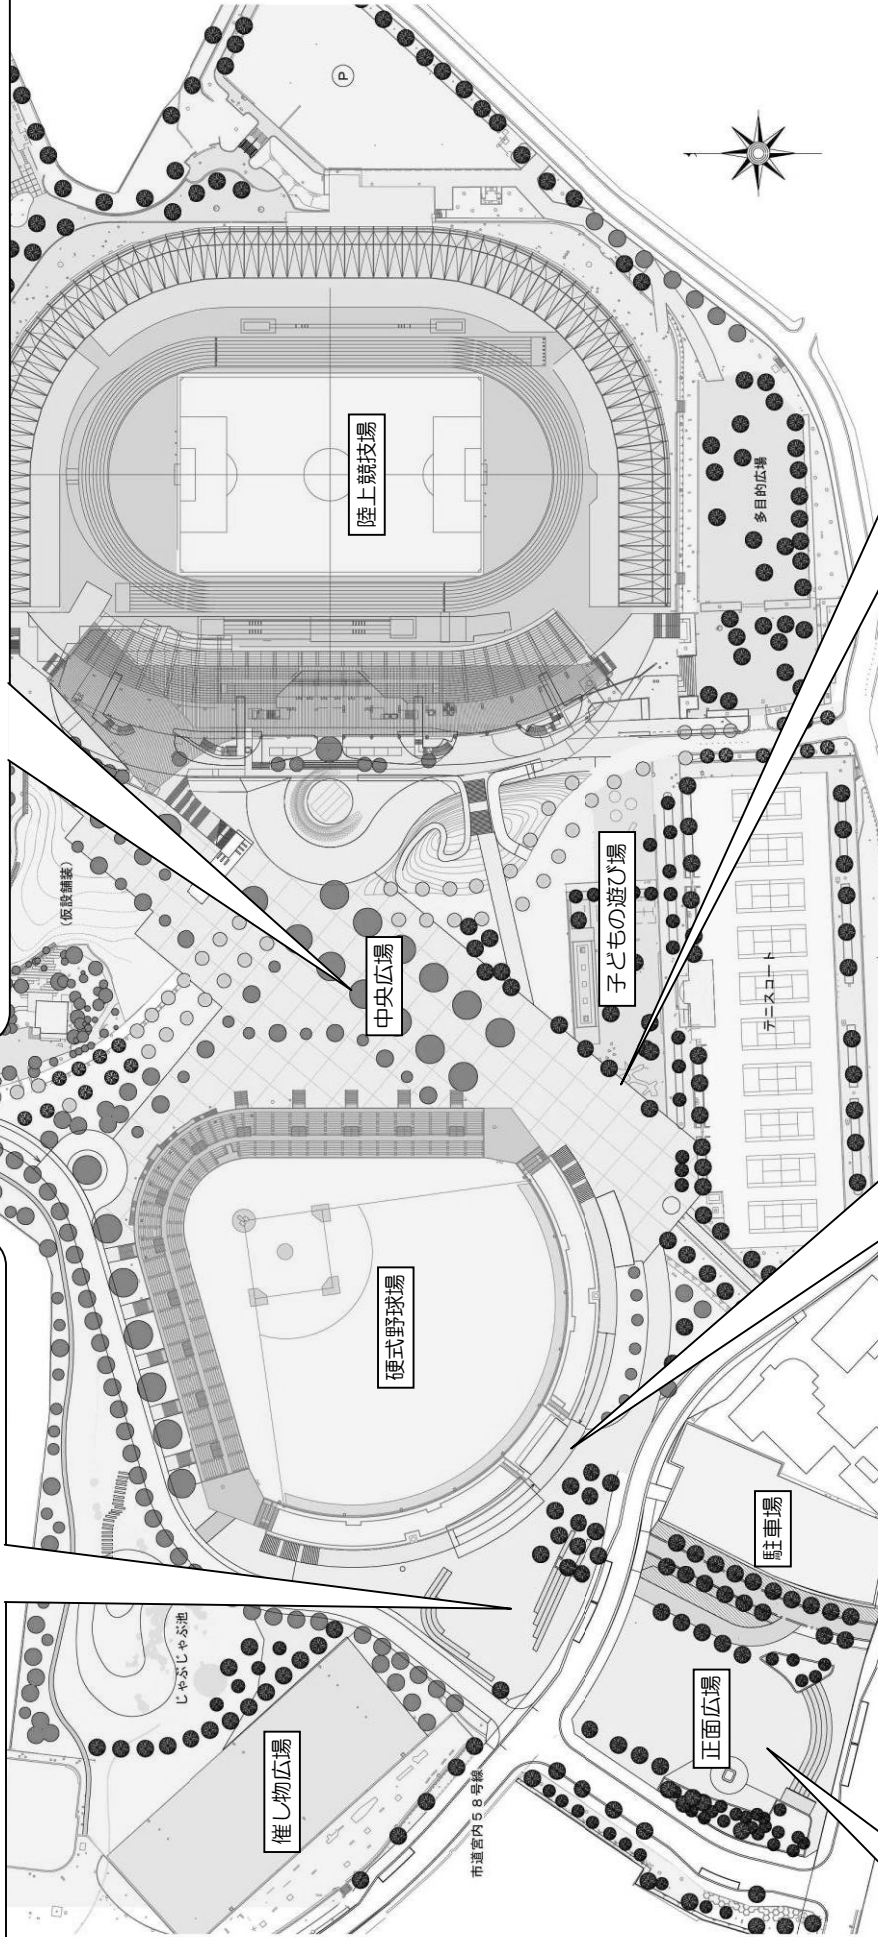

### ● 野球場外野デッキ

- ・国道409号の拡幅整備に伴い、国道409号から野球場バックスクリーン裏まで歩行者デッキを整備する計画があることから、バックスクリーン裏も情報発信スペースなどで活用し、将来的な計画を見据えた外周デッキとする。

### ● 正面広場

- ・メインエントランスとして、緑地の顔となるようなオープンスペースを確保します。

### ● 子どもの遊び場周辺

- ・中央広場や子どもの遊び場との連続性を考慮し、競技場来場者動線が子どもの遊び場と交錯しないような適切に誘導を行うとともに、競技場へのメイン動線としてイベント時の利用を想定した空間とする。

平成24年度 硬式野球場利用実績

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
大会等	1(日)～8(日) 高野連練習試合 14,15(土、日) 21,22(土、日) 高校県大会 28(日)～30(祝) 都市対抗1次予選	1(火)～5(土) 都市対抗1次予選 6(日) 高野連練習試合 12(土)～14(月) 首都大学 19,20(土、日) 26,27(土、日) 中学春季総体 21(月)～25(金) 28(月)～31(木) 整備日	1(金) 整備日 2(土)～6(水) 野球協会大会 10(日)、16,17(土、日) 23(土)、30(土) 高野連練習試合 18(月) 理容組合大会 25(月)～29(金) 整備日	1(日)、7(土) 23(月)～27(金) 高野連練習試合 8(日) 市民野球大会 10(火)～21(土) 高校野球神奈川大会 22(日) 少年野球 28(土)～31(火) 中学県総体	1(水)～3(金) 中学県総体 4(土)～6(月) 子ども会連盟 7(火)～9(木) 医大学生大会 10(金)～23(木) 31(金) 高野連練習試合 24、25(金、土) 27(月)～30(木) 秋季高校地区予選 26(日) 野球協会大会	1,2(土、日)、17(月) 高野連練習試合 8,9(土、日) 15,16(土、日) 高校県大会 22(土) 中学総体 29,30(土、日) 首都大学	1(月) 首都大学 6(土) 学童大会 7(日)～9(火) 中学総体 13,14(土、日)、20(土) 10,11(土、日)、24(土) 高野連練習試合 21(日) 区民祭 27,28(土、日) 市長杯	1(木) 首都大学 3(土) 野球協会大会 4(日) 市長杯 10,11(土、日)、24(土) 高野連練習試合 25(日) 全国リーグ選手権	23(日) 中学新人戦	23(土、日) 少年野球 17(日)、24(日) 審判講習会	9、10(土、日) 16、17(土、日) 20(水) 29(金)～31(日) 高野連練習試合 23(土)～28(木) 秋季高校地区予選	

※大会等が入っていない日は高野連で使用。(交代で市内の高校が練習。シーズン中はすべて。オフシーズンは土祝のみ。)

※大会等が入っている日も含めナイターは一般開放(冬場を除く)。利用率はほぼ100%。

平成24年度 陸上競技場利用実績

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
大会等	8(日)、18(水)、28(土) リレー 14,15(土、日) ゴールデングランプリ 川崎リバーサル 21,22(土、日) 陸上記録会 29,30(日、祝) 陸上高校総体	3(祝)、12(土) 16(水)、26(土) リレー 27(日) リレー 4(金)～7(月) ゴールデングランプリ 川崎 13(日) 高校サッカー 20(日) 障害者スポーツ大会	23(土、日) 中学通信陸上 9(土)、23(土)、30(土) リレー 10(日) 陸上練習会 16(土)、24(日) 市制記念陸上 17(日) 高校サッカー	1(日) 県陸上選手権 8(日) かわしん杯サッカー 16(祝) 高校陸上 21(土) 中学サッカー 28(土) リレー 29(日) 陸上練習会 31(火) 陸上指導者講習会	1(水)～2(木) 中学サッカー 3(金) 陸上指導者講習会 11(土)、25(土) リレー 18(土) 陸上練習会 22,23(水、木) 28(土) 陸上高校新人戦 24(金) 高校サッカー 26(日) 区サッカー教室	1,2(土、日) 市陸上選手権 8(日) 天皇杯(川崎) 15(土)、29(土) リレー 22、23(土、日) 中学陸上総体 30(日) 市民陸上大会 21(日)、28(日) 陸上フェスティバル	3(土) 少年少女サッカー 4(日) 高校サッカー 7(水)、24(土) リレー 10(水) 神奈川信金サッカー 17、18(土、日) 多摩川マラソン 23(祝) 指導者養成講習会 25(日) 高校陸上大会	6,7(土、日) 中学陸上県大会 8(祝) サッカー-中学総体 10(水) 天皇杯(川崎) 14(日) 市民陸上大会 20(土) リレー 21(日)、28(日) 陸上フェスティバル	4(日) 陸上練習会 11日 市長杯サッカー 17(土) 天皇杯(川崎) 23(祝) 全国高校サッカー	2(月) 全国高校サッカー 14(土) 陸上練習会	4(土) 陸上練習会	10(土)、24(土) リレー 17(土)、24(土) 川崎カップサッカー 27,28(火、水) 中学陸上記録会

※大会等が入っていない日は陸上トラックの一般貸出し。(月曜定休。ナイター利用なし。)

平成24年度 催し物広場利用実績

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
主な行事	22(日)親子まつり	14(月)～21(月) 花と緑の市民フェア	1(金)、4(月)～8(金) 中学校体育祭練習		7(火)～10(金) 小学校バレーボール 20(月)～24(金) アリーナ大会の出店	9(祝) 市スポーツイベント 13(土) 教職員運動会 20、21(土、日) 区民祭 28(日) 区スポーツイベント	3(土) 市イベント	3(土) 市イベント	13,14(日、祝) 成人の日イベント	12(金、土) イベント用シャトルバス	16,17(土、日) 青少年フェスティバル	

※リレーや高校野球など陸上競技場、野球場での大規模イベント開催時には原則貸し出しを行わない。

※「学校利用」には幼稚園・保育園の利用を含む。
